


Chiapas

Entronque San Cristóbal

Concesionaria de Autopistas del Sureste SA de CV

Avance físico

- Programado: 0.00%
- Semanal: 0.00%
- Real: 25.17%

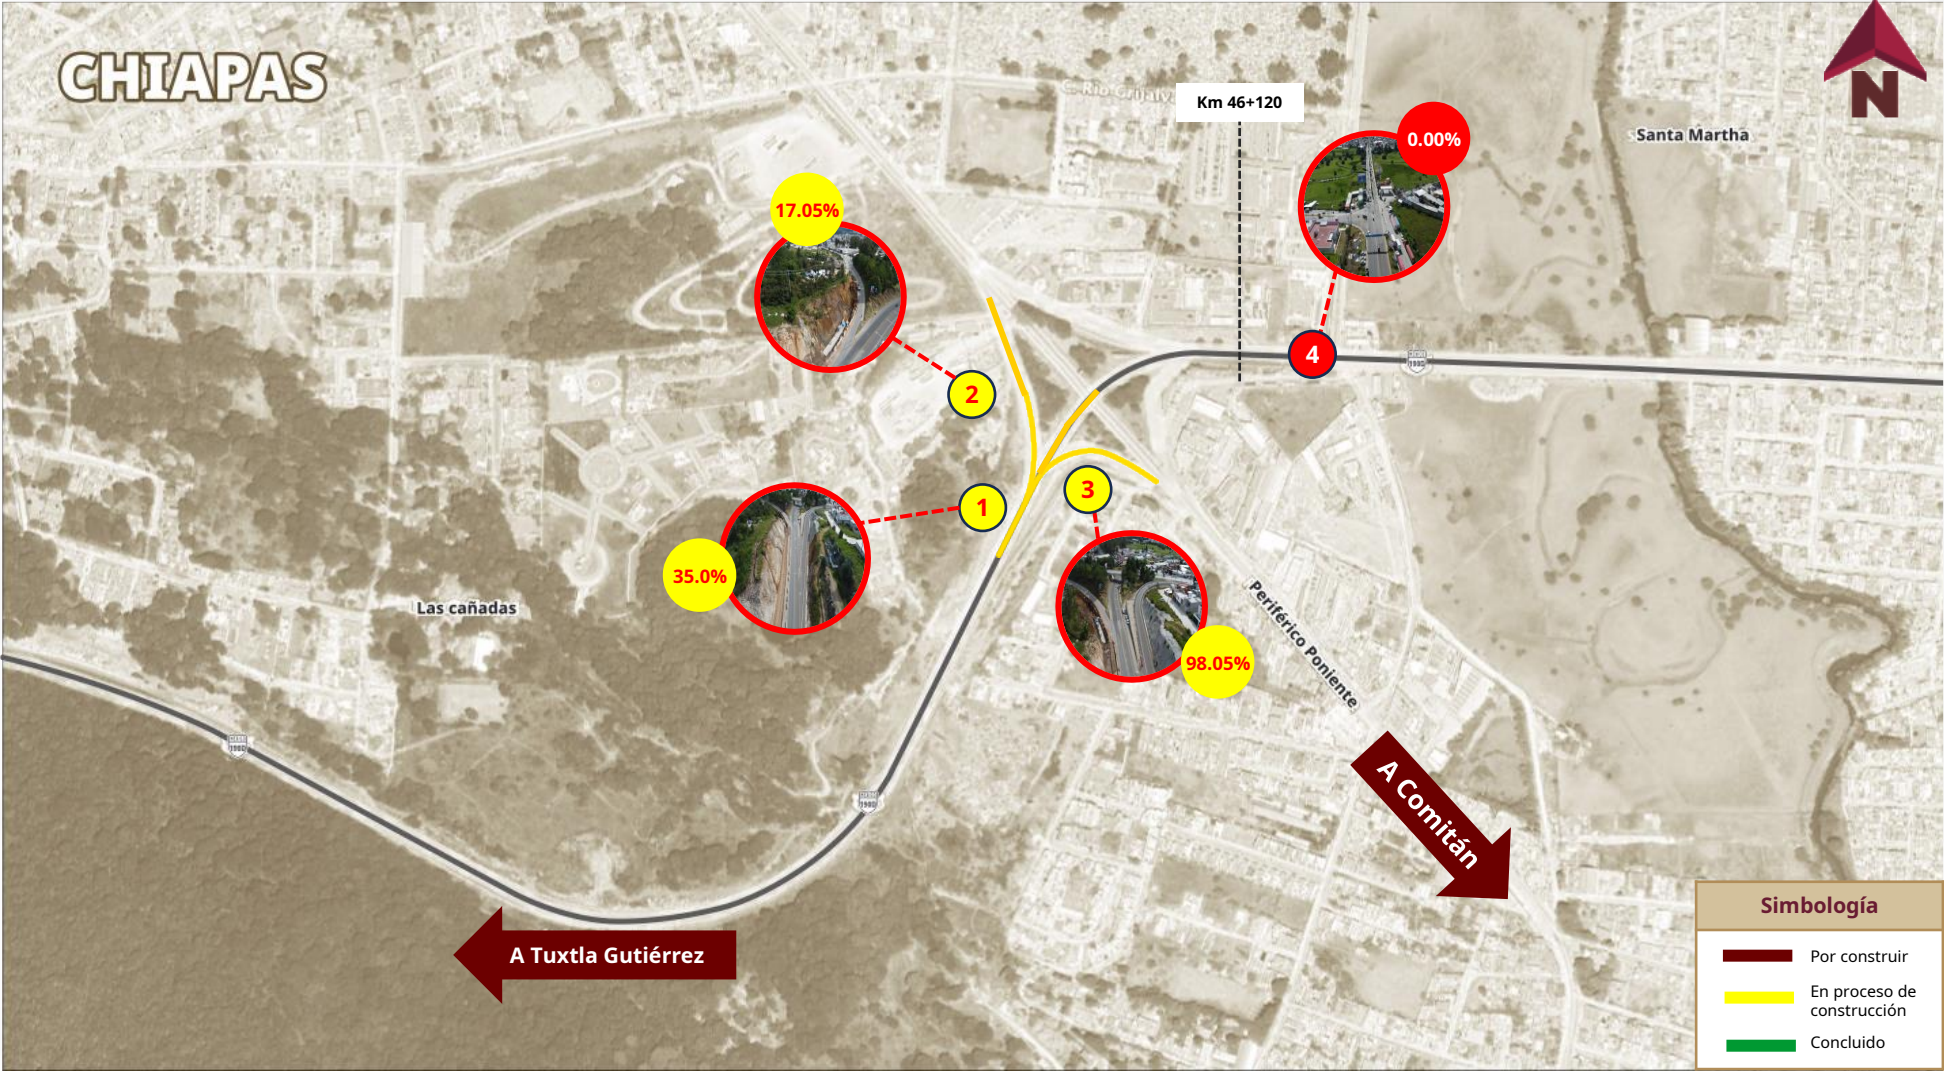

- Inversión:** 44.96 mdp
- Meta:** 1 Entronque
- Avance físico:**
 - Real: 25.17%
 - Financiero: 22.96%
- Inicio:**
Término: Por definir
- 135** empleos generados
- 200,000 mil** habitantes beneficiados
- Mayor movilidad hacia los diferentes destinos.
- Disminución de accidentes.
- Se evitan vueltas prohibidas.

Descripción		Observaciones
1	Eje 50: 35.00%	El 22-Jul-2025, La Concesionaria entregó a la DGDC, la solicitud de reanudación de los trabajos, junto con el programa de obra para su autorización.
2	Eje 2: 17.05%	
3	Eje 20: 98.05%	
4	Eje 4 (Glorieta a nivel de piso): 0.00%	
