Estado de México

Atizapán-Atlacomulco







	Descripción					
1	Entronque Chiluca (15.00%), sin actividad, falta de recursos					
2	Viaducto Sin Nombre km 20+880.00 (53.10%)					
3	Viaducto La Estadía km 22+332.00 (53.22%)					
4	Viaducto Los Gallos km 27+425.00 (36.03%)					
5	Túnel Los Gallos km 27+770.00					
6	Viaducto Sin Nombre km 31+033.00 (46.25%) , sin actividad, sin recursos					
7	Viaducto Tlazala km 31+359.00 (33.01%)					
8	Túnel Cahuacán I km 36+258.00					
9	Viaducto Cahuacán III km 38+995.00 (25.49%),					
10	Viaducto Sin Nombre km 42+053.00 (00.22%), sin actividad, problemas sociales					
11	Viaducto El Llano km 51+016.00 (00.90%), sin actividad, problemas sociales					
12	Viaducto Sin Nombre km 54+770.00 (03.80%), sin actividad, problemas sociales					
13	Viaducto Los Chaparrales km 73+387.00 (00.00%) (no se han iniciado trabajos)					
14	Viaducto El Pescado km 75+482.00 (00.00%) (no se han iniciado trabajos)					
15	Viaducto El Salto km 91+874.00 (16.80%), sin actividad, problemas sociales					
16	Entronque Atlacomulco					

Simbología

Por construir En proceso de modernización Modernizado



Inversión: 9,865.8 mdp a precios de 2014 incluye I.V.A., incluye monto de obra (7,662mdp) y Fondo de Obra Adicional (843 mdp)



Meta: 74 km, 2 Plazas de cobro, 12 Viaductos, 2 Túneles, 4 Entronques, 79 PSVyG



Inicio: 01 marzo 2016 Término: 30 junio 2027



Avance físico:

Programado: 77.50%Real: 41.17%

Financiero: 23.84%Semanal: 00.20%



132,909 empleos generados



1 millón 244 mil habitantes beneficiados



60 minutos de ahorro en tiempo

Estado de México


Atizapán-Atlacomulco

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	05/09/25 al 11/09/2025		
				Programado	Ejecutado	Observaciones
Pilotes	344	184	160	2	0.69	
Zapatas	86	39	47	1	0.54	
Columnas	96	18	78	1	0.32	Se necesita incrementar la mano de obra para lograr las metas prometidas.
Cabezales	76	6	70	1	0.35	
Caballetes	24	4	20	1	0.32	
Trabes metálicas	29	0	29	0.8	0.71]





Avance Programado - Físico - Financiero (%)

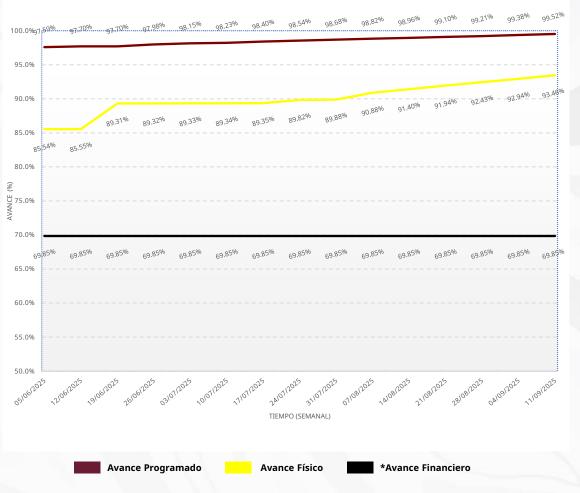

	Del 28 de agosto al 04 de septiembre	05 de septiembre al 11 de septiembre
Fuerza de Trabajo (personas)	1,792	1,813
Maquinaria	463	471
