Michoacán

Uruapán-Nueva Italia


Gobierno de **México**



Avance físico • Programado: 10.18 % • Semanal: 0.11 %

• Real: 9.80 %

• Financiero: 0%

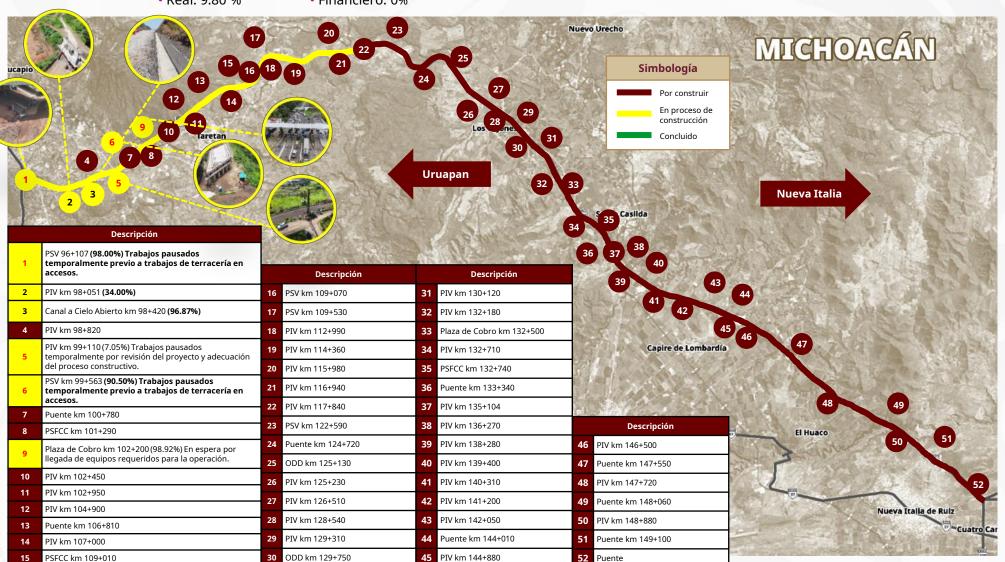

- Inversión: 7,049 mdp
- Inicio: noviembre de 2023 Término: agosto de 2027
- Meta: 67.09 km 65 km (troncal) 2.09 km (estructuras) 2 plazas de cobro, 10 puente, 6 entrongues, 54 cruces y múltiples obras de drenaje.
- 21,147 empleos generados 7.049 Directos 14,098 Indirectos
- 1,800,000 habitantes beneficiados
- 25 minutos de ahorro en tiempo

Concesionaría: PINFRA.

Michoacán


Uruapán-Nueva Italia

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	09/10/2025 al 16/10/2025		
				Programado	Ejecutado	Observaciones
Base Hidráulica	65 km	7.00 km	58.00 km	.200 km	.200 km	
Subbase	65 km	7.80 km	57.20 km	.200 km	.200 km	
Subyacente	65 km	9.70 km	55.30 km	.300 km	.300 km	
PSV 98+051 Corte	1	0	1	1	1	Continua trabajos de corte y retiro de material producto de demolición en apoyo C2





Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

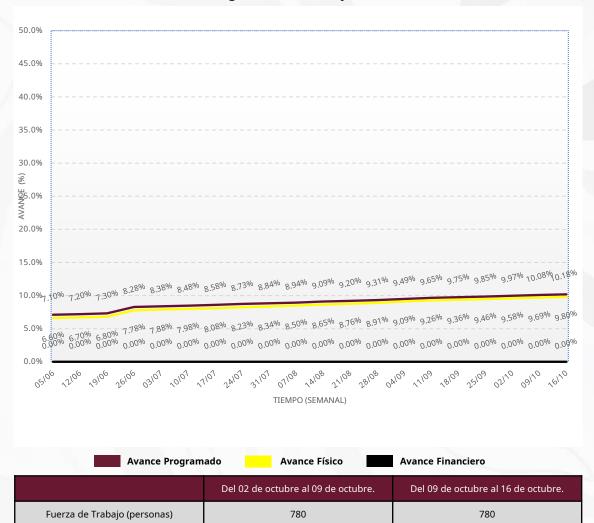

245

245

Maquinaria
