


Michoacán Lázaro Cárdenas-Nueva Italia

Avance físico

- Programado: 0.00%
- Real: 0.30%

- Semanal: 0.00%
- Financiero: 0.00%

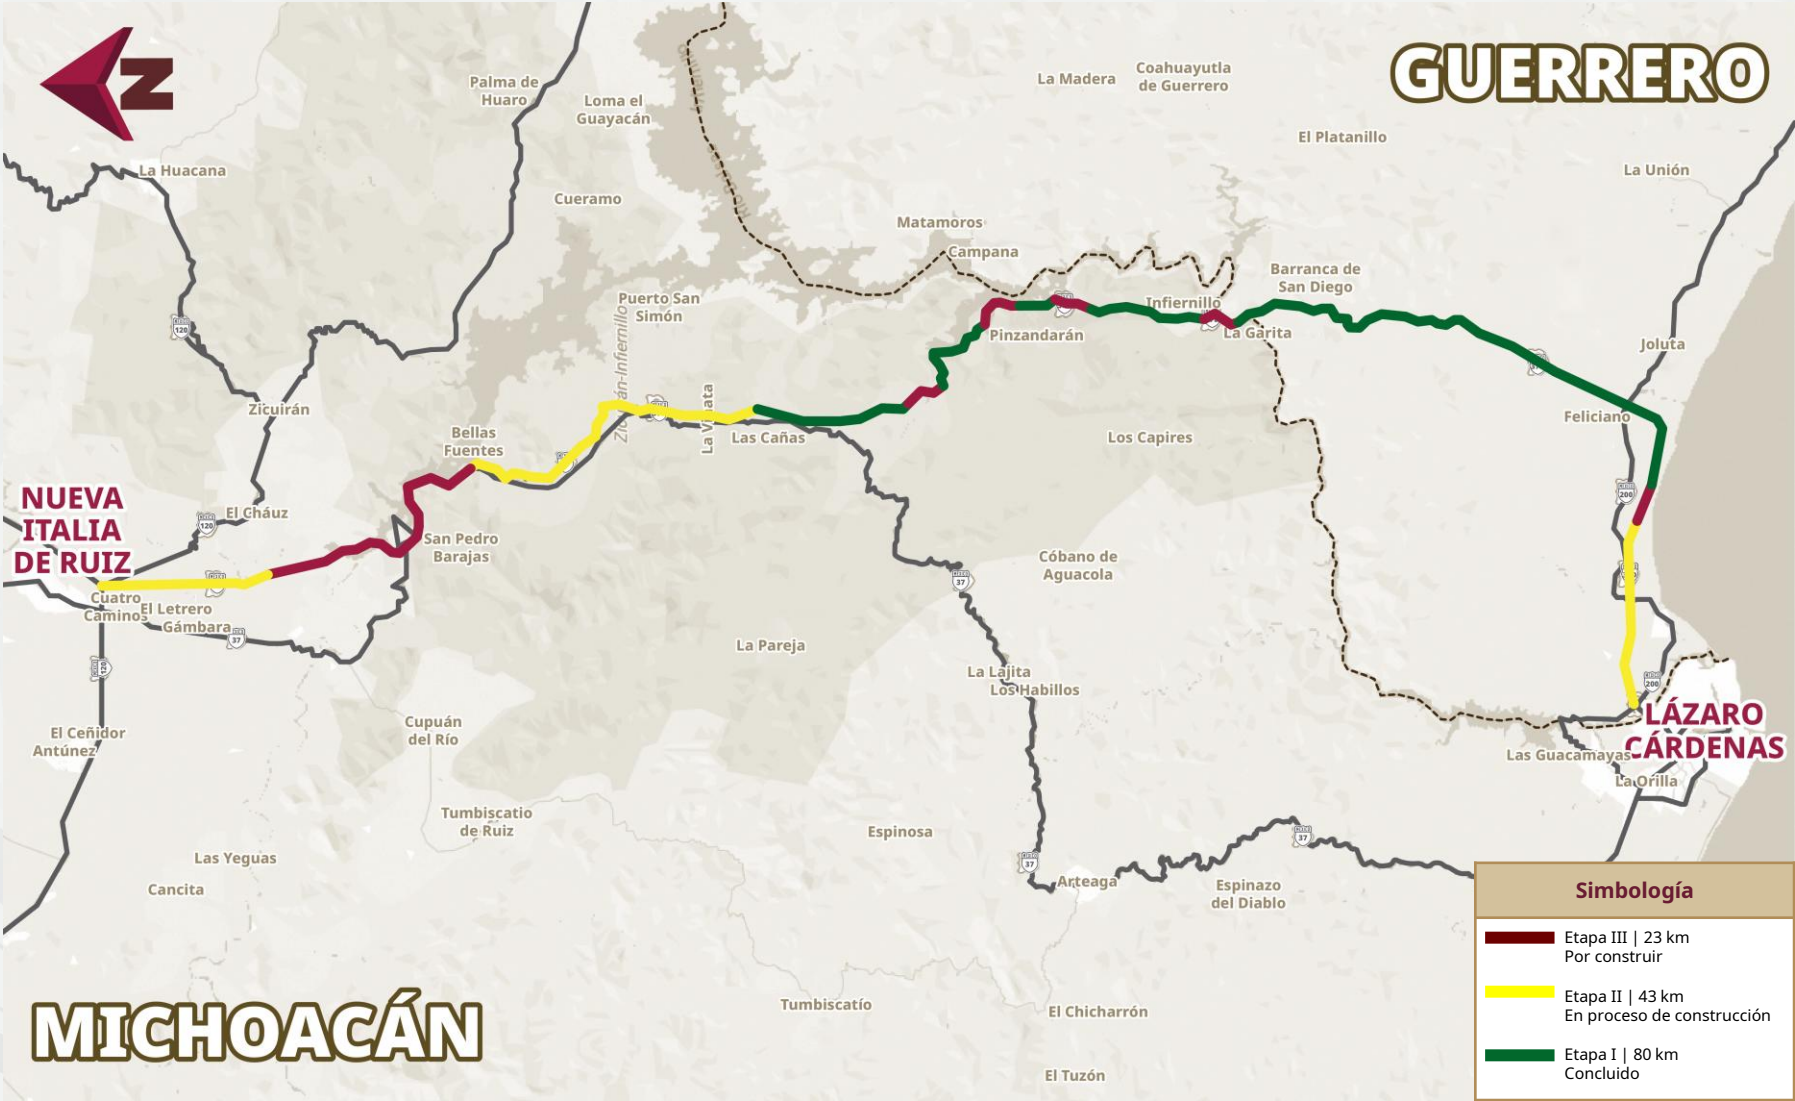


-  **Inversión: 16,000 mdp**
-  **Inicio:** Marzo 2026
Término: 2029
-  **Meta: 146 km**
45 PIV's | 3 PSV's | 28 Puentes de concreto | 5 PSFCC | 1 Túnel
1 Ampliación de plaza de cobro
3 Puentes de acero (estructuras complejas)
-  **4,123 empleos generados**
-  **1,800,000 habitantes beneficiados**

Michoacán

Lázaro Cárdenas-Nueva Italia

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	11/06/2026 al 18/06/2026	
				Programado	Ejecutado
Desmonte	146 km	10.00 km	136.00 km	.100 km	.100 km
Corte	146 km	1.50 km	144.50 km	.100 km	.100 km
Terraplén	146 km	0.80 km	145.20 km	.100 km	.100 km

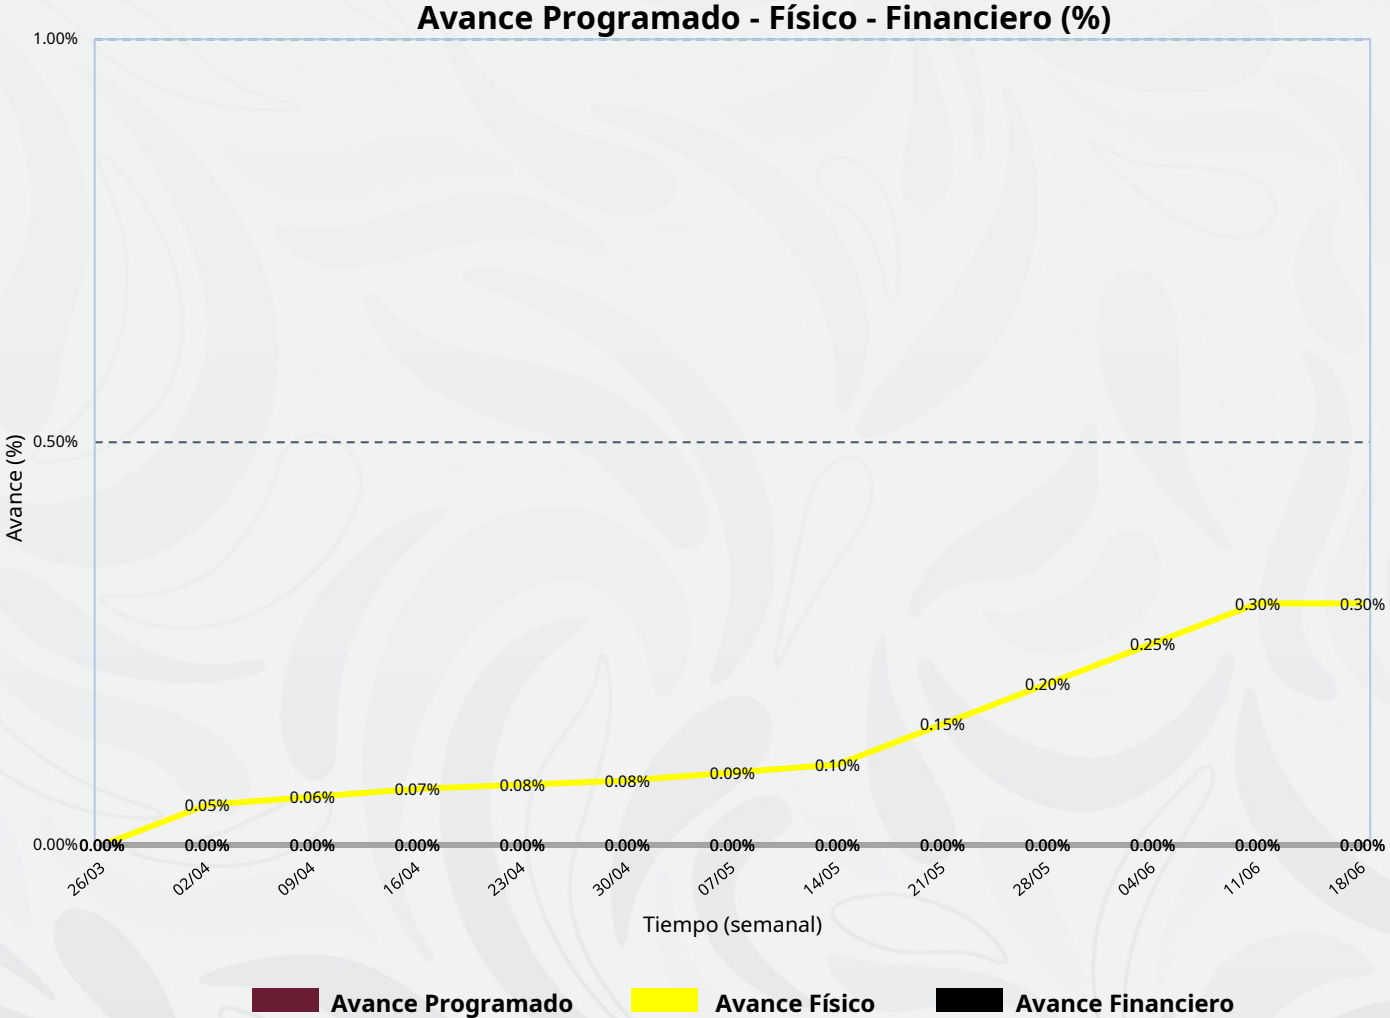

	Del 04 de junio al 11 de junio de 2026.	Del 11 de junio al 18 de junio de 2026.
Fuerza de Trabajo (personas)	50	50
Maquinaria	20	20
Frente de Trabajo	Actividades de deshierbe y desmonte	Actividades de deshierbe y desmonte

Michoacán

Lázaro Cárdenas-Nueva Italia

Descripción	Longitud de estructuras (m)	Longitud de accesos (m)
45 PIV's	1234.80	6300
3 PSV's	69.2	420
28 Puentes de concreto	2790.5	3360
5 PSFCC	226.7	670
1 Túnel	191.20	140
1 Ampliación de plaza de cobro	N/A	N/A
3 Puentes de acero (estructuras complejas)	1346	480
