


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

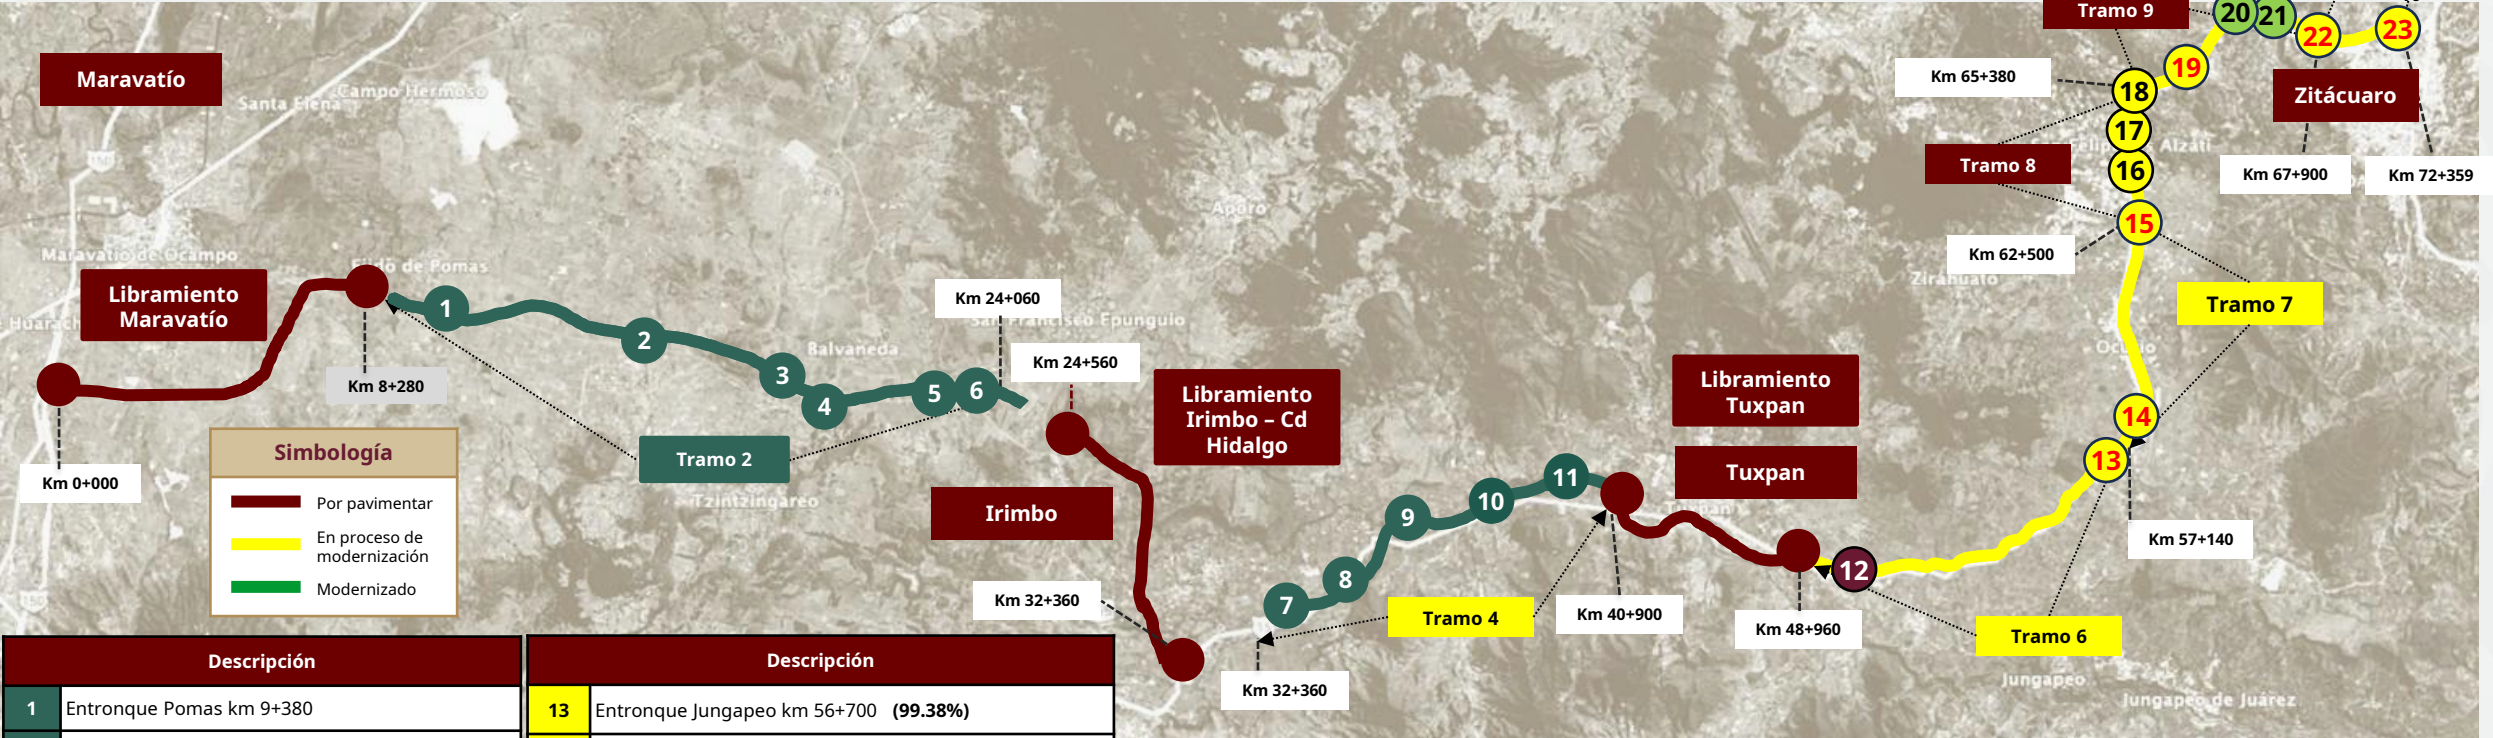

Descripción		Descripción	
1	Entronque Pomas km 9+380	13	Entronque Jungapeo km 56+700 (99.38%)
2	Entronque San Vicente km 14+500	14	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 (75.63%)
3	PIP km 18+370	15	Entronque Zirahuato km 62+500 (72.55%)
4	Entronque Zinzingareo km 18+700	16	Entronque San Felipe I km 64+400 (72.10%)
5	Entronque Senguio km 21+280	17	Entronque San Felipe II Km 64+640 (72.10%)
6	PIP km 22+280	18	Entronque Macutzio km 65+620 (53.31%)
7	Entronque Santa Rosa km 32+420	19	Entronque Valle Verde km 67+220 (98.20%)
8	Entronque Ziranda-Jaripeo km 33+500	20	Entronque Curungueo I Km 68+240
9	Puente Turundeo Km 36+460	21	Entronque Curungueo II Km 68+780
10	Entronque Turundeo I km 37+550	22	Puente San Juan Viejo Km 69+860 (98.82%)
11	Entronque Turundeo II km 38+780	23	PSV Zitácuaro Km 72+160 (97.32%)
12	Puente Obispo Km 50+400 (0.00%), Sin Iniciar		

Avance físico

- Programado: 65.65% (Reprogramación T8)
- Real: 67.28%
- Semanal: 0.23%
- Financiero: 20.44%

Nota 1:
Los avances se calculan en relación a la Inversión total del Ramal

Nota 2:
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal, o no han iniciado.

**Inversión:** \$4,575.3 mdp (total Ramal)
\$3,048.81 mdp (modernización)
\$1,526.49 mdp (Libramientos)

**Meta:** 71.3 Km

**Inicio:** septiembre 2020

**Reinicio:** 27 de enero de 2024

**Término:** 31 de diciembre de 2026

 4,800 empleos generados

 126,000 habitantes beneficiados

 Ahorro en tiempo: 25 min

Concesionaria: Red de carreteras de occidente

Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío




Avance Programado - Físico - Financiero (%)

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 12 jun al 18 jun 26		Observaciones
				Programad o	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	792,403.47	-86,845.47	0.00	764.22	
Terraplén (m3)	445,687.00	501,894.93	-56,207.93	0.00	5,026.50	
Subyacente (m3)	256,097.00	289,547.75	-33,450.75	0.00	1,485.34	
Subrasante (m3)	170,688.00	186,265.82	-15,577.82	0.00	867.39	

PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 12 jun al 18 jun 26		Observaciones
				Programad o	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	134,191.68	-8,532.64	0.00	1,010.86	
Fresado (m3)	10,676.00	10,952.50	-276.50	0.00	4.20	SE TRABAJA EN TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6, 7, 8 Y 9.
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	30.31	-0.07	0.00	0.07	SE TRABAJA EN TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6, 7, 8 Y 9.
Geomalla (m2)	84,520.00	89,364.60	-4,844.60	0.00	476.80	SE TRABAJA EN TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6, 7, 8 Y 9.
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	128,185.91	-7,771.86	0.00	775.54	SE TRABAJA EN TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6, 7, 8 Y 9.

ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 12 jun al 18 jun 26		Observaciones
				Programad o	Ejecutado	
PIV JUNGPEO	1.00	1.0089	0.0000	0.0000	0.0000	CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN GASA 0
PSV SAN FELIPE	1.00	0.5941	0.4059	0.0110	0.0181	TENDIDO DE BASE ASFÁLTICA
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.9879	0.0121	0.0000	0.0204	CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.9728	0.0272	0.0000	0.0700	REHABILITACIÓN DE CALLES LATERALES
DEFENSA METÁLICA	35,327.00 ml	33,342.25 ml	1,984.75 ml	0.00 ml	48.22 ml	SE INSTALA EN TRAMOS AISLADOS DISPONIBLES

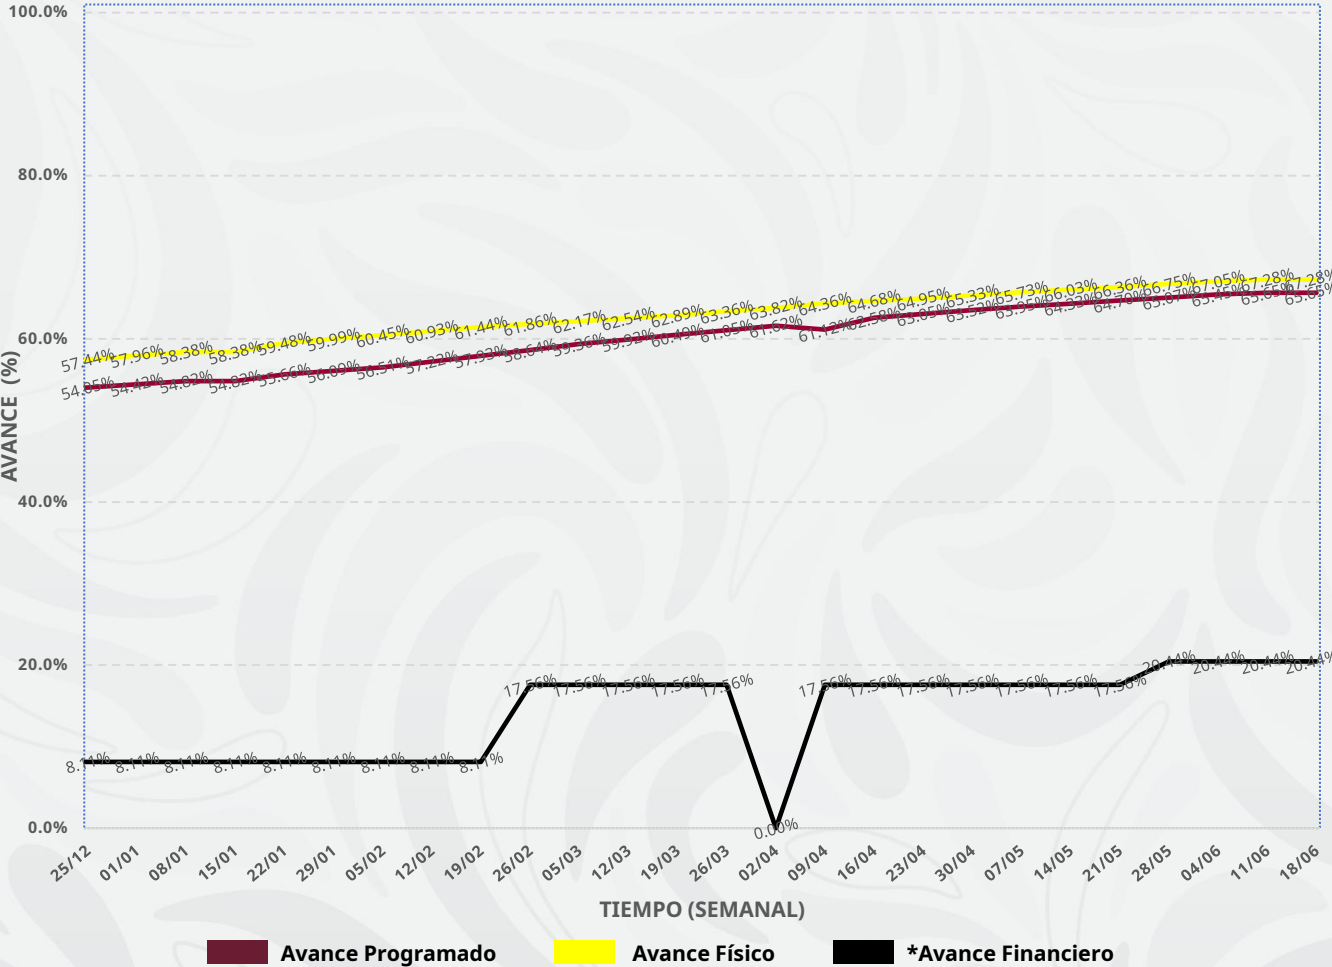

	Del 05 al 11 de junio de 2026	Del 12 al 18 de junio de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	288	289
Maquinaria	190	194
Tramos activos	VI, VII, VIII, IX, X	VI, VII, VIII, IX, X
Frentes de trabajo (totales)	288	289

Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

Descripción		Longitud de estructuras (m)	Longitud de accesos (m)
1	Entronque Pomas km 9+380	500	Entronque a nivel
2	Entronque San Vicente km 14+500	480	Entronque a nivel
3	PIP km 18+370	30	Puente peatonal
4	Entronque Zinzingareo km 18+700	430	Entronque a nivel
5	Entronque Senguio km 21+280	350	Entronque a nivel
6	PIP km 22+280	30	Puente peatonal
7	Entronque Santa Rosa km 32+420	200	Entronque a nivel
8	Entronque Ziranda-Jaripeo km 33+500	600	Entronque a nivel
9	Puente Turundeo Km 36+460	154	Puente vehicular
10	Entronque Turundeo I km 37+550	420	Entronque a nivel
11	Entronque Turundeo II km 38+780	400	Entronque a nivel
12	Puente Obispo Km 50+400 (0.00%), Sin Iniciar	30	Puente peatonal

Descripción		Longitud de estructuras (m)	Longitud de accesos (m)
13	Entronque Jungapeo km 56+700 (99.38%),	400	Entronque a nivel
14	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 (75.63)	440	Entronque a nivel
15	Entronque Zirahuato km 62+500 (72.55%)	260	Entronque a nivel
16	Entronque San Felipe I km 64+400 (72.10%)	120	Entronque a nivel
17	Entronque San Felipe II Km 64+640 (72.10%)	120	Entronque a nivel
18	Entronque Macutzio km 65+620 (53.31%)	300	Entronque a nivel
19	Entronque Valle Verde km 67+220 (98.20%),	340	Entronque a nivel
20	Entronque Curungueo I Km 68+240	340	Entronque a nivel
21	Entronque Curungueo II Km 68+780	340	Entronque a nivel
22	Puente San Juan Viejo Km 69+860 (98.82%)	55	200
23	PSV Zitácuaro Km 72+160 (97.32%),	520	460
