

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia


Avance físico

• Programado: 19.46%

• Real: 19.58 %

• Semanal: 0.14 %

• Financiero: 19.10%

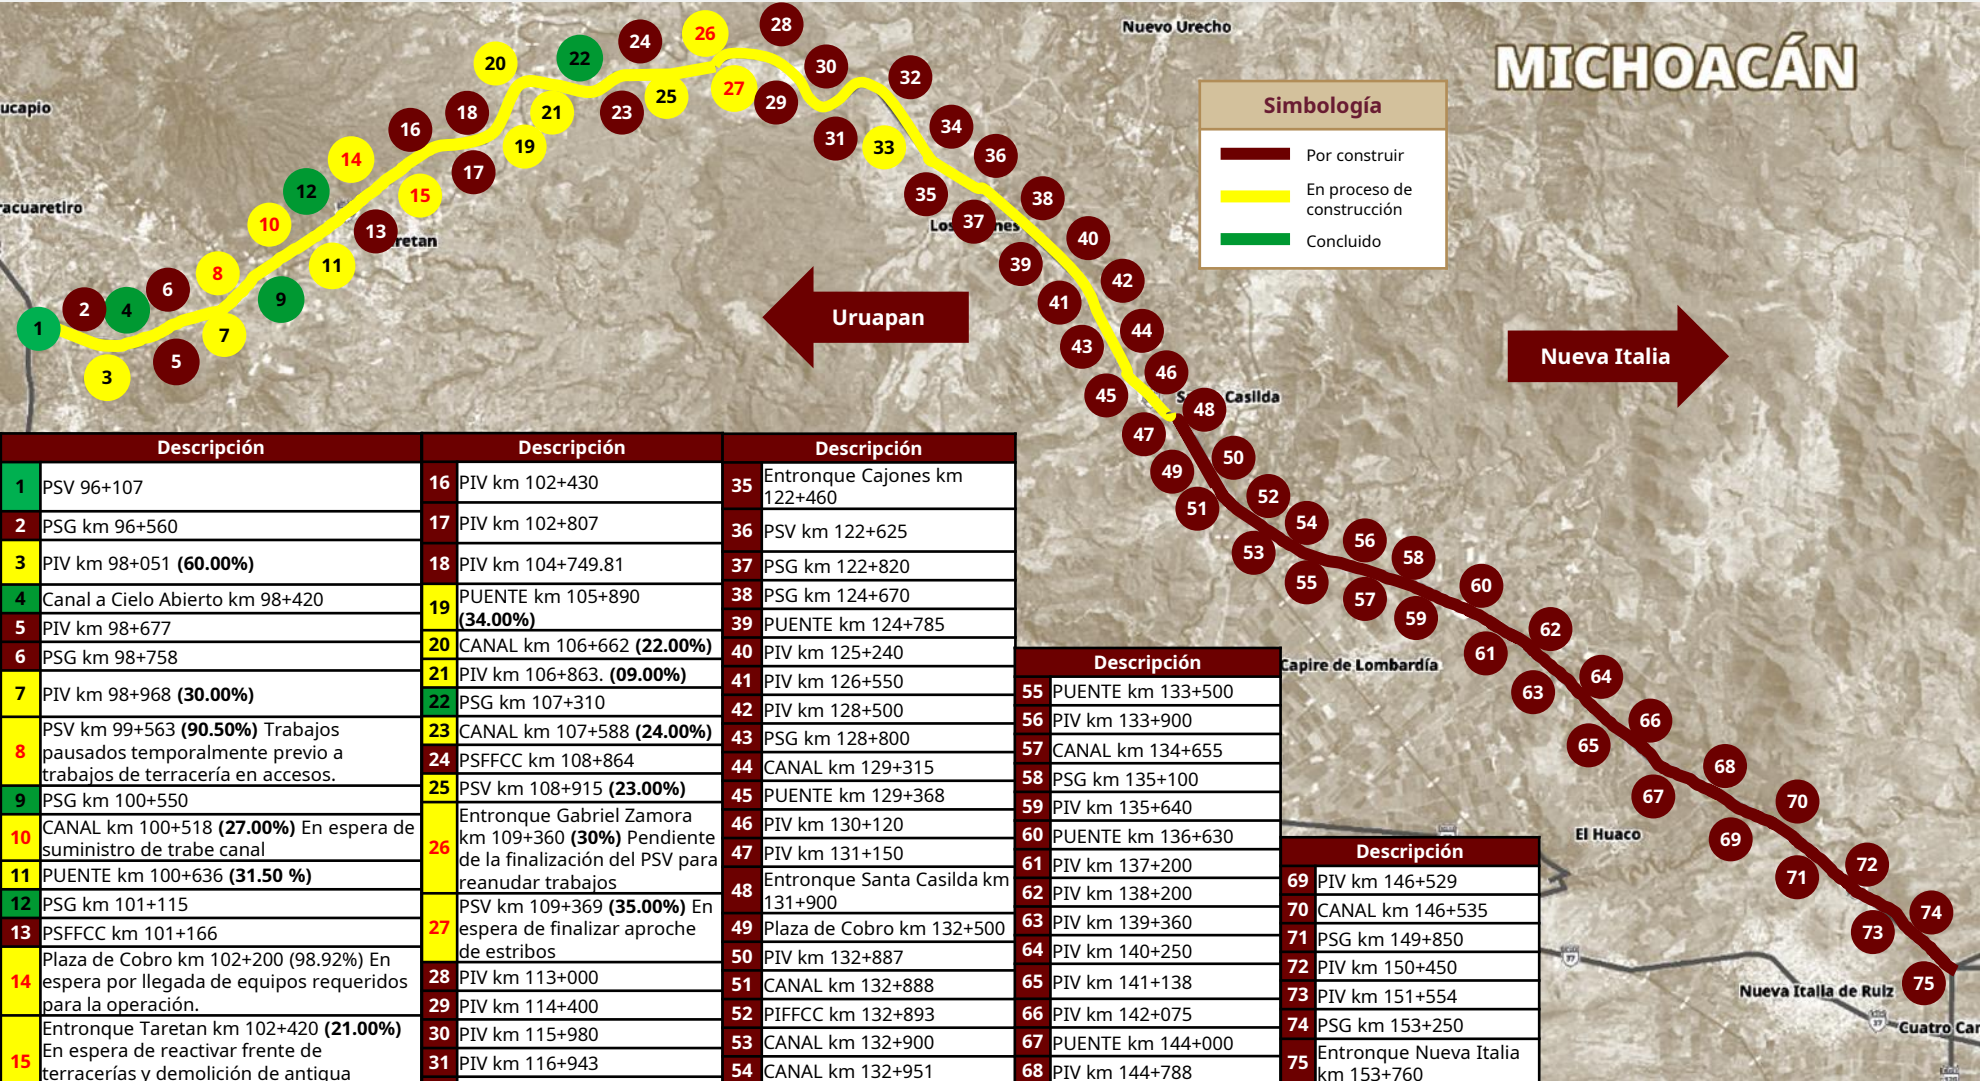

- 

Inversión: 7,049 mdp
- 

Inicio: noviembre de 2023
Término: diciembre 2026
- 

Meta: 67.09 km
65.00 km (troncal)
2.09 km (estructuras)
2 Plazas de Cobro, 7 puentes, 5 Entronques, 60 cruces (5 PSV's, 30 PIV's, 13 PSG's, 1 PIFFCC, 2 PSFFCC, 9 travesaños), 1 canal a cielo abierto (cien fuegos) y múltiples obras de drenaje.
- 

21,147 empleos generados
7,049 empleos directos
14,098 empleos indirectos
- 

1,800,000 habitantes beneficiados
- 

25 minutos de ahorro en tiempo
- 


Concesionaria : PINFRA.

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	05/03/2026 al 12/03/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Asfáltica	65 km	10.00 km	55.00 km	.300 km	.300 km	
Base Hidráulica	65 km	11.20 km	53.80 km	.300 km	.300 km	
Subbase	65 km	13.10 km	51.90 km	.300 km	.300 km	
Subyacente	65 km	15.40 km	48.80 km	.400 km	.400 km	
PIV Km 98+051 Superestructura	8	1	7	2	2	Colocación de ductos y tensores de acero en diafragmas
PIV Km 98+968 Superestructura	8	1	7	1	1	Habilitado de cimbra de madera para construcción de diafragmas
Puente Km 105+890 Subestructura	4	3	1	1	1	Colocación de obra falsa para construcción de cabezal #1
PIV Km 106+863 Cimentación	2	0	2	1	1	Armado de acero de refuerzo para zapata y estribo
PSV Km 108+915 Subestructura	2	1	1	1	1	Colado de concreto hidráulico para 4to trepado de estribo en eje 1
Canal Km 120+390 Subestructura	1	0	1	1	1	Habilitado de cimbra para trepados de estribos

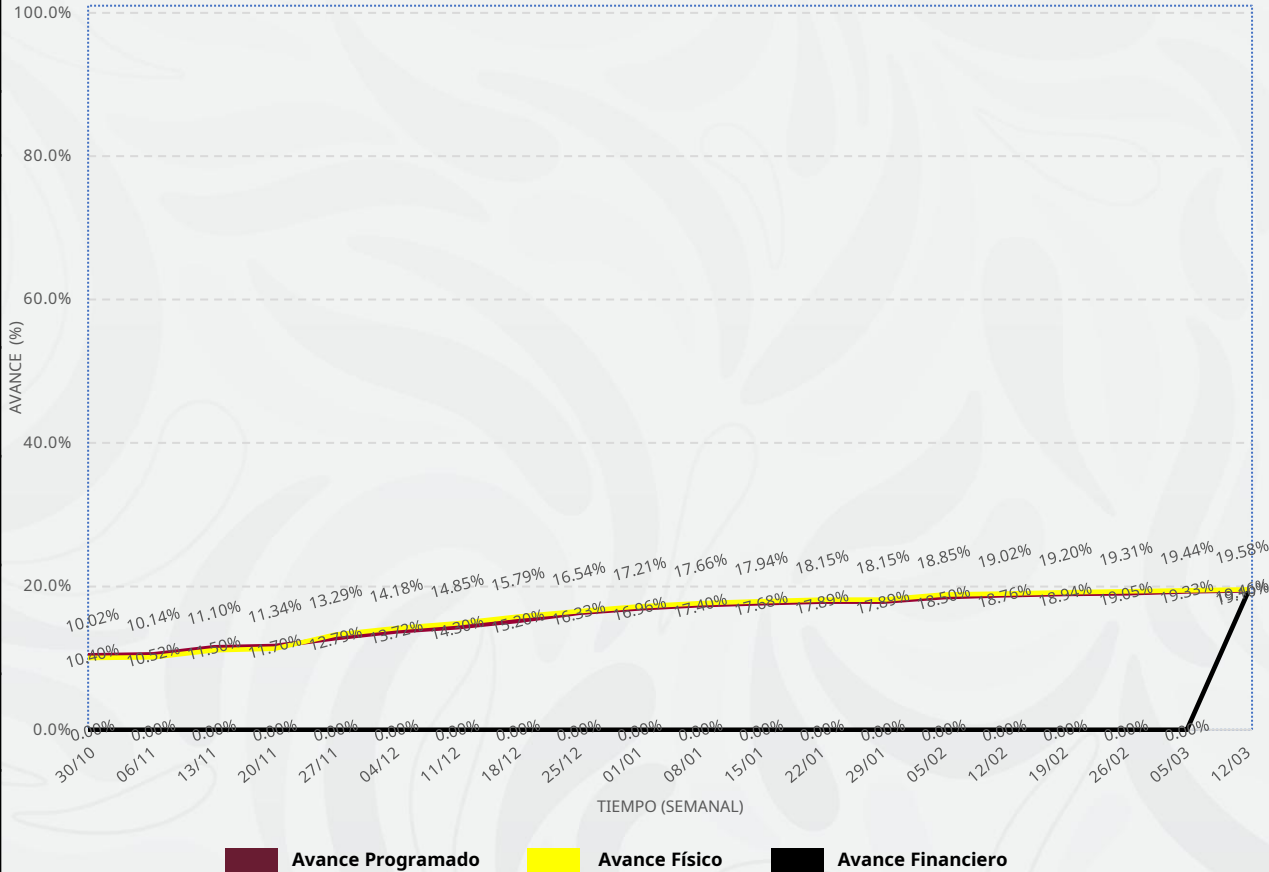

	Del 26 de febrero al 05 de marzo de 2026.	Del 05 de marzo al 12 de marzo de 2026.
Fuerza de Trabajo (personas)	805	805
Maquinaria	250	250
Frente de Trabajo	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369
