

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia


Avance físico

• Programado: 23.26 %

• Semanal: 0.97 %

• Real: 23.08 %

• Financiero: 19.10%

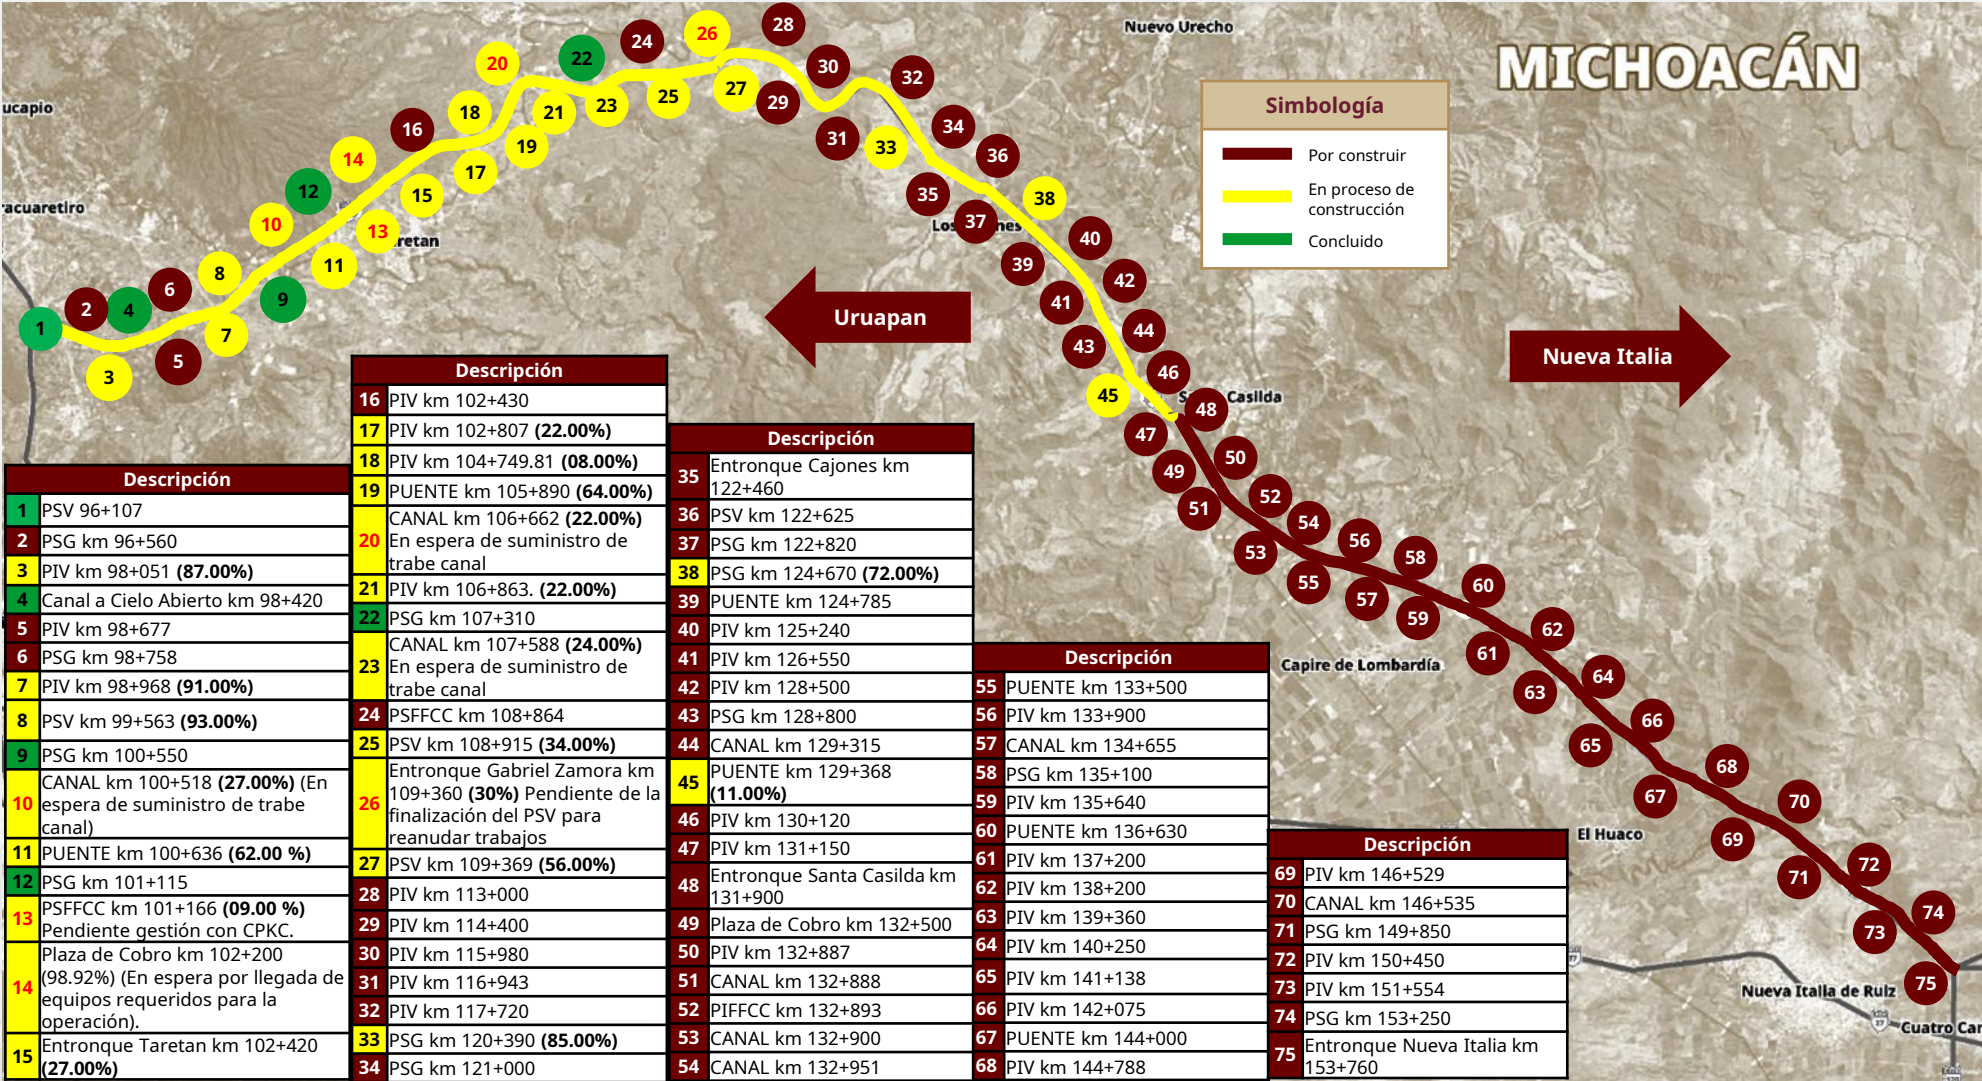


- Inversión: 7,049.9 mdp**
- Inicio:** noviembre de 2023
Término: agosto de 2027
- Meta: 67.09 km**
65.00 km (troncal)
2.09 km (estructuras)
2 Plazas de Cobro, 7 puentes, 5 Entronques, 60 cruces (5 PSV's, 30 PIV's, 13 PSG's, 1 PIFFCC, 2 PSFFCC, 9 trabes canales), 1 canal a cielo abierto (cien fuegos) y múltiples obras de drenaje.
- 21,147** empleos generados
7,049 empleos directos
14,098 empleos indirectos
- 1,800,000** habitantes beneficiados
- 25 minutos** de ahorro en tiempo
- Concesionaria :** PINFRA.

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Avance: Programado, Físico y Financiero

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	07/05/2026 al 14/05/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Carpeta Asfáltica	65 km	10.30 km	54.70 km	.200 km	.200 km	
Base Asfáltica	65 km	12.20 km	52.80 km	.300 km	.300 km	
Base Hidráulica	65 km	13.60 km	51.40 km	.300 km	.300 km	
Subbase	65 km	15.50 km	49.50 km	.300 km	.300 km	
Subyacente	65 km	18.60 km	46.40 km	.400 km	.400 km	
PIV Km 98+051 Parapetos	2	0	2	2	2	Construcción de parapetos metálicos
PIV Km 98+968 Losas de acceso	2	1	1	1	1	Colado de concreto hidráulico para losa de acceso.
PSV Km 99+563 Accesos	2	0	2	1	1	Compactación de material y armado de escamas para MME
PIV Km 104+749 Subestructura	4	0	4	4	4	Colado de pilas (segundo trepado)
Puente Km 105+890 Superestructura	1	0	1	1	1	Colado de concreto para losa (claro #3)
PIV Km 106+863 Subestructura	1	0	1	1	1	Armado de acero de refuerzo para cabezal en apoyo #2

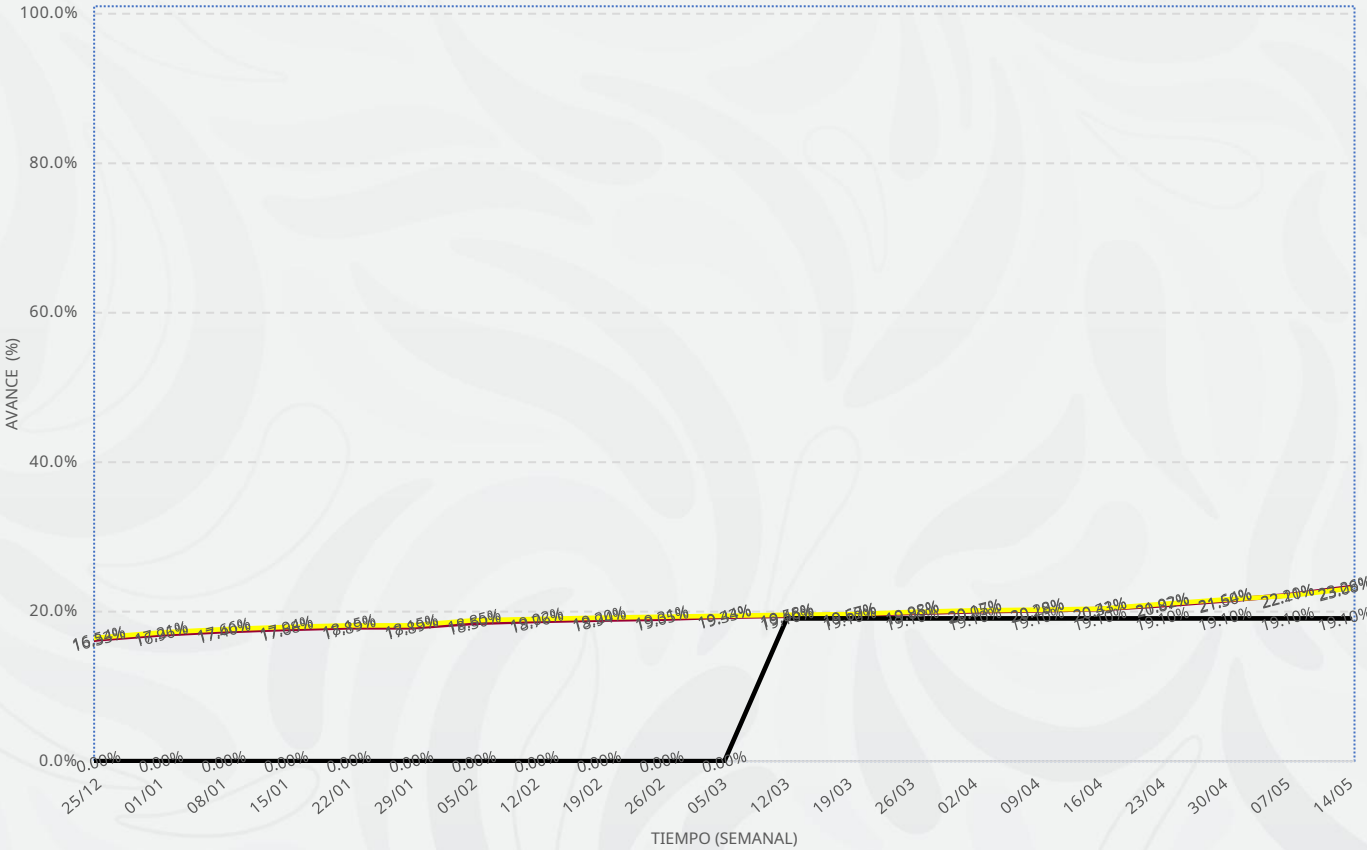

	Del 30 de abril al 07 de mayo de 2026.	Del 07 de mayo al 14 de mayo de 2026.
Fuerza de Trabajo (personas)	805	805
Maquinaria	255	255
Frente de Trabajo	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369, PSG km 120+390	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369, PSG km 120+390, PSG km 124+670
