

Michoacán


Uruapan-Nueva Italia



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 21.50%
- Real: 21.64 %
- Semanal: 0.62 %
- Financiero: 19.10%

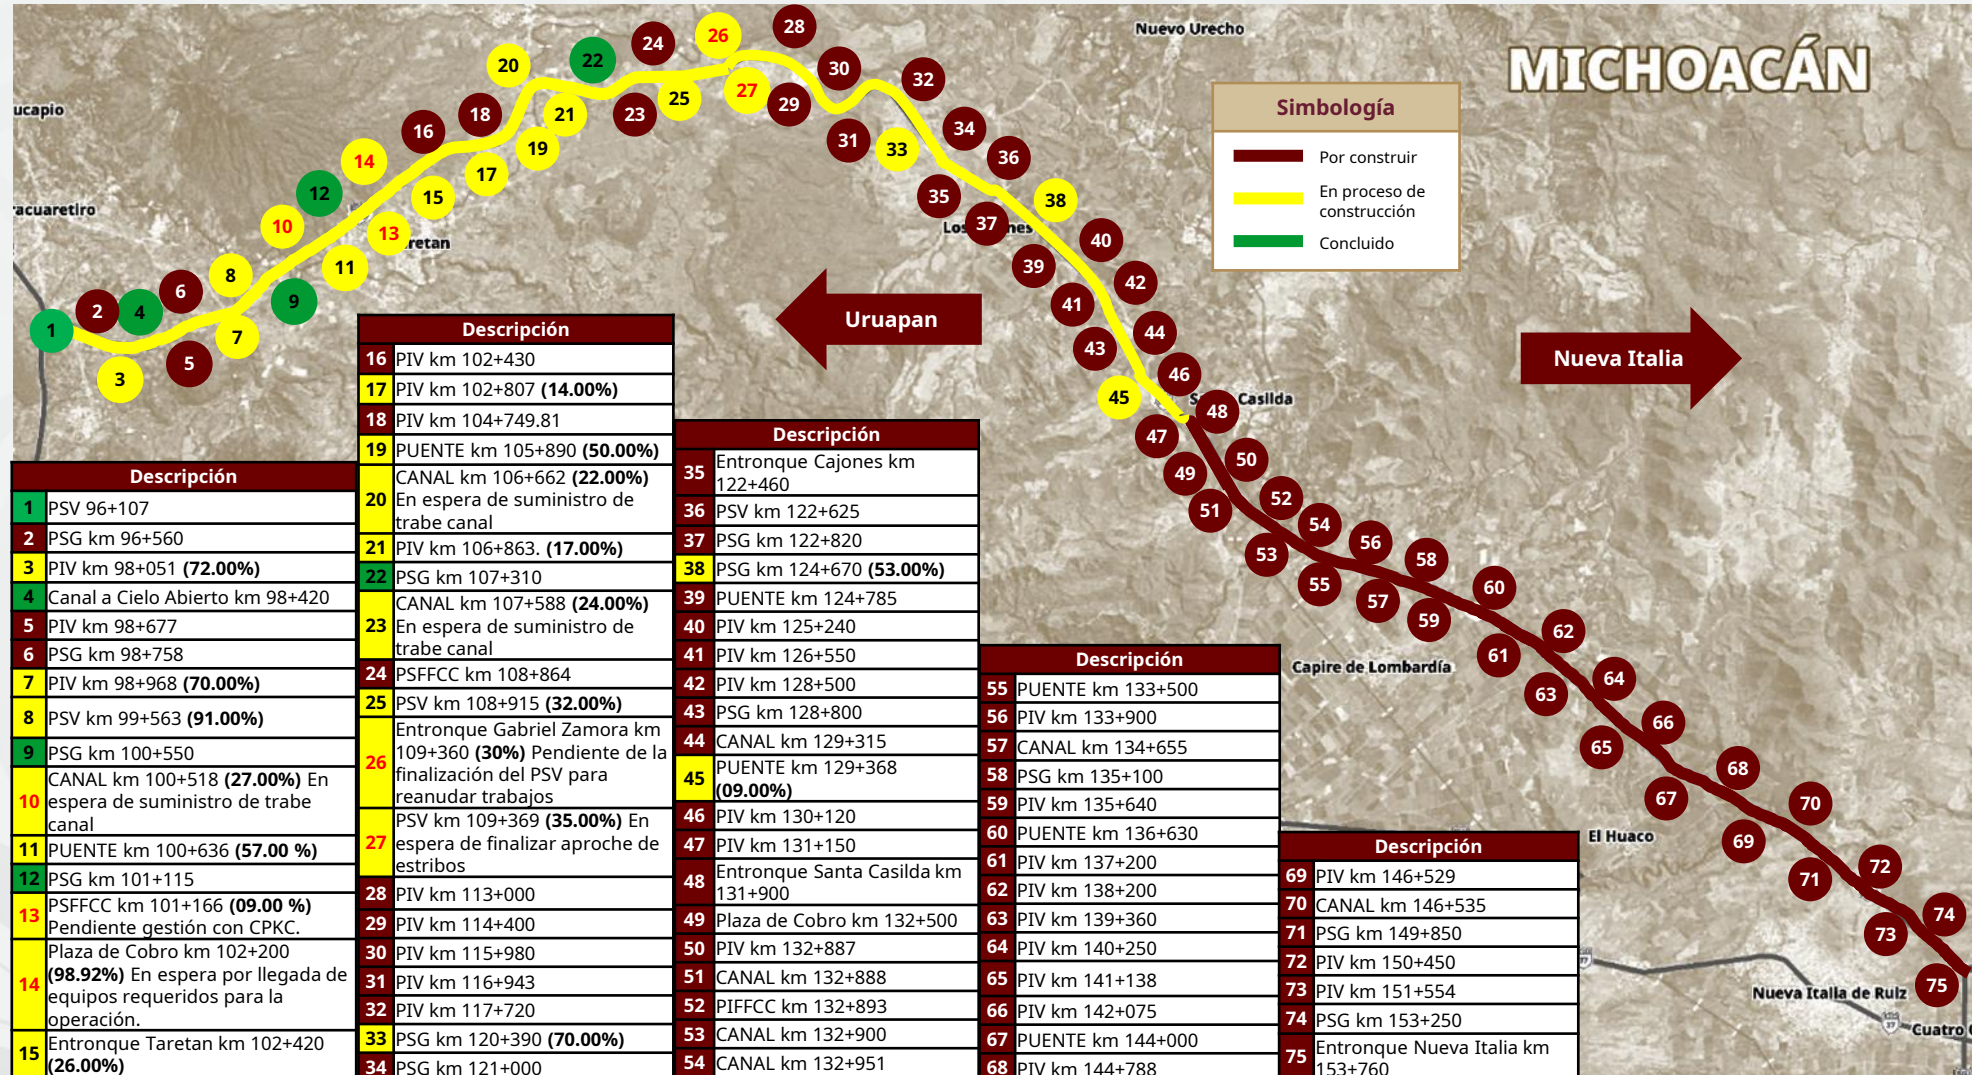


- Inversión: 7,049.9 mdp**
- Inicio:** noviembre de 2023
Término: agosto de 2027
- Meta: 67.09 km**
 - 65.00 km (troncal)
 - 2.09 km (estructuras)
 - 2 Plazas de Cobro, 7 puentes, 5 Entronques, 60 cruces (5 PSV's, 30 PIV's, 13 PSG's, 1 PIFFCC, 2 PSFFCC, 9 trabes canales), 1 canal a cielo abierto (cien fuegos) y múltiples obras de drenaje.
- 21,147 empleos generados**
7,049 empleos directos
14,098 empleos indirectos
- 1,800,000 habitantes beneficiados**
- 25 minutos de ahorro en tiempo**
- Concesionaria : PINFRA.**

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia



Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	23/04/2026 al 30/04/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Carpeta Asfáltica	65 km	7.30 km	57.70 km	.200 km	.200 km	
Base Asfáltica	65 km	11.70 km	53.30 km	.200 km	.200 km	
Base Hidráulica	65 km	13.00 km	52.00 km	.300 km	.300 km	
Subbase	65 km	14.90 km	50.10 km	.300 km	.300 km	
Subyacente	65 km	17.80 km	46.40 km	.400 km	.400 km	
PIV Km 98+051 Superestructura	1	0	1	1	1	Armado de acero para parapeto de concreto y habilitado de cimbra de madera
PSV Km 98+051 Accesos	1	0	1	1	1	Colocación de "escamas" y conformación de capa de material en muro mecánicamente estabilizado para accesos de PSV.
Puente Km 100+636 Accesos	1	0	1	1	1	Colocación de enrocamiento para terraplén en acceso #2
PIV Km 102+807 Cimentación	1	0	1	1	1	Armado de acero para pilas y habilitado de cimbra metálica para apoyo #2.
Puente Km 105+890 Superestructura	8	0	8	8	8	Armado de acero para muro de respaldo en claro #1 y armado de acero para losa en claro #3
PSG Km 124+670	1	0	1	1	1	Armado de acero y habilitado de cimbra para losa

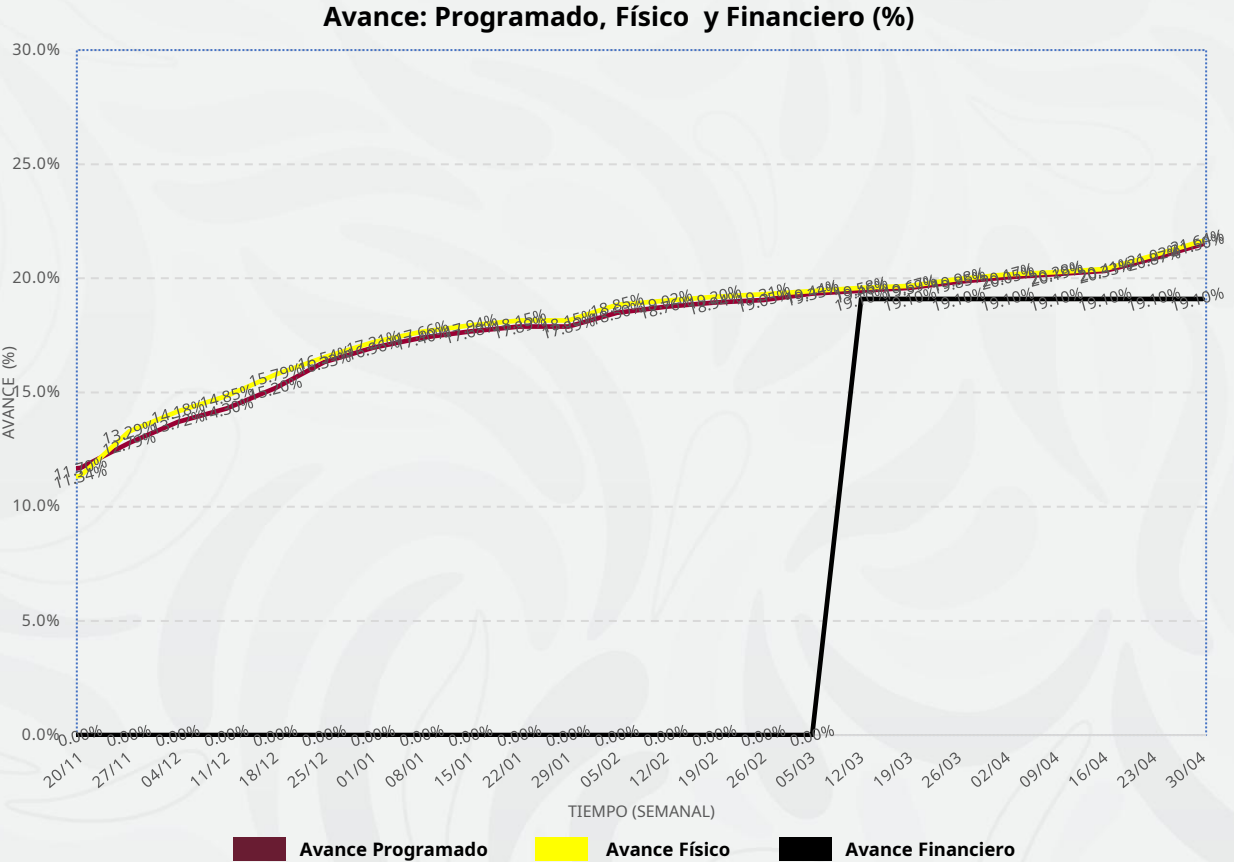

	Del 16 de abril al 23 de abril de 2026.	Del 23 de abril al 30 de abril de 2026.
Fuerza de Trabajo (personas)	805	805
Maquinaria	255	255
Frente de Trabajo	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369, PSG km 120+390	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369, PSG km 120+390, PSG km 124+670
