


Michoacán

Lázaro Cárdenas-Nueva Italia

Avance físico

- Programado: 0.00%
- Real: 0.09%
- Semanal: 0.01 %
- Financiero: 0.00%

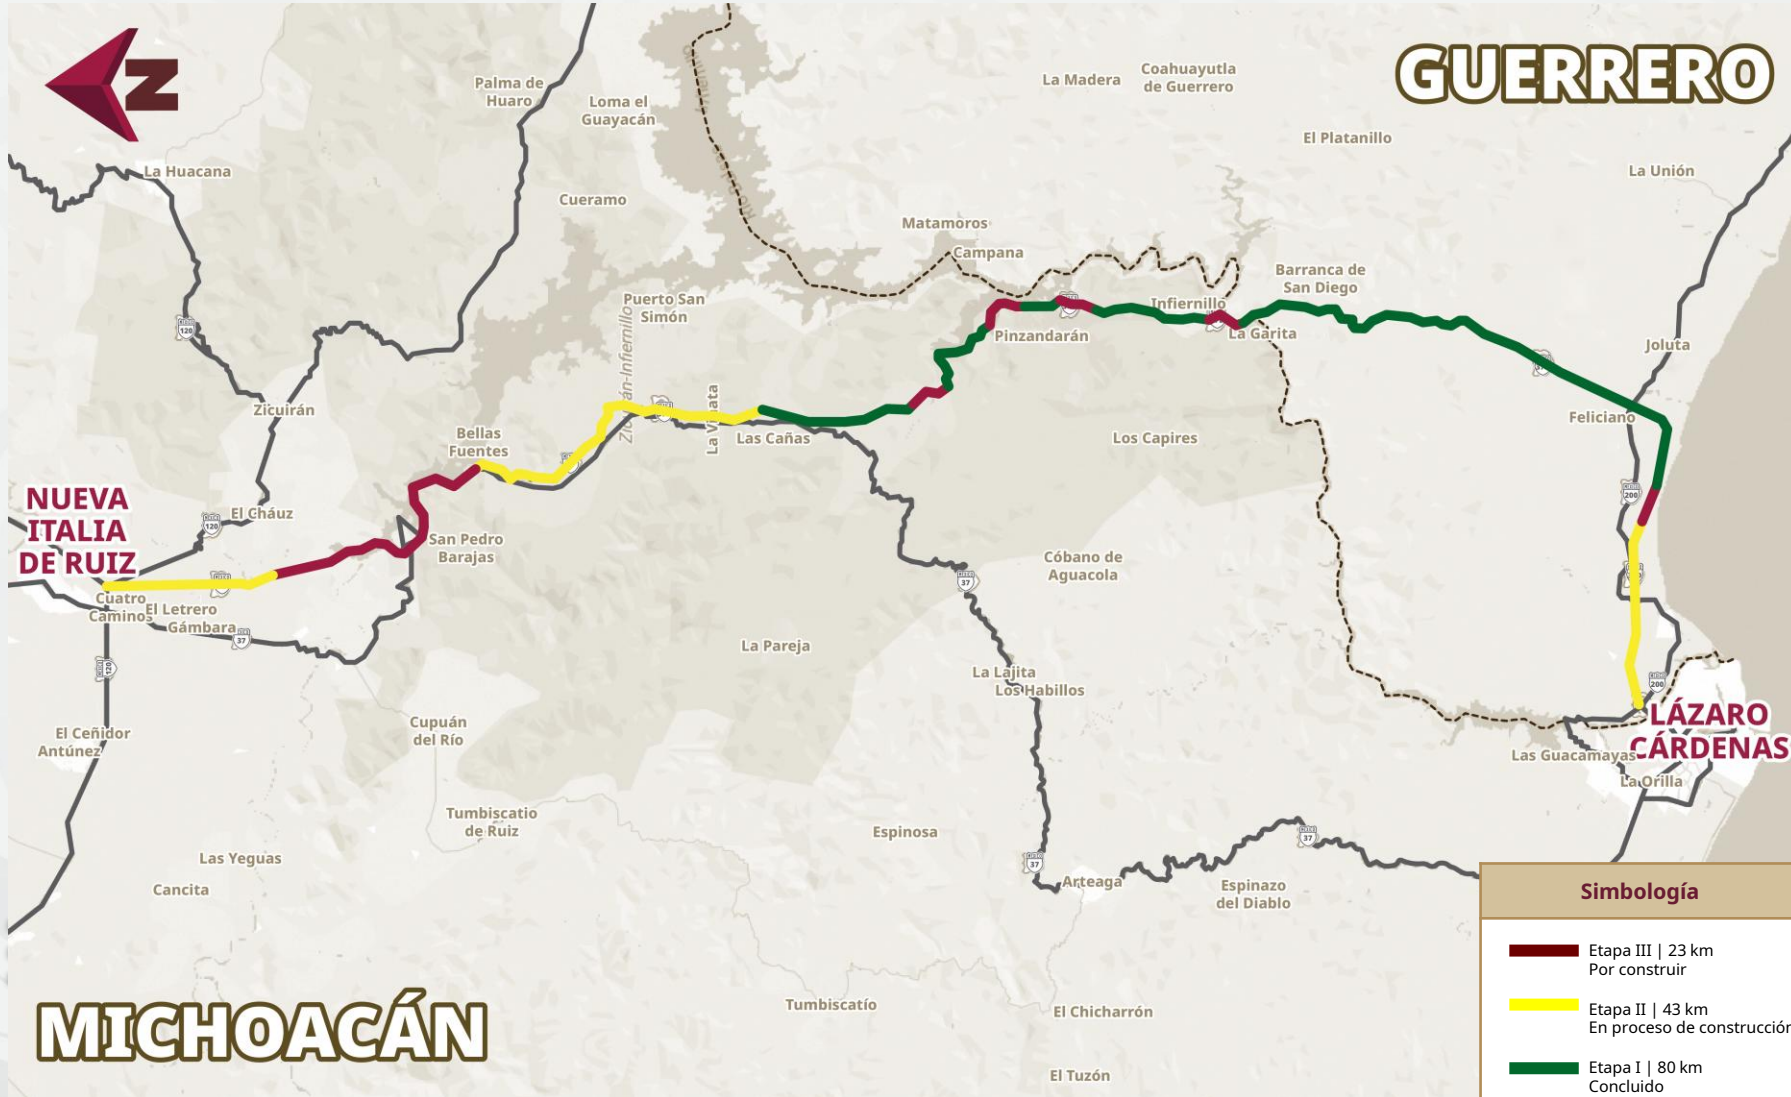

ACTUALIZADA 07/05/26



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Inversión: 16,000 mdp



Inicio: Marzo 2026

Término: 2029



Meta: 146 km

45 PIV's | 3 PSV's | 28

Puentes de concreto | 5 PSFCC
| 1 Túnel

1 Ampliación de plaza de cobro
3 Puentes de acero (estructuras
complejas)



4,123 empleos generados




**1,800,000 habitantes
beneficiados**

Michoacán

Lázaro Cárdenas-Nueva Italia

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	30/04/2026 al 07/05/2026	
				Programado	Ejecutado
Desmonte	146 km	9.50 km	136.50 km	.100 km	.100 km
Movimiento de tierras	146 km	0.900 km	145.00 km	.100 km	.100 km

Avance: Programado, Físico y Financiero

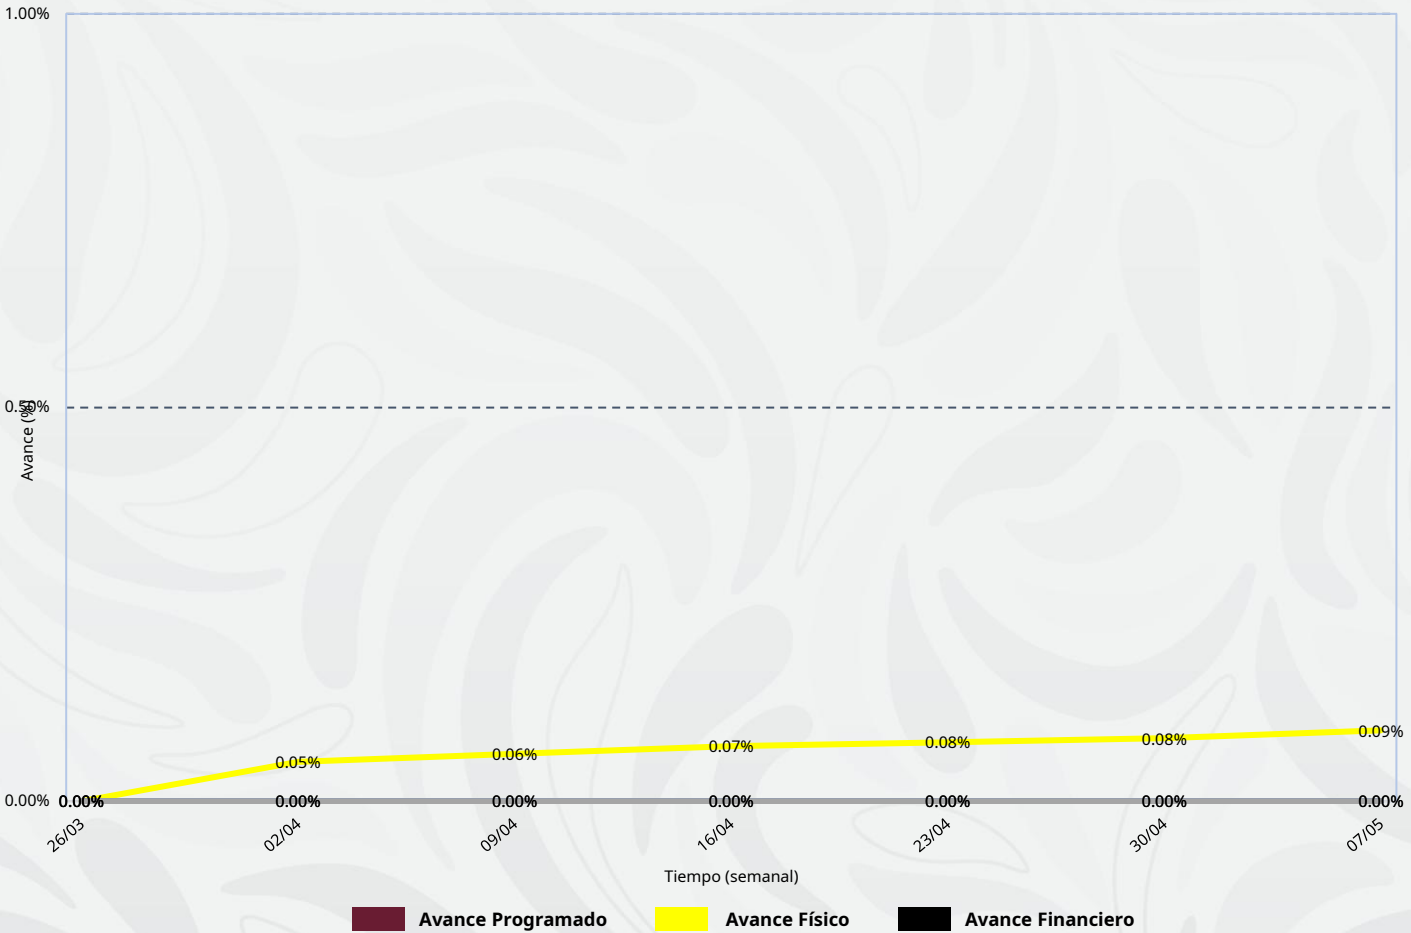

	Del 23 de abril al 30 de abril de 2026.	Del 30 de abril al 07 de mayo de 2026.
Fuerza de Trabajo (personas)	50	50
Maquinaria	20	20
Frente de Trabajo	Actividades de deshierbe y desmonte	Actividades de deshierbe y desmonte
