

Estado de México

Atizapán-Atlacomulco



Descripción	
1	Entronque Chiluca 15.00% , sin actividad, falta de recursos
2	Viaducto Sin Nombre km 20+880.00 53.90%
3	Viaducto La Estadía km 22+332.00 53.93%
4	Viaducto Los Gallos km 27+425.00 47.54%
5	Túnel Los Gallos km 27+770.00 95.00% , sin actividad, faltan todos los elementos electromecánicos y pavimento
6	Viaducto Sin Nombre km 31+033.00 49.82%
7	Viaducto Tlazala km 31+359.00 45.01%
8	Túnel Cahuacán I km 36+258.00 95.00% , sin actividad, faltan todos los elementos electromecánicos y pavimento
9	Viaducto Cahuacán III km 38+995.00 26.14% ,
10	Viaducto Sin Nombre km 42+053.00 5.44%
11	Entronque Villa del Carbón km 47+974.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
12	Viaducto El Llano km 51+016.00 00.90% sin actividad, problemas sociales
13	Viaducto Sin Nombre km 54+770.00 03.80% , sin actividad, problemas sociales
14	Viaducto Los Chaparrales km 73+387.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
15	Viaducto El Pescado km 75+482.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
16	Entronque Ixtlahuaca km 76+188.00 35.00% , sin actividades, problemas sociales
17	Entronque La Luna km 83+960.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
18	Viaducto El Salto km 91+874.00 16.80% , sin actividad, problemas sociales
19	Entronque Atlacomulco



Inversión: 9,865.8 mdp a precios de 2014 incluye I.V.A., incluye monto de obra (7,662mdp) y Fondo de Obra Adicional (843 mdp)



Meta: 74 km, 2 Plazas de cobro, 12 Viaductos, 2 Túneles, 4 Entronques, 80 PSVyG



Inicio: 01 marzo 2016
Término: 30 junio 2027



Avance físico:

- Programado: 97.80%
- Real: 53.84%
- Financiero: 24.70%
- Semanal: 00.20%



132,909 empleos generados (44,303 directos y 88,606 indirectos)



1 millón 244 mil habitantes beneficiados




60 minutos de ahorro en tiempo

Estado de México

Atizapán-Atlacomulco

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	27/02/26 al 05/03/2026		Observaciones
				Programad o	Ejecutad o	
Pilotes	344	194	150	2	1.09	• La mano de obra se mantiene para alcanzar las expectativas correspondientes.
Zapatas	86	48	38	1	0.22	
Columnas	96	28	68	1	0.45	
Cabezales	76	13	63	1	0.98	
Caballetes	24	9	15	1	0.17	
Trabes de concreto	395	0	395	0	0	
Trabes metálicas	29	1	28	1	0.44	

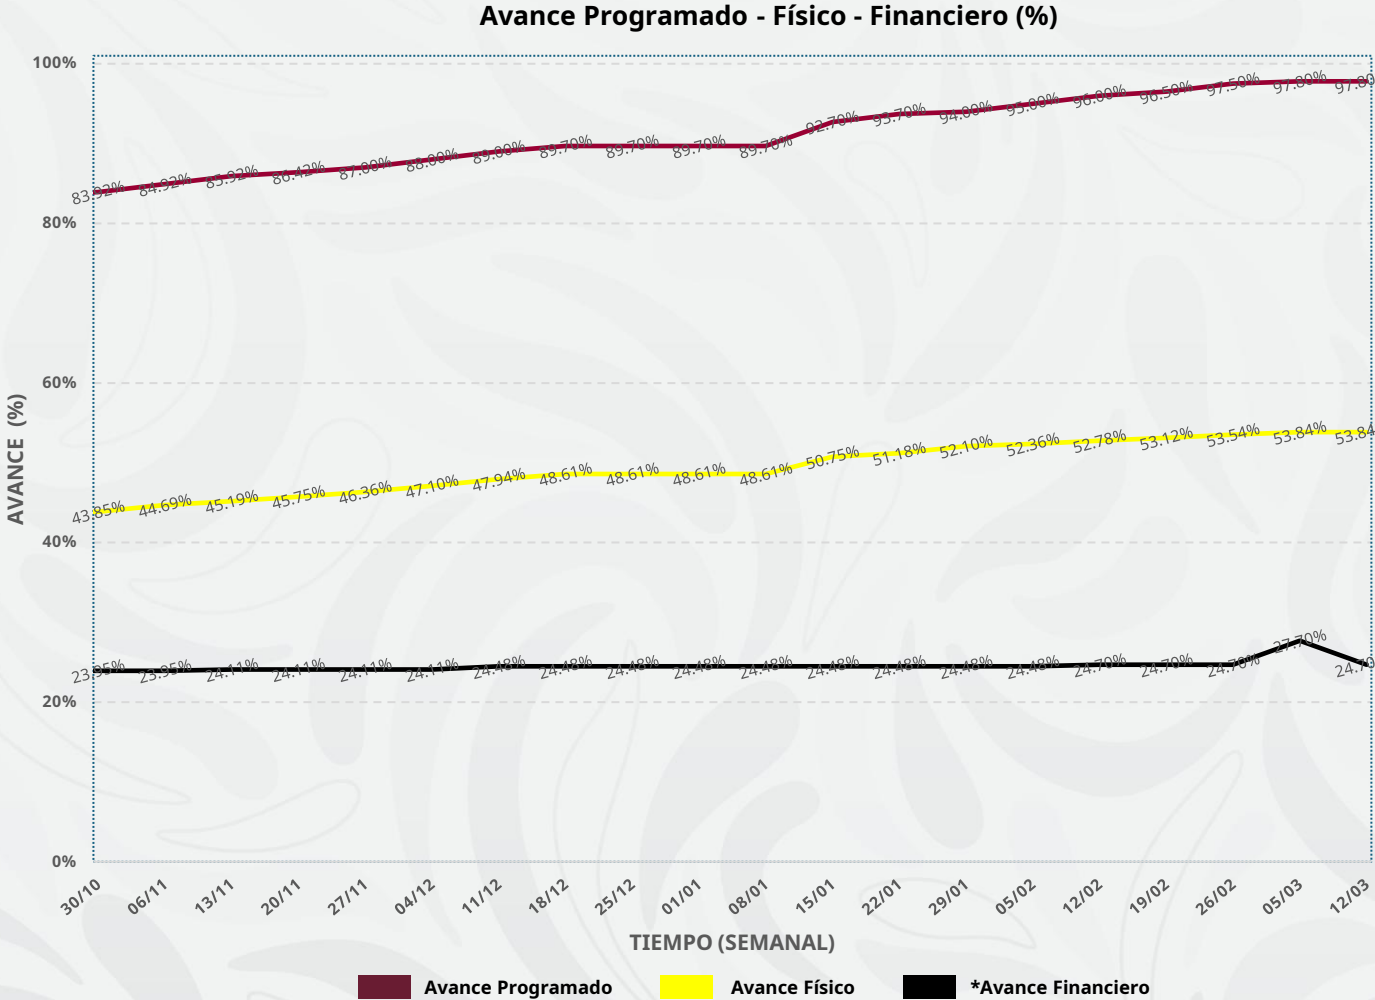

Tramos 01, 2A y 2B	Del 27 febrero al 05 marzo	Del 06 al 12 de marzo
Fuerza de Trabajo (personas)	1,960	1,960
Maquinaria	507	507
Frentes de trabajo	Tramos 01, 2A y 2B	Tramos 01, 2A y 2B
