


Michoacán

Lázaro Cárdenas-Nueva Italia

Avance físico

- Programado: 0.00%
 - Real: 0.05%
- Semanal: 0.05 %
 - Financiero: 0.00%

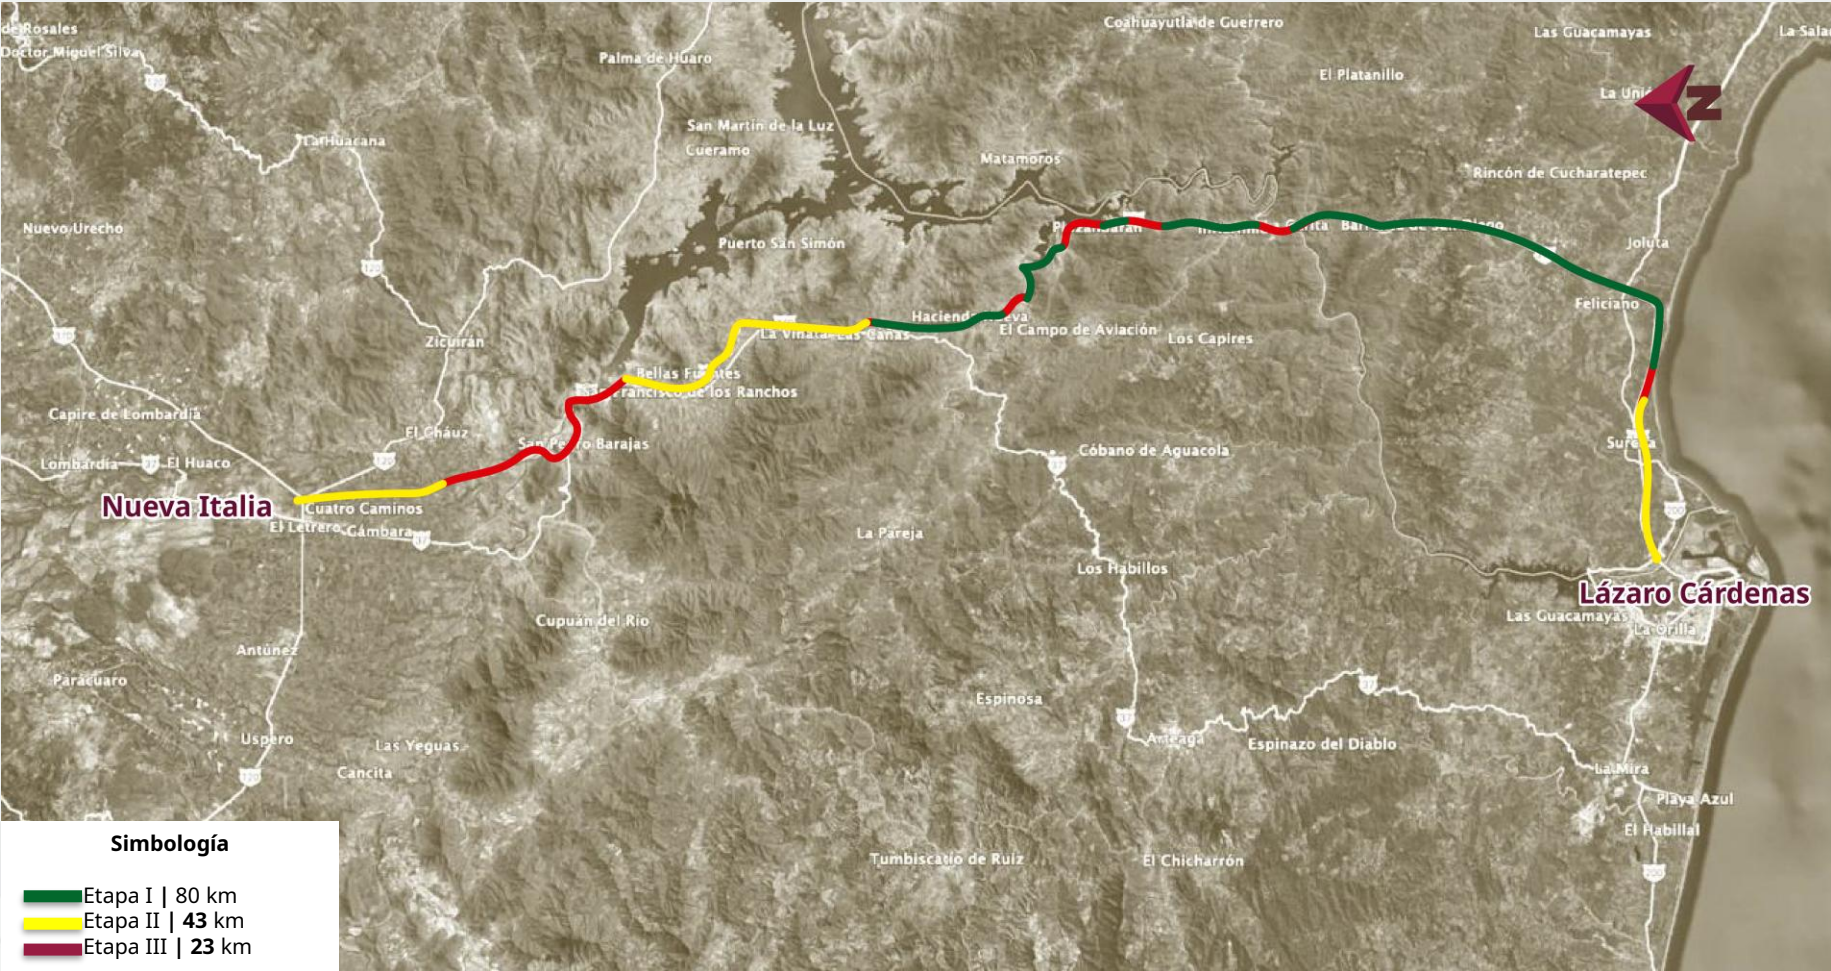

- 

Inversión: 16,000 mdp
- 

Inicio: Marzo 2026
Término: 2029
- 

Meta: 146 km
45 PIV's | 3 PSV's | 28 Puentes de concreto | 5 PSFCC | 1 Túnel
1 Ampliación de plaza de cobro
3 Puentes de acero (estructuras complejas)
- 

4,123 empleos generados
- 

1,800,000 habitantes beneficiados

INICIO DE OBRA
