


Estado de México

Atizapán-Atlacomulco

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	14/05/2026 al 21/05/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Pilotes	344	207	139	2	2	• La mano de obra se incrementó un poco para alcanzar las expectativas correspondientes.
Zapatas	86	51	35	0	0	
Columnas	96	30	66	1	0.5	
Cabezales	76	14.5	61.5	1	0	
Caballetes	24	9.5	14.5	0	0	
Trabes de concreto	395	8	387	0	0	
Trabes metálicas	29	1.5	27.5	1	0.0	

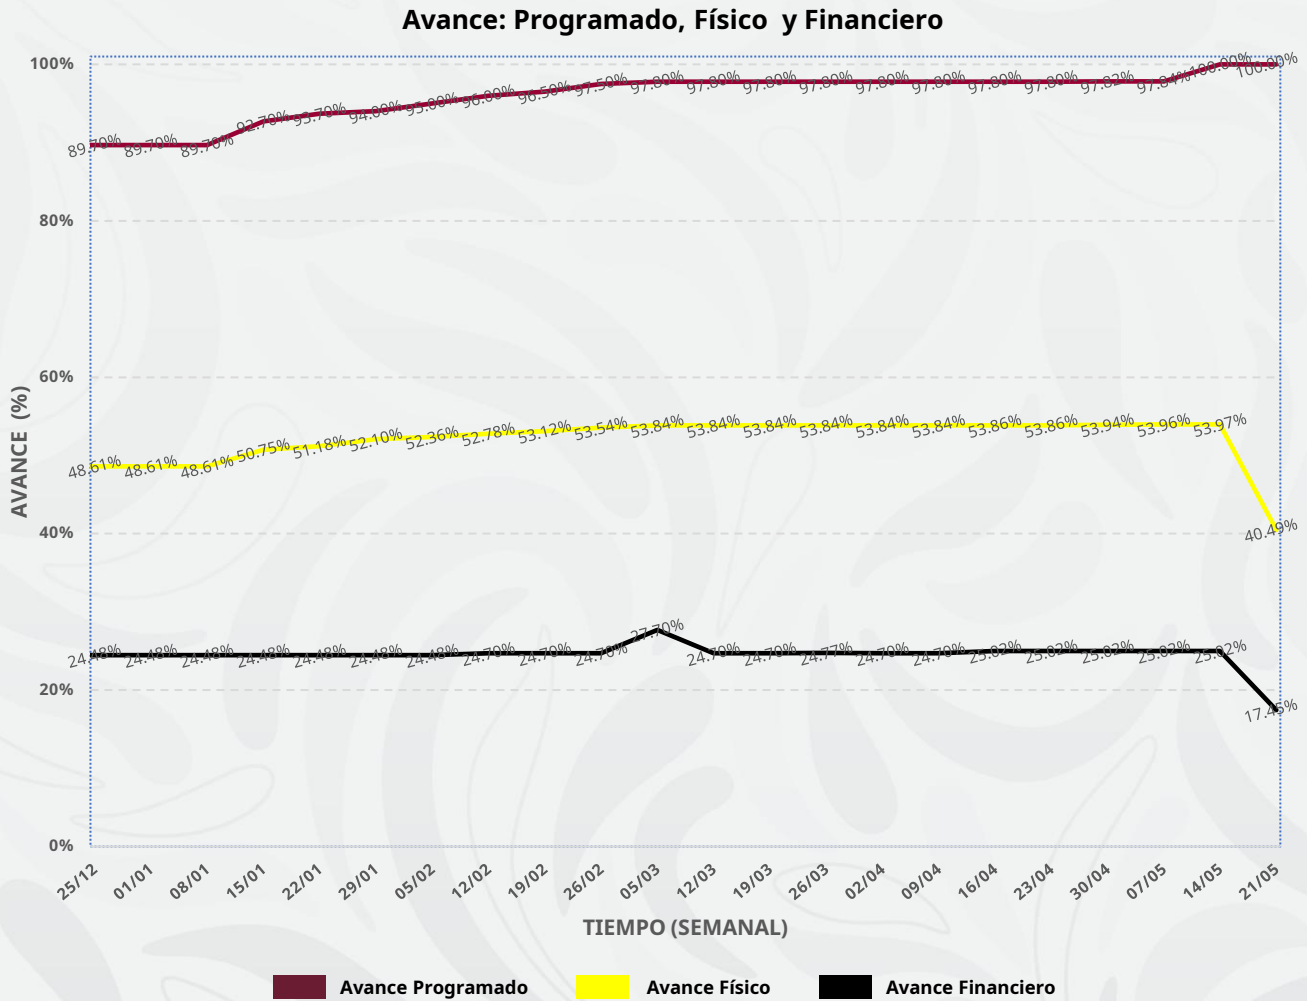

	Del 08 al 14 de mayo	Del 15 al 21 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	2,360	2,567
Maquinaria	407	415
Frentes de trabajo	Tramos 01, 2A y 2B	Tramos 01, 2A y 2B
