


Michoacán

Lázaro Cárdenas-Nueva Italia

Avance físico

- Programado: 0.00%
- Real: 0.15%
- Semanal: 0.05 %
- Financiero: 0.00%

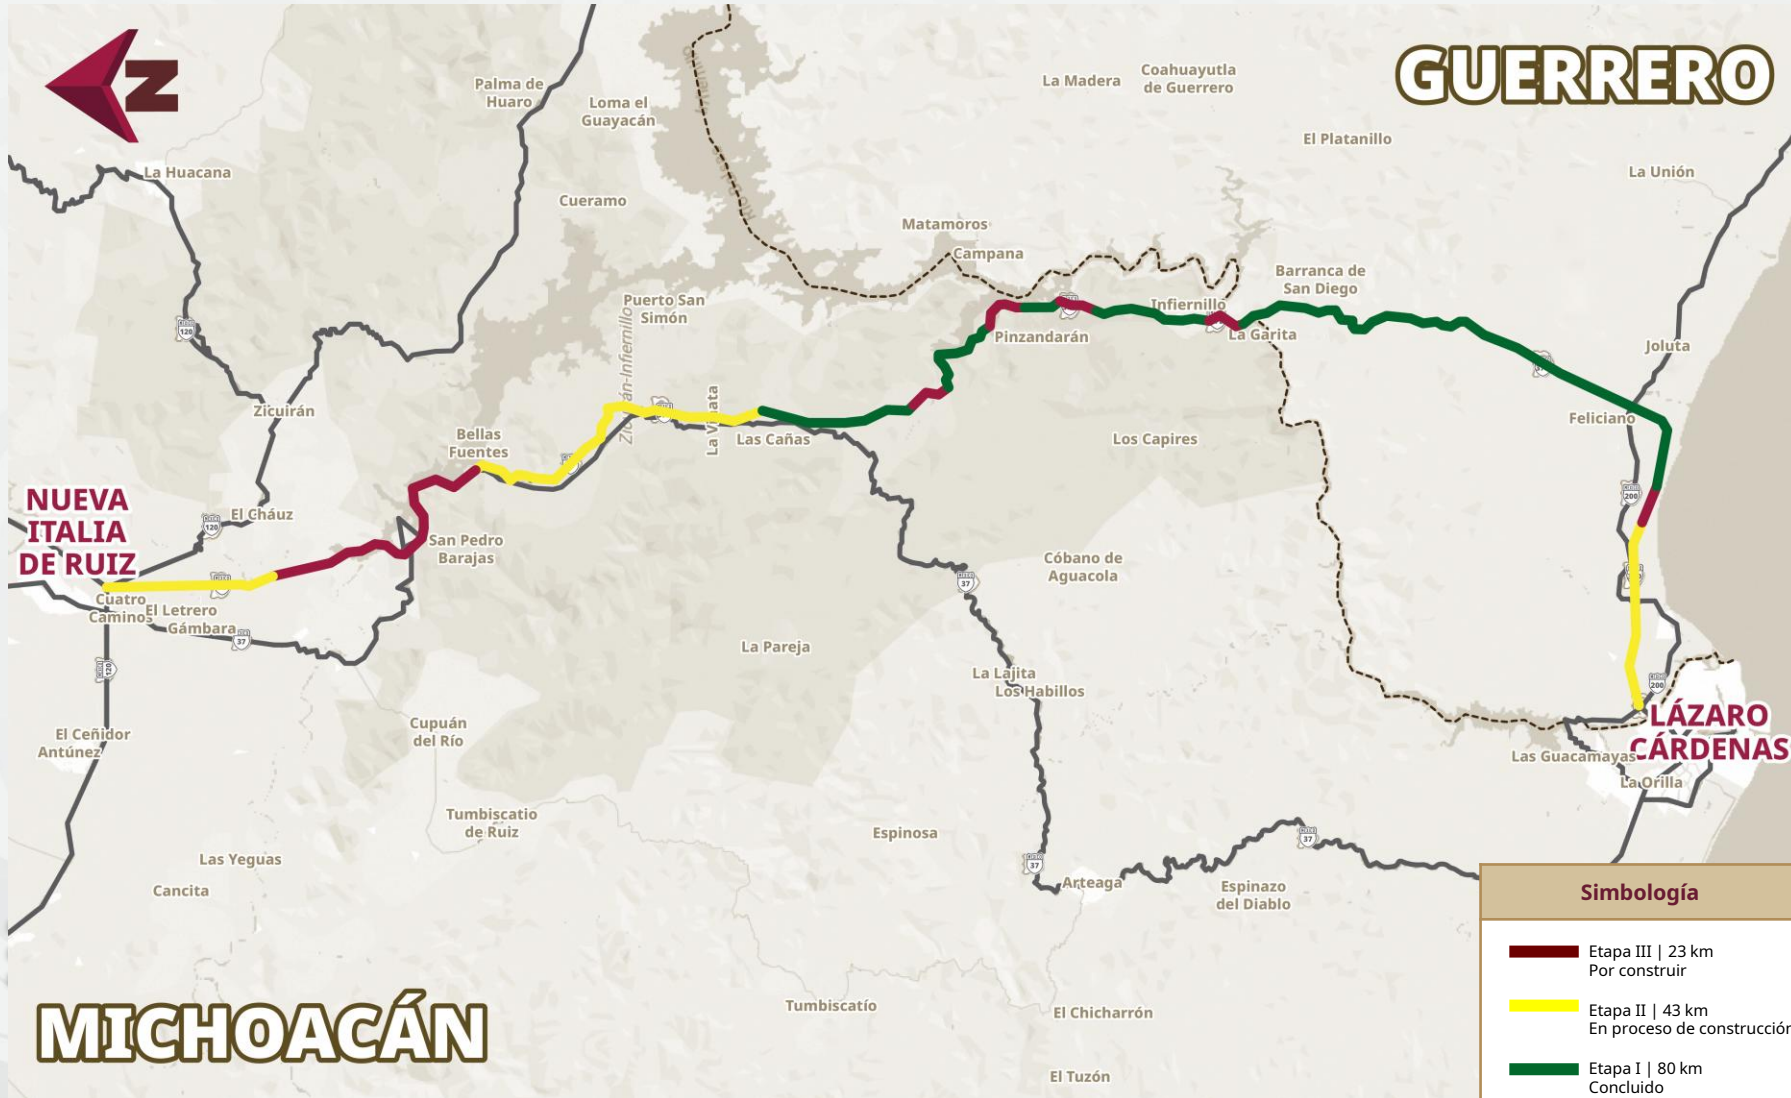

ACTUALIZADA 26/05/2026



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Inversión: 16,000 mdp



Inicio: Marzo 2026

Término: 2029



Meta: 146 km

45 PIV's | 3 PSV's | 28

Puentes de concreto | 5 PSFCC
| 1 Túnel

1 Ampliación de plaza de cobro
3 Puentes de acero (estructuras
complejas)



4,123 empleos generados




**1,800,000 habitantes
beneficiados**

Michoacán

Lázaro Cárdenas-Nueva Italia

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	14/05/2026 al 21/05/2026	
				Programado	Ejecutado
Desmonte	146 km	9.70 km	136.30 km	.100 km	.100 km
Movimiento de tierras	146 km	1.20 km	144.80 km	.100 km	.100 km

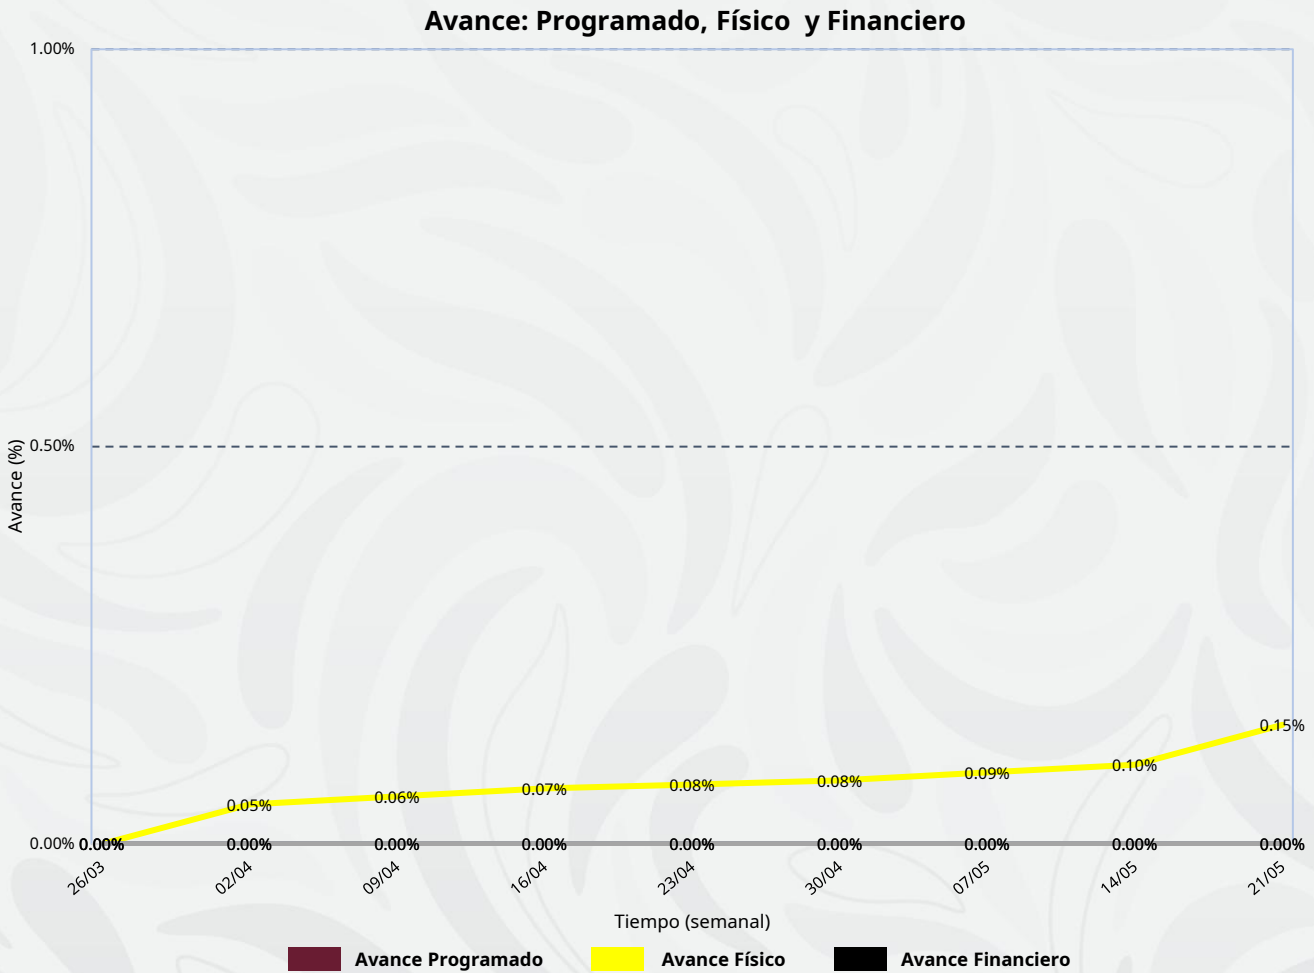

	Del 07 de mayo al 14 de mayo de 2026.	Del 14 de mayo al 21 de mayo de 2026.
Fuerza de Trabajo (personas)	50	50
Maquinaria	20	20
Frente de Trabajo	Actividades de deshierbe y desmonte	Actividades de deshierbe y desmonte
