

Michoacán


Uruapan-Nueva Italia



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

- Avance físico**
- Programado: 20.87%
 - Real: 21.02 %
 - Semanal: 0.61 %
 - Financiero: 19.10%

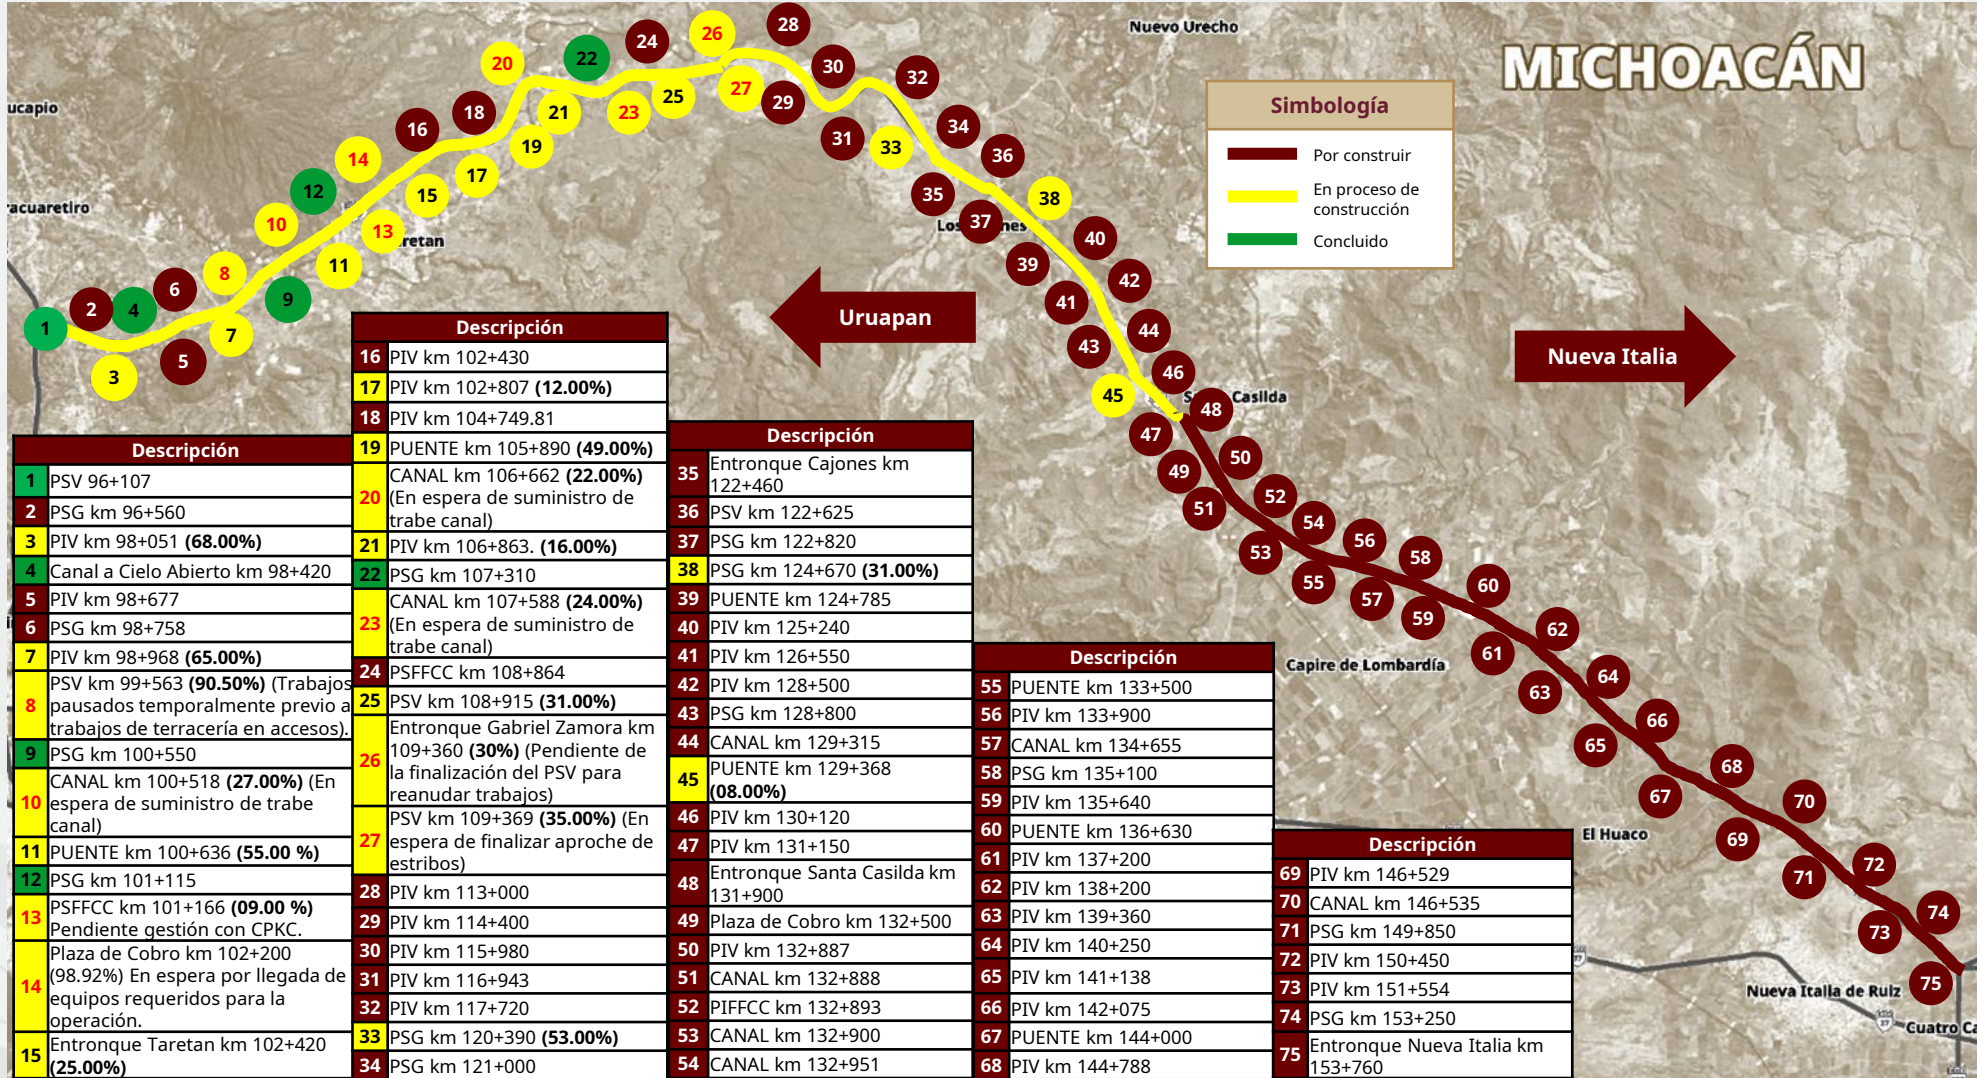

- Inversión: 7,049.9 mdp**
- Inicio:** noviembre de 2023
Término: agosto de 2027
- Meta: 67.09 km**
 - 65.00 km (troncal)
 - 2.09 km (estructuras)
- 2 Plazas de Cobro, 7 puentes, 5 Entronques, 60 cruces (5 PSV's, 30 PIV's, 13 PSG's, 1 PIFCC, 2 PSFFCC, 9 trabes canales), 1 canal a cielo abierto (cien fuegos) y múltiples obras de drenaje.
- 21,147 empleos generados**
7,049 empleos directos
14,098 empleos indirectos
- 1,800,000 habitantes beneficiados**
- 25 minutos de ahorro en tiempo**
- Concesionaría : PINFRA.**


Michoacán

Uruapan-Nueva Italia



Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	17/04/2026 al 23/04/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Asfáltica	65 km	11.50 km	53.50 km	.300 km	.300 km	
Base Hidráulica	65 km	12.70 km	52.30 km	.300 km	.300 km	
Subbase	65 km	14.60 km	50.40 km	.300 km	.300 km	
Subyacente	65 km	17.40 km	46.80 km	.400 km	.400 km	
PIV Km 98+968 Superestructura	1	0	1	1	1	Armado de acero de refuerzo en parapeto
PIV Km 98+968 Superestructura	1	0	1	1	1	Colado de concreto hidráulico para losa.
Puente Km 100+636 Superestructura	1	0	1	1	1	Colado de concreto hidráulico para losa.
PIV Km 102+807 Cimentación	1	0	1	1	1	Armado de acero para zapata para estribo #2
Puente Km 105+890 Superestructura	8	0	8	8	8	Maniobras de montaje de trabes para claro #3
PSV Km 108+915 Subestructura	1	0	1	1	1	Colado de concreto hidráulico para 1er trepado en el estribo#2.
PSG Km 120+390	1	0	1	1	1	Retiro de cimbra de madera
PSG Km 124+670	1	0	1	1	1	Colado de 2do trepado de estribo #1

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

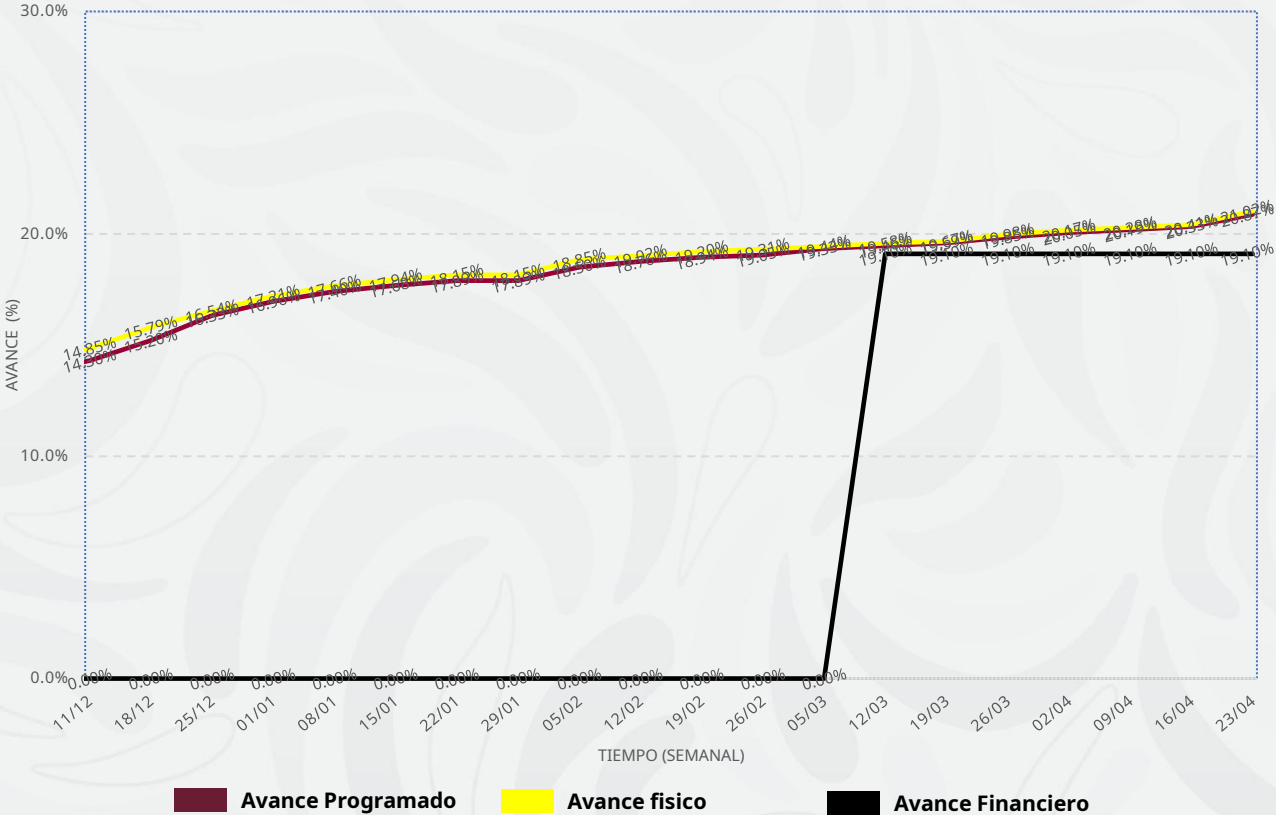

	Del 09 de abril al 16 de abril de 2026.	Del 17 de abril al 23 de abril de 2026.
Fuerza de Trabajo (personas)	805	805
Maquinaria	255	255
Frente de Trabajo	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369, PSG km 120+390	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369, PSG km 120+390, PSG km 124+670
