

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia




Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 19.59%
- Real: 19.67 %
- Semanal: 0.09 %
- Financiero: 19.10%

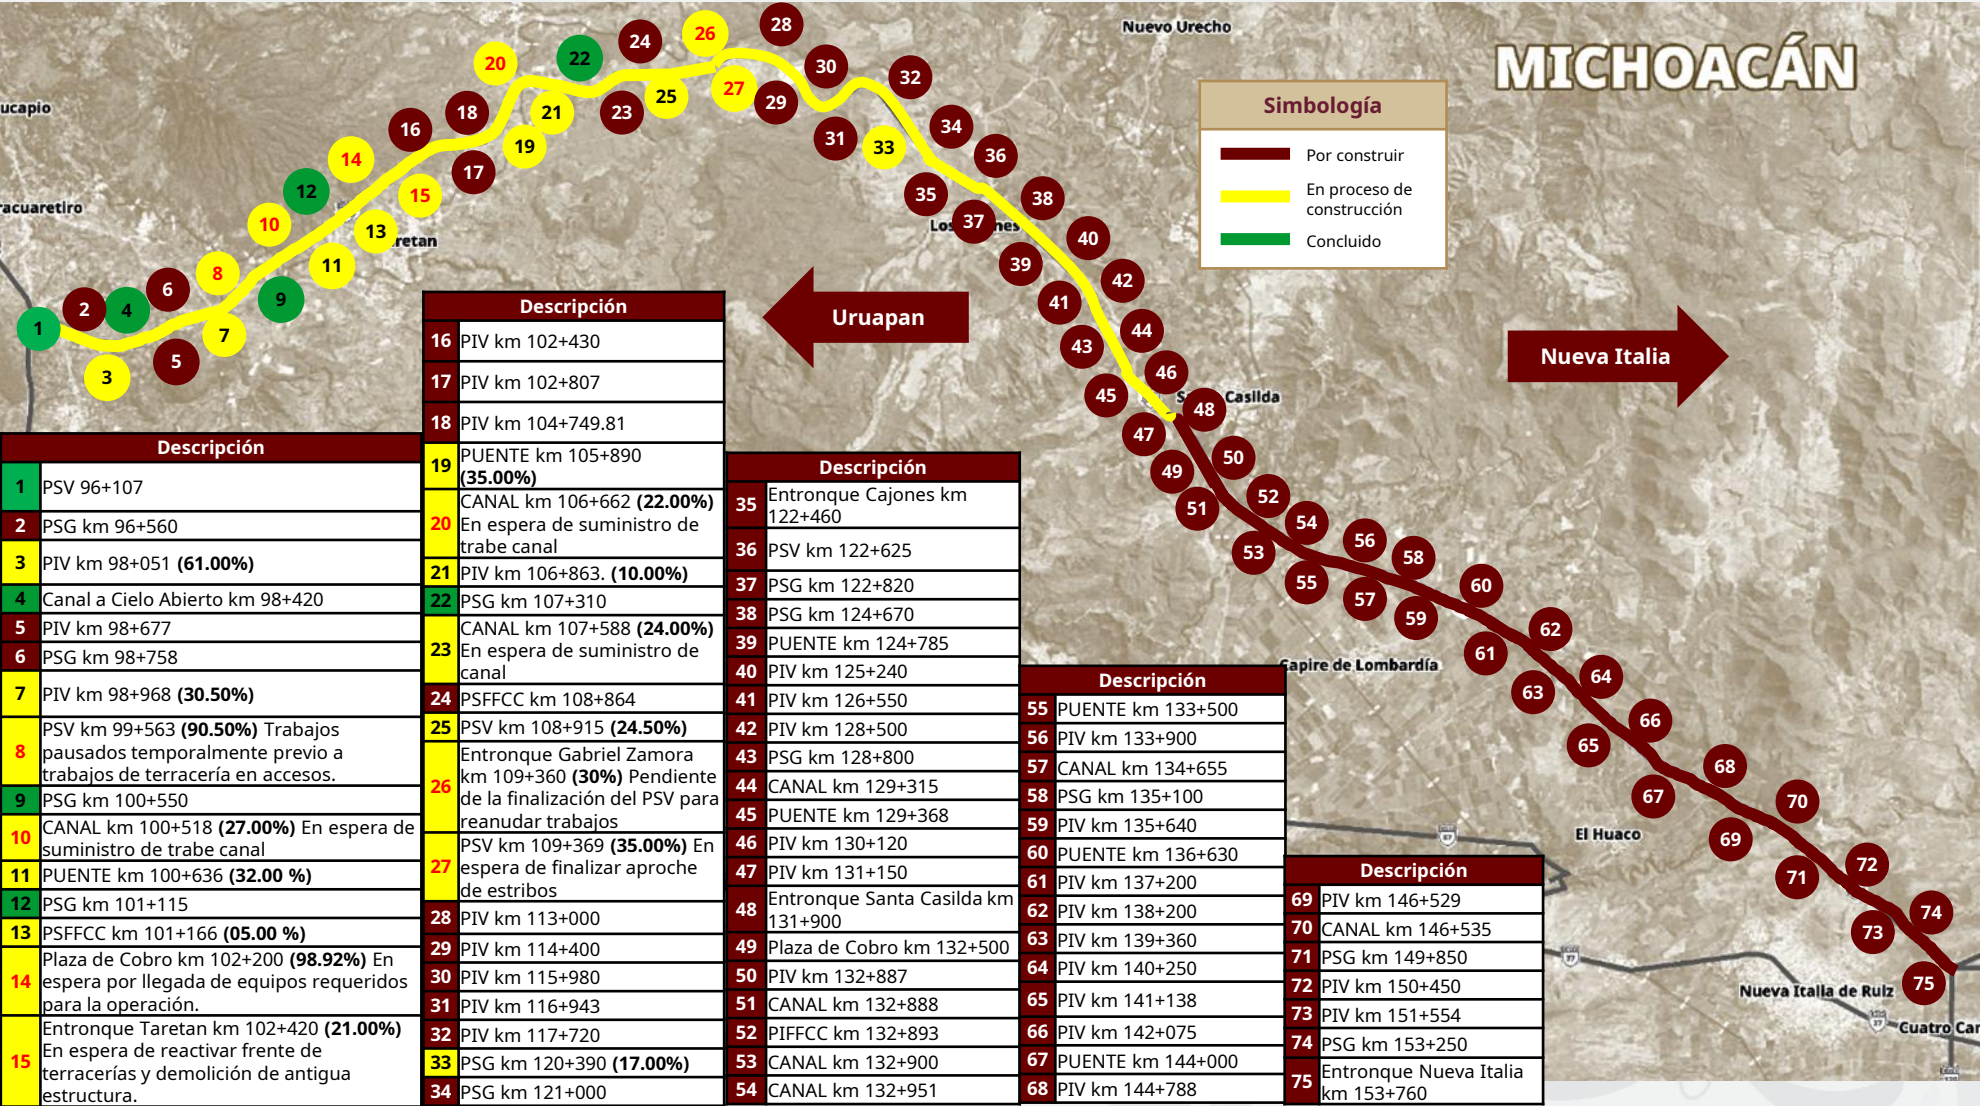


- Inversión: 7,049.9 mdp**
- Inicio:** noviembre de 2023
Término: agosto de 2027
- Meta: 67.09 km**
65.00 km (troncal)
2.09 km (estructuras)
2 Plazas de Cobro, 7 puentes, 5 Entronques, 60 cruces (5 PSV's, 30 PIV's, 13 PSG's, 1 PIFFCC, 2 PSFFCC, 9 trabes canales), 1 canal a cielo abierto (cien fuegos) y múltiples obras de drenaje.
- 21,147** empleos generados
7,049 empleos directos
14,098 empleos indirectos
- 1,800,000** habitantes beneficiados
- 25 minutos** de ahorro en tiempo
- Concesionaria :** PINFRA.

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	12/03/2026 al 19/03/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Asfáltica	65 km	10.00 km	55.00 km	.300 km	.300 km	
Base Hidráulica	65 km	11.20 km	53.80 km	.300 km	.300 km	
Subbase	65 km	13.10 km	51.90 km	.300 km	.300 km	
Subyacente	65 km	15.40 km	48.80 km	.400 km	.400 km	
PIV Km 98+051 Superestructura	9	0	9	9	9	Colado de concreto hidráulico para diafragmas intermedios
PIV Km 98+968 Superestructura	9	5	4	2	2	Armado de acero de refuerzo para la construcción de diafragmas
PSF Km 101+166 Cimentación	2	0	2	1	1	Armado de acero de refuerzo en dentellón y zapata C1.
Puente Km 105+890 Superestructura	1	0	1	1	1	Colado de concreto hidráulico para cabezal #1 y bancos de apoyo en cabezales 2, 3 y 4
PSV Km 108+915 Subestructura	1	0	1	1	1	Armado de acero de refuerzo para cabezal en el estribo #1
PSG Km 120+390 Subestructura	1	0	1	1	1	Habilitado de cimbra y armado de acero de refuerzo para segundo trepado en el estribo #1

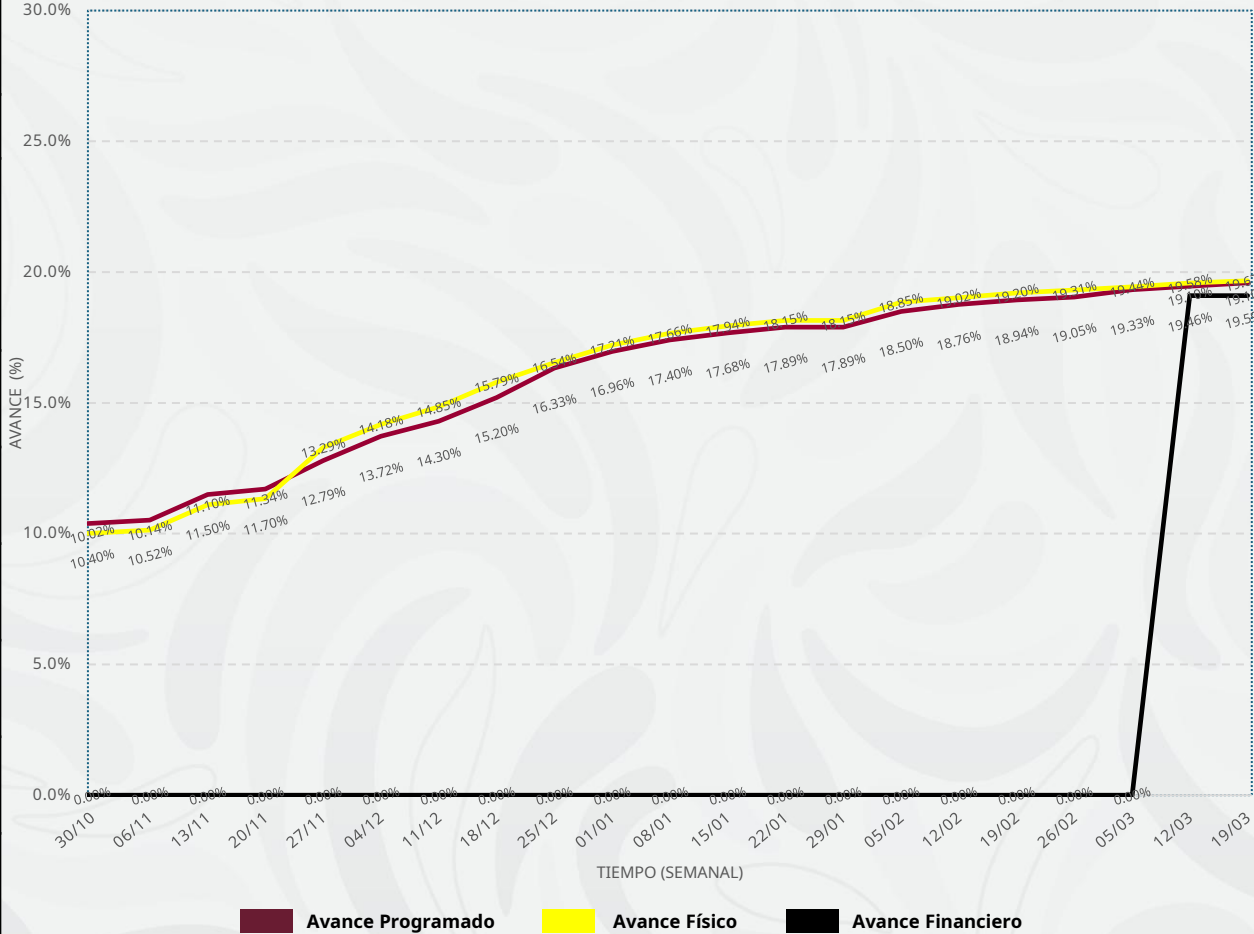

	Del 05 de marzo al 12 de marzo de 2026.	Del 12 de marzo al 19 de marzo de 2026.
Fuerza de Trabajo (personas)	805	805
Maquinaria	250	250
Frente de Trabajo	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369
