


Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Avance físico

- Programado: 100.00%
- Semanal: 0.62%
- Real: 72.0%
- Financiero: 65.0%

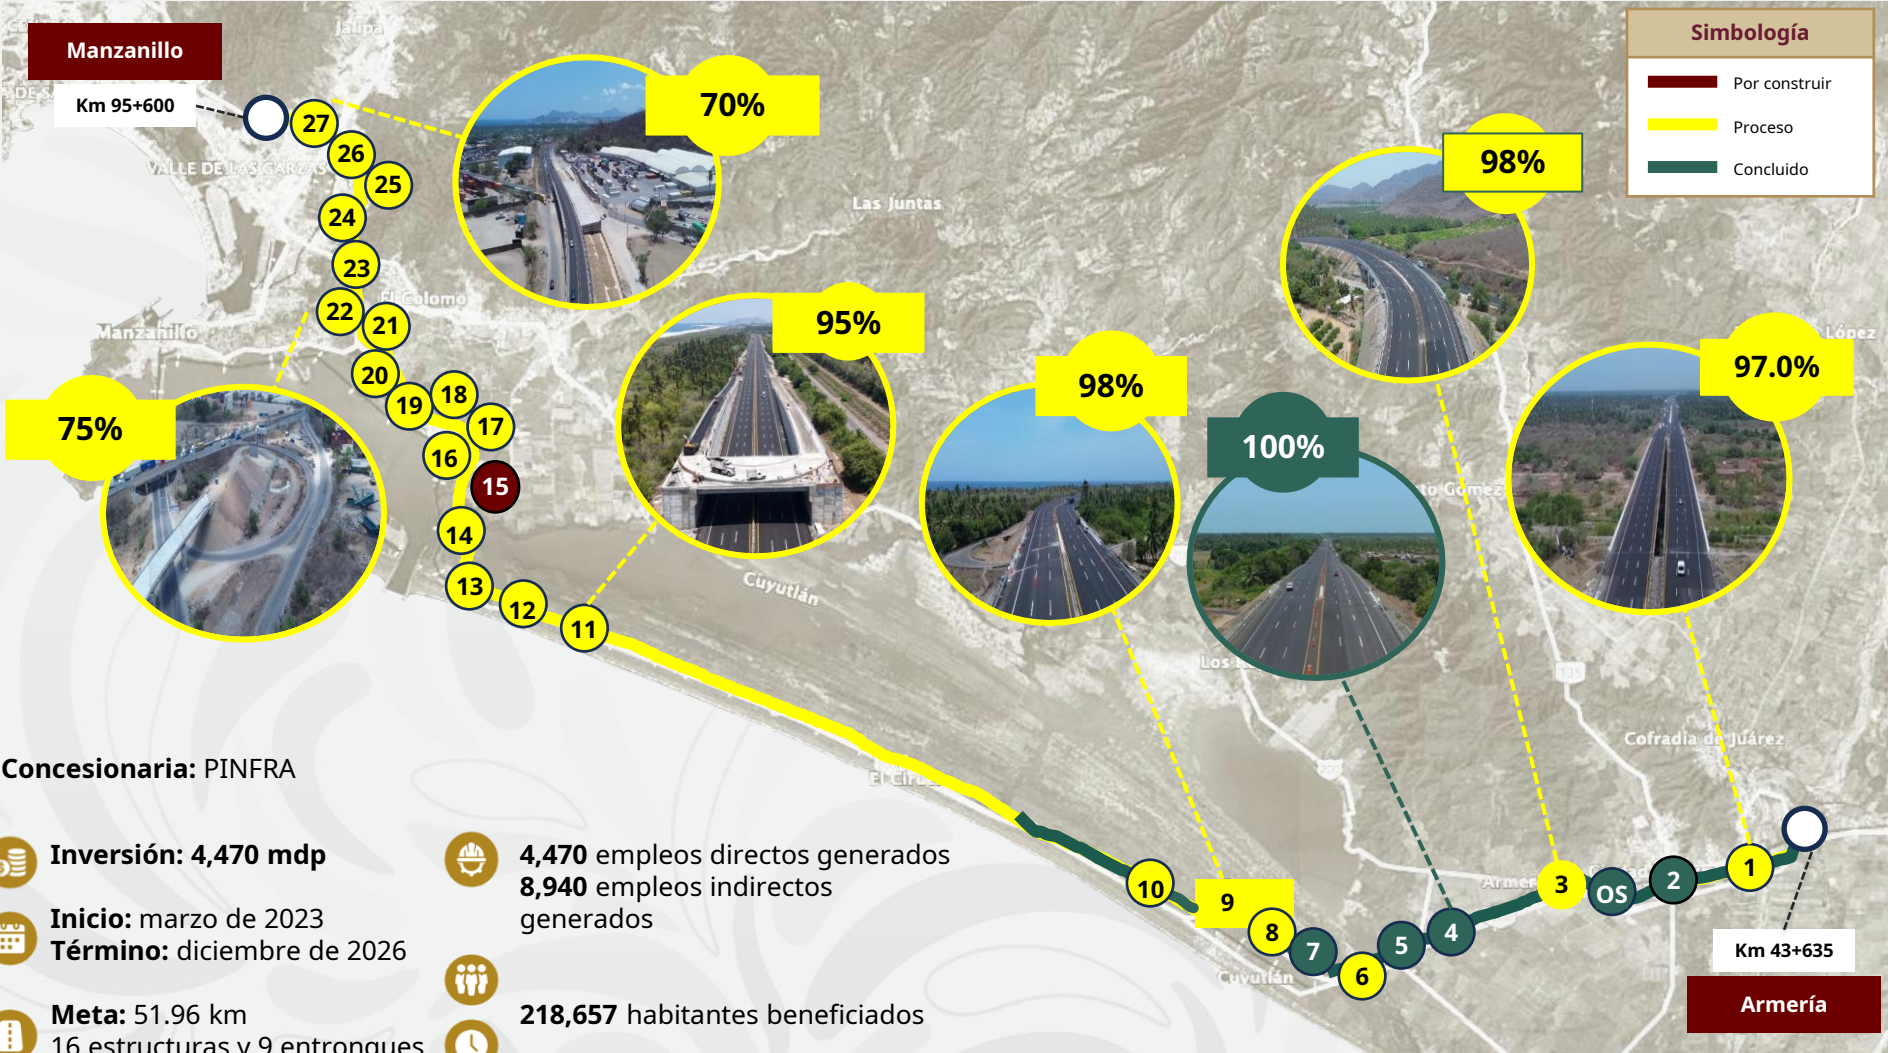


Descripción	
1	Puente Armería I km 45+500 (96.04%)
2	Entronque Paraíso km 47+741
3	PSFFCC Armería II km 50+100
4	PSV Tilapia km 54+350
5	Puente Palo Verde I km 55+950
6	Puente Palo Verde II km 56+650 (93.00%)
7	PIV Ent. Salinero II km 59+500
8	Entronque Salineros km 59+551 (35.06%)
9	PSFFCC Salinero I km 60+500
10	Entronque Cuyutlán km 60+800 (2.00%)
11	PIV Retorno en U km 77+600 (83.02%)
12	Entronque Retorno en U km 77+600 (5.00%)
13	PSFFCC Tepalcates I km 80+240 (60.00%)
14	Entronque Tepalcates I km 79+660 (2.00%)
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+581 (Se lleva control por aparte)
16	Entronque Tepalcates II km 80+500 (2.00%)
17	Entronque 83+500 km (50.06%)
18	Puente Adjuntas km 86+420 (95.06%)
19	PSV Panteones km 87+760 (21.06%)
20	Entronque Panteones km 87+760 (4.00%)
21	PIV Minatitlán Lib km 92+000 (46.09%)
22	PIV Minatitlán Lib. II km 92+000 (71.04%)
23	Entronque Minatitlán km 92+731 (3.00%)
24	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 (13.98%)
25	Puente Canal km 93+220 (54.86%)
26	Entronque Jalipa km 94+400 (30.06%)
27	Puente Jalipa km 94+158 (82.08%)
OS	PSV Obra social retorno en U 49+900
OS	40+900 Vecinos
OS	Muro de protección CFE
OS	Zona Intermodal Emergente

Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Elemento	Intervención	Ejecutado	Faltante	05/06/26 al 11/06/26		Observaciones
		acumulado		Programad o	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	289,232	0	0	0	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	568,055	245,854	0	3,763	
Base y sub base (m³)	260,119	189,046	71,073	0	1,382	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente. El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.

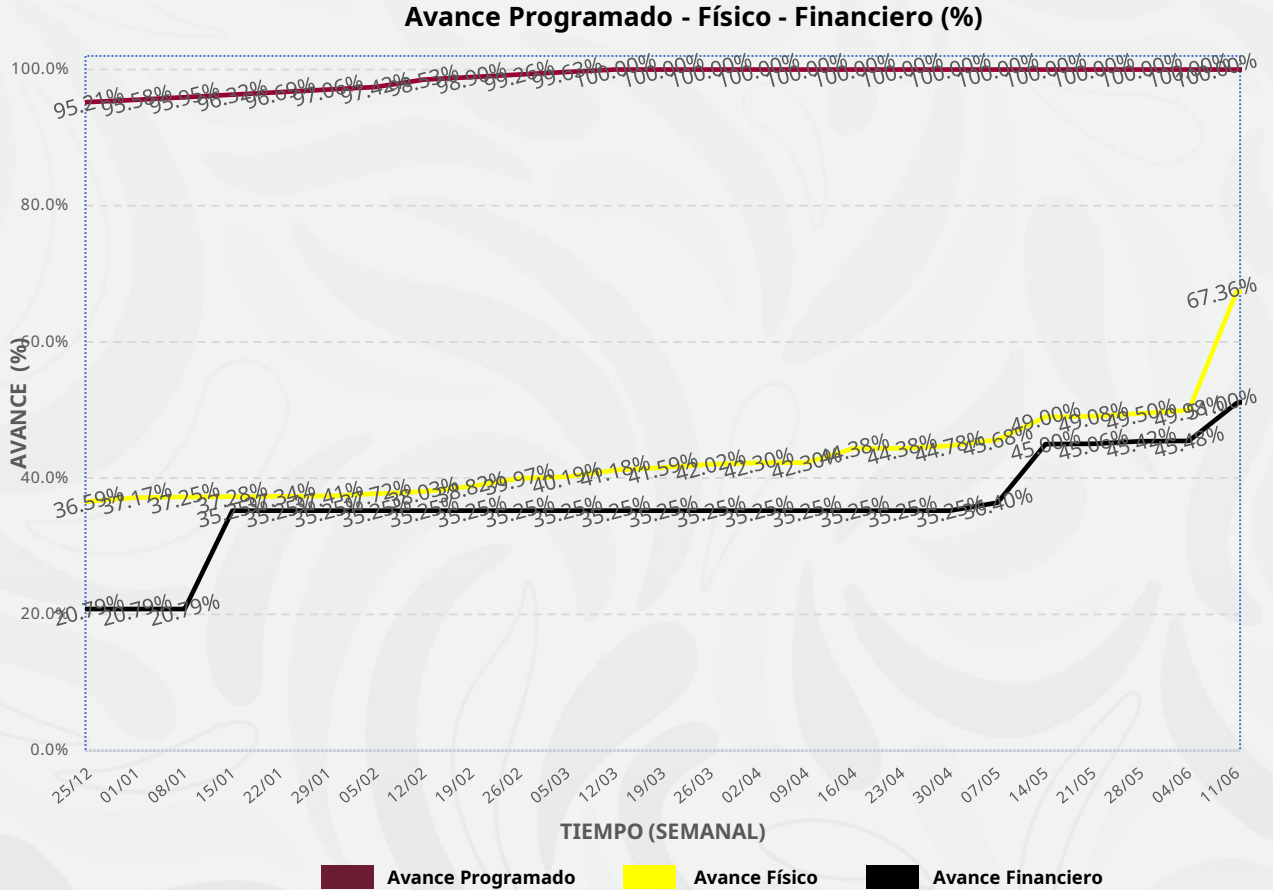

	Del 29 de mayo al 04 de junio de 2026	Del 05 de junio al 11 de junio de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	130	135
Maquinaria	68	68
Frente de trabajo	Del Km 74+000 al Km 84+000 Del Km 84+000 al Km 90+000 Del Km 84+000 al Km 90+000	Del Km 74+000 al Km 84+000 Del Km 84+000 al Km 90+000 Del Km 84+000 al Km 90+000
