

Michoacán

Lázaro Cárdenas-Nueva Italia




Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 0.00%
- Real: 0.30%
- Semanal: 0.05%
- Financiero: 0.00%

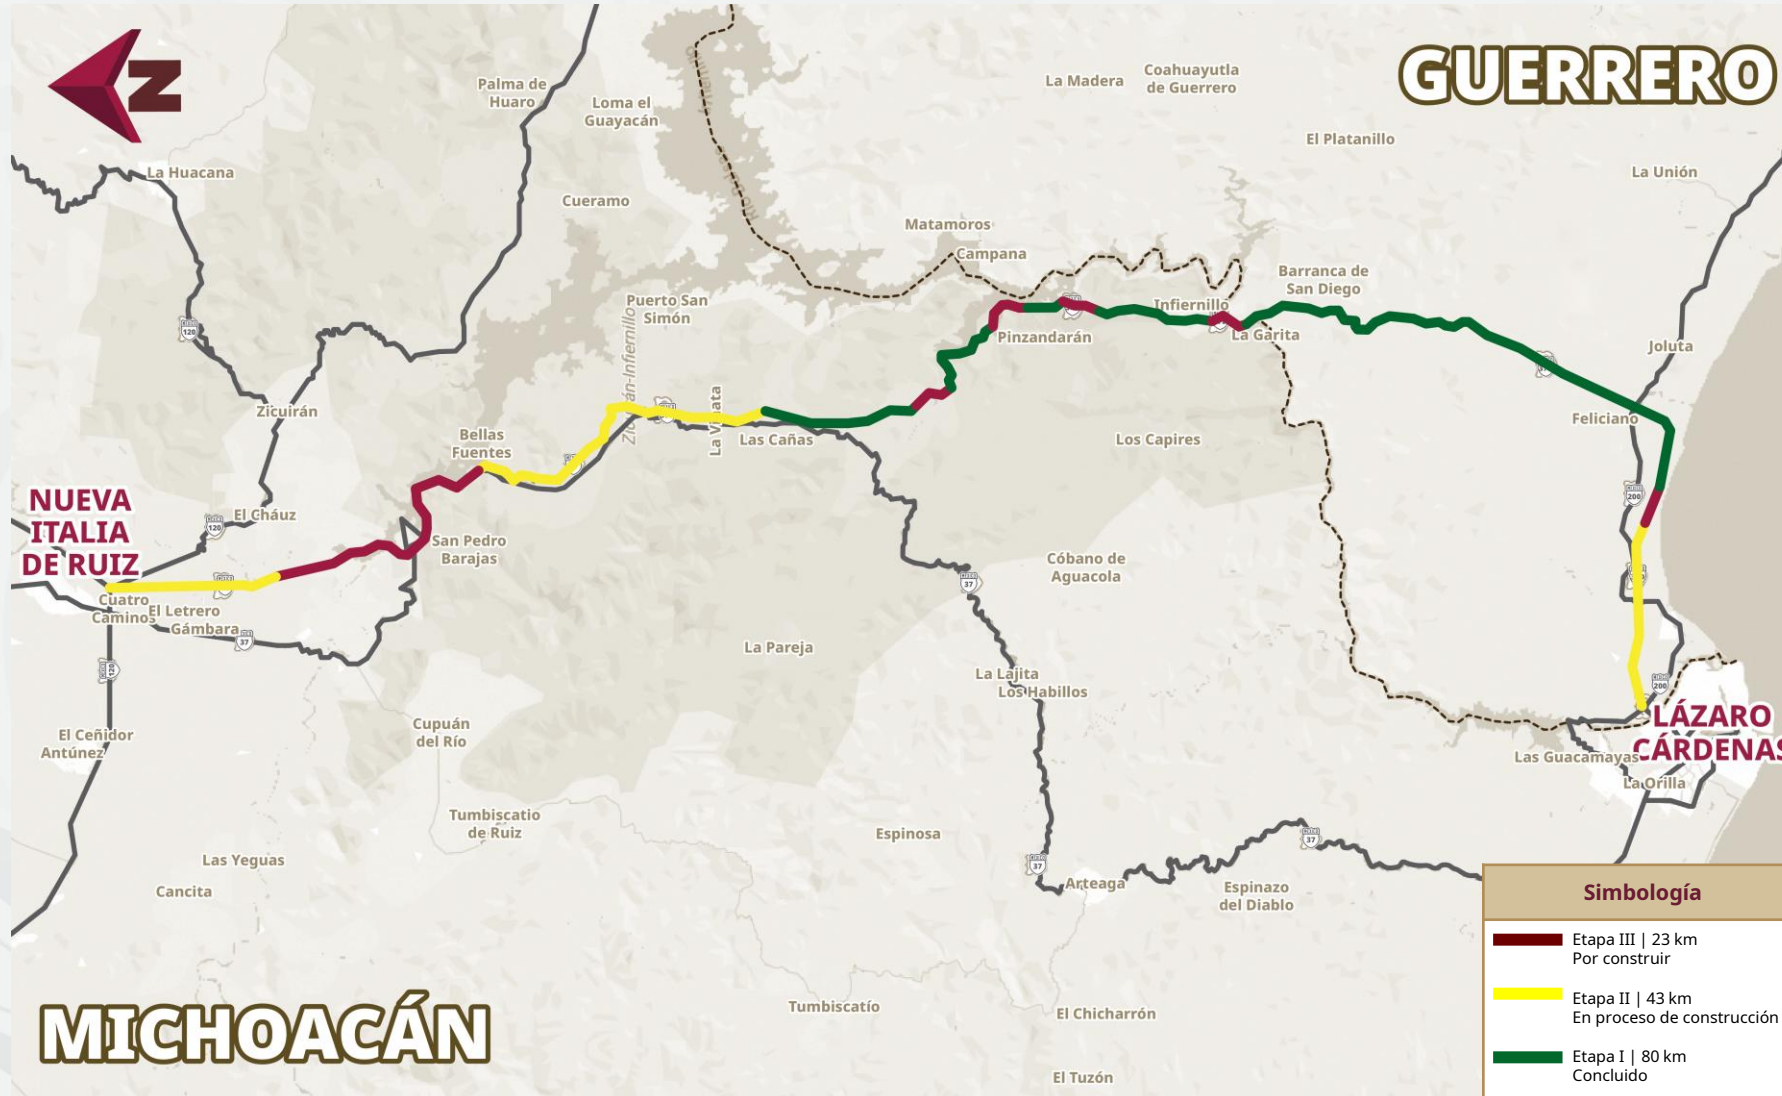

Inversión: 16,000 mdp



Inicio: Marzo 2026
Término: 2029



Meta: 146 km

45 PIV's | 3 PSV's | 28 Puentes de concreto | 5 PSFCC | 1 Túnel
1 Ampliación de plaza de cobro
3 Puentes de acero (estructuras complejas)



4,123 empleos generados




1,800,000 habitantes beneficiados

Michoacán

Lázaro Cárdenas-Nueva Italia



Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	04/06/2026 al 11/06/2026	
				Programado	Ejecutado
Desmonte	146 km	9.90 km	136.10 km	.100 km	.100 km
Corte	146 km	1.40 km	144.60 km	.100 km	.100 km
Terraplén	146 km	0.70 km	145.30 km	.100 km	.100 km

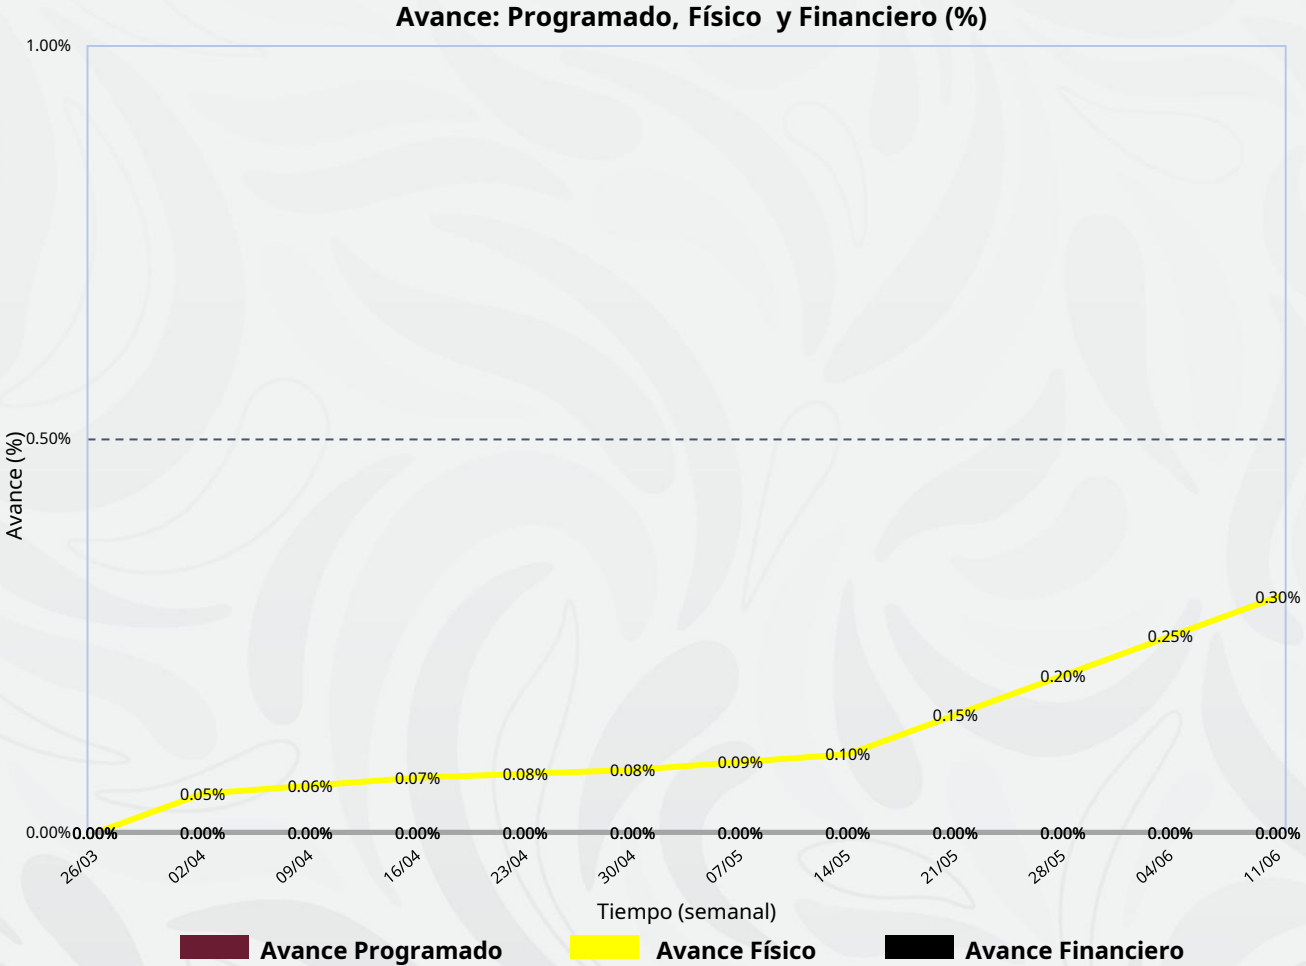

	Del 28 de mayo al 04 de junio de 2026	Del 04 de junio al 11 de junio de 2026.
Fuerza de Trabajo (personas)	50	50
Maquinaria	20	20
Frente de Trabajo	Actividades de deshierbe y desmonte	Actividades de deshierbe y desmonte
