


Michoacán

Uruapan-Nueva Italia



Avance físico

- Programado: 27.15 %
- Real: 25.04 %
- Semanal: 0.46 %
- Financiero: 19.10%

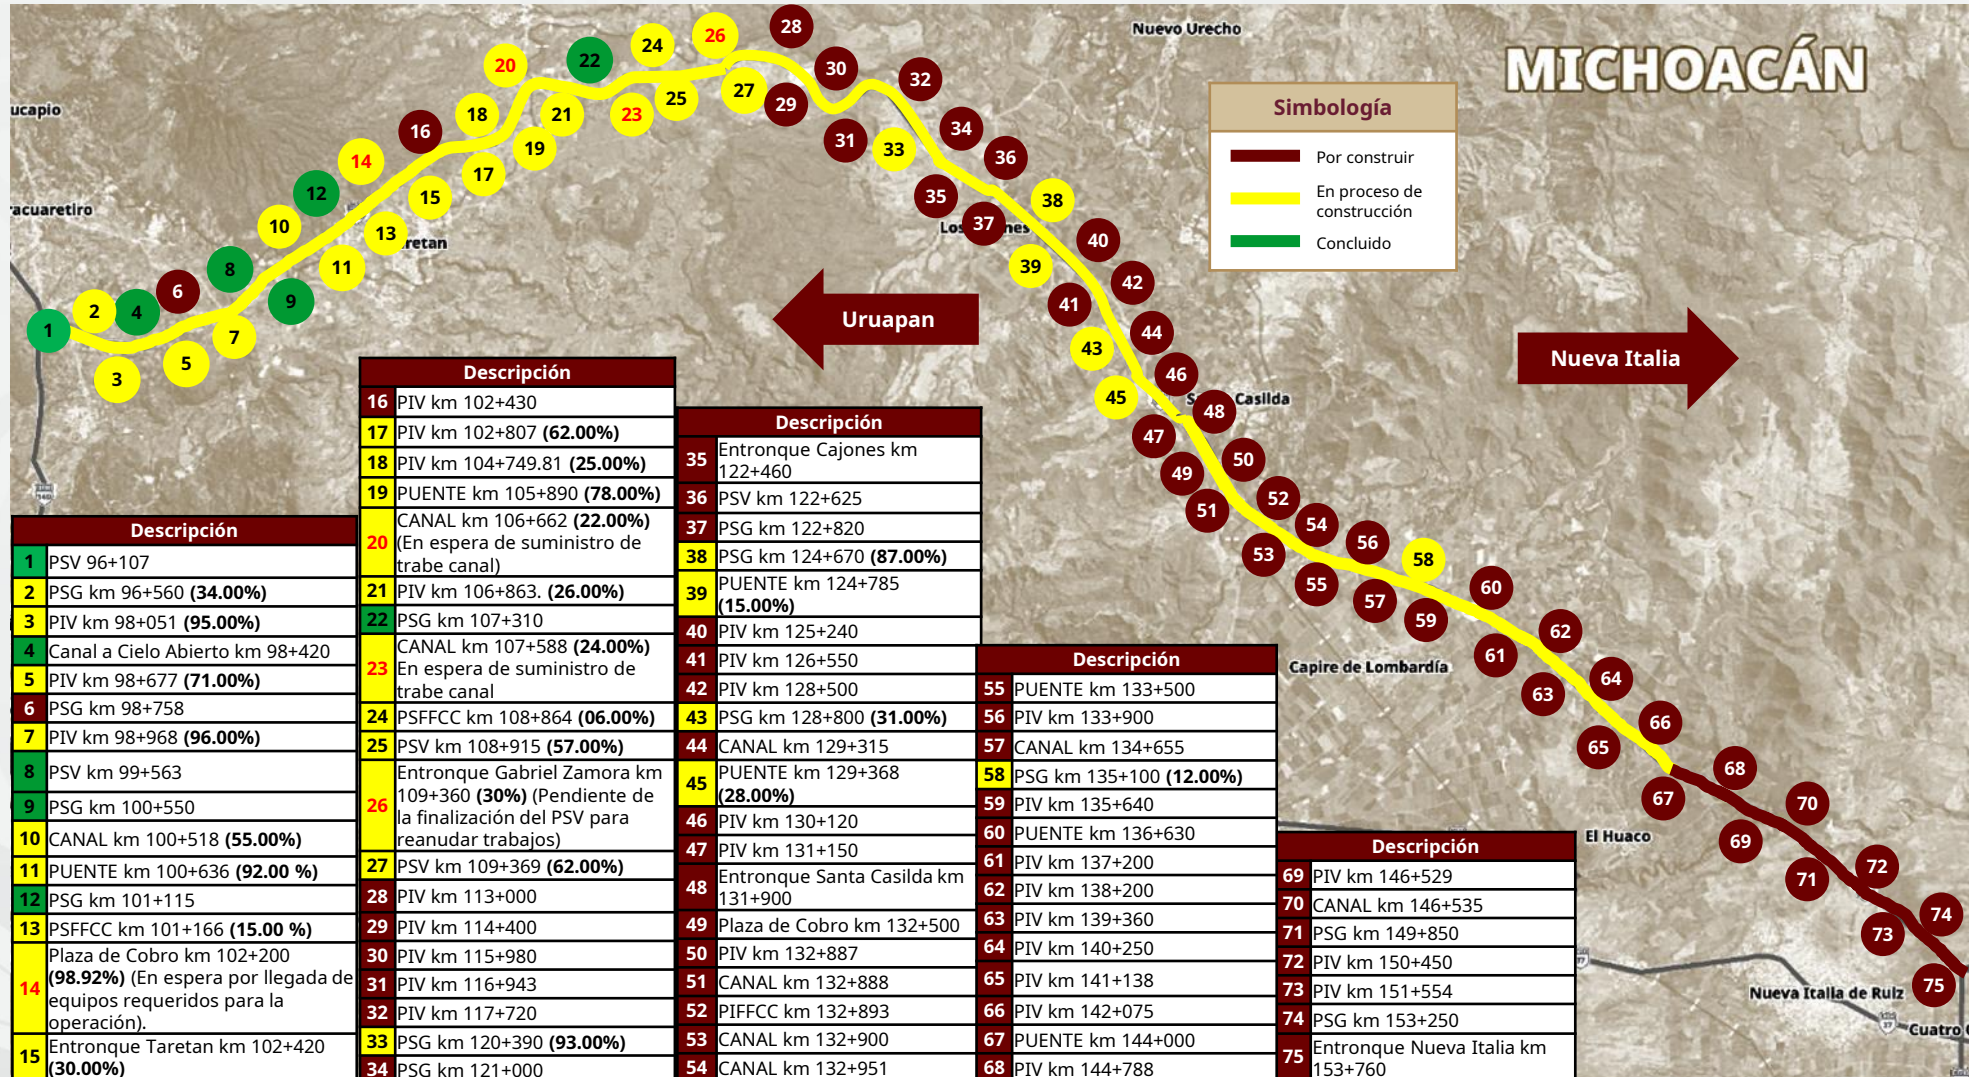


- Inversión: 7,049.9 mdp**
- Inicio:** noviembre de 2023
Término: agosto de 2027
- Meta: 67.09 km**
 - 65.00 km (troncal)
 - 2.09 km (estructuras)
- 2 Plazas de Cobro, 7 puentes, 5 Entronques, 60 cruces (5 PSV's, 30 PIV's, 13 PSG's, 1 PIFFCC, 2 PSFFCC, 9 trabes canales), 1 canal a cielo abierto (cien fuegos) y múltiples obras de drenaje.
- 21,147** empleos generados
7,049 empleos directos
14,098 empleos indirectos
- 1,800,000** habitantes beneficiados
- 25 minutos** de ahorro en tiempo

Concesionaria : PINFRA.

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	04/06/2026 al 11/06/2026		Observaciones
				Programa do	Ejecutado	
Carpeta Asfáltica	65 km	11.40 km	53.60 km	.200 km	.200 km	
Base Asfáltica	65 km	13.60 km	51.40 km	.200 km	.200 km	
Base Hidráulica	65 km	16.30 km	48.70 km	.300 km	.300 km	
Subbase	65 km	18.10 km	46.90 km	.300 km	.300 km	
Subyacente	65 km	21.80 km	43.20 km	.400 km	.400 km	
PIV Km 98+677 Demolición	1	0	1	1	1	Demolición de apoyo central de antigua estructura.
Puente Km 100+636 Accesos	2	1	1	1	1	Colado de concreto hidráulico para losa de acceso
PSF Km 101+166 Subestructura	1	0	1	1	1	Colado de concreto hidráulico para zapata en apoyo #2.
PSF Km 108+864 Subestructura	1	0	1	1	1	Armado de acero para zapata en apoyo #2.
Puente Km 124+785 Cimentación	5	2	3	3	3	Colado de pilote en apoyo #1
PSG Km 135+100 Subestructura	1	0	0	1	1	Habilitado de cimbra de madera previo a colado de concreto hidráulico para el estribo #2

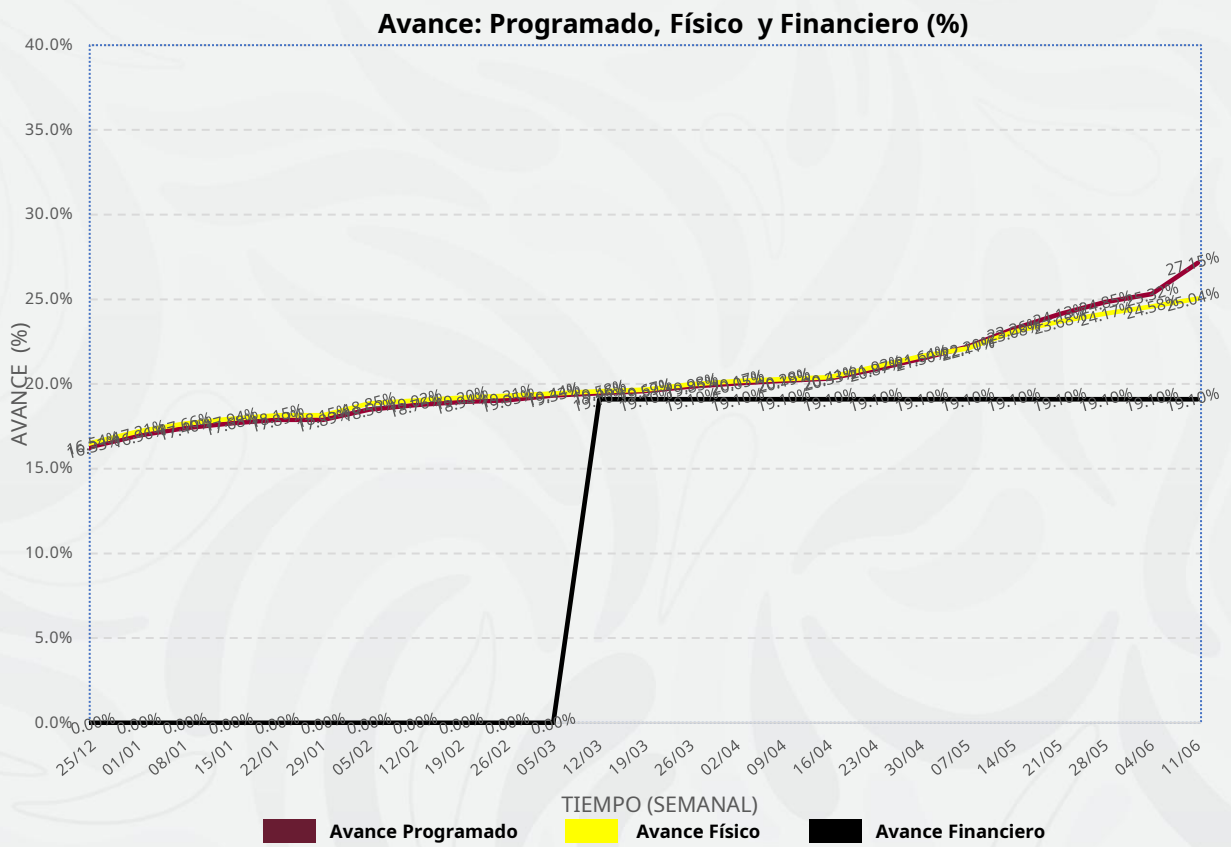

	Del 28 de mayo al 04 de junio de 2026.	Del 04 de junio al 11 de junio de 2026.
Fuerza de Trabajo (personas)	805	805
Maquinaria	255	255
Frente de Trabajo	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369, PSG km 120+390	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369, PSG km 120+390, PSG km 124+670
