

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia


Avance físico

• Programado: 20.33%

• Real: 20.41 %

• Semanal: 0.13 %

• Financiero: 19.10%

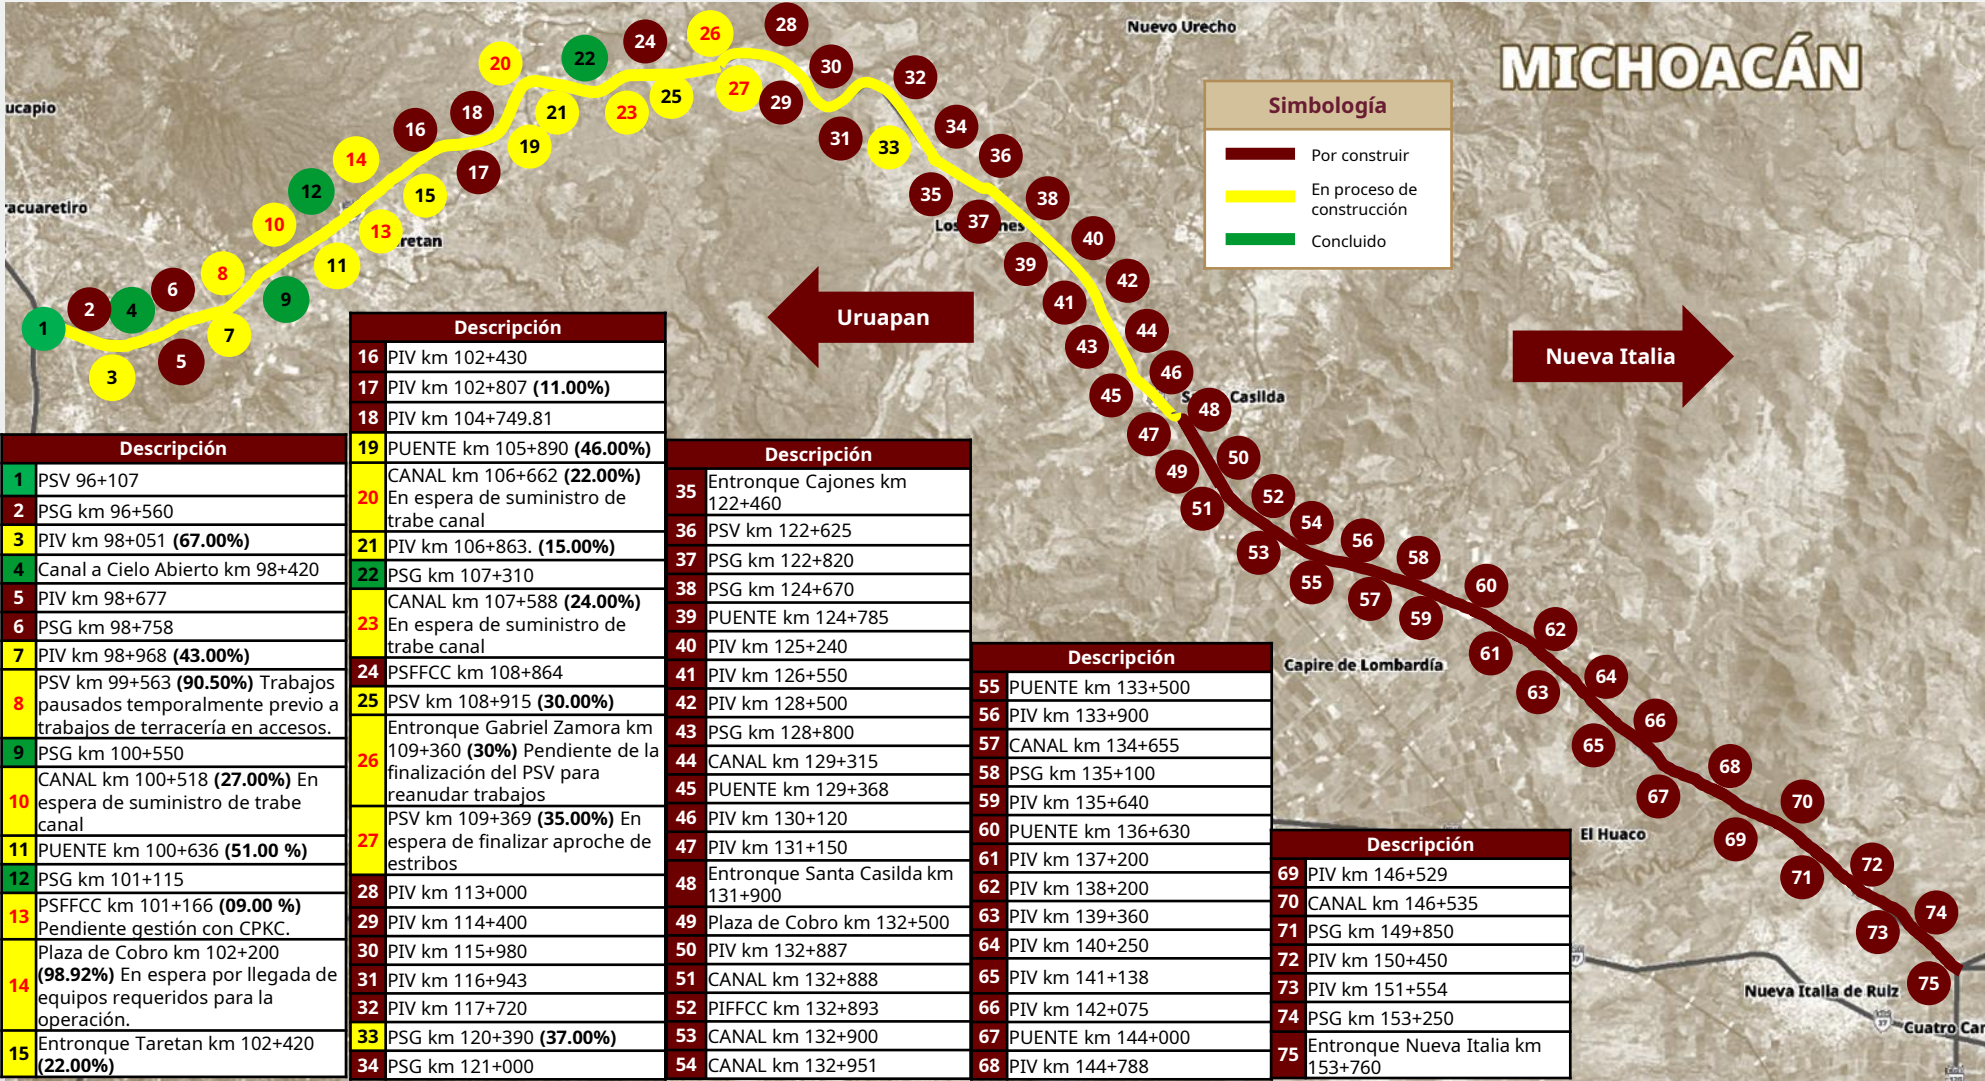

Inversión: 7,049.9 mdp

Inicio: noviembre de 2023

Término: agosto de 2027

Meta: 67.09 km

65.00 km (troncal)

2.09 km (estructuras)

2 Plazas de Cobro, 7 puentes, 5 Entronques, 60 cruces (5 PSV's, 30 PIV's, 13 PSG's, 1 PIFFCC, 2 PSFFCC, 9 trabes canales), 1 canal a cielo abierto (cien fuegos) y múltiples obras de drenaje.

21,147 empleos generados

7,049 empleos directos

14,098 empleos indirectos

1,800,000 habitantes beneficiados

25 minutos de ahorro en tiempo


Concesionaria : PINFRA.

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	09/04/2026 al 16/04/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Asfáltica	65 km	11.20 km	53.80 km	.300 km	.300 km	
Base Hidráulica	65 km	12.40 km	52.60 km	.300 km	.300 km	
Subbase	65 km	14.30 km	50.70 km	.300 km	.300 km	
Subyacente	65 km	17.00 km	47.20 km	.400 km	.400 km	
PIV Km 98+051 Superestructura	1	0	1	1	1	Descimbrado y retiro de cimbra en losa
PIV Km 98+968 Superestructura	1	0	1	1	1	Armado de acero de refuerzo en losa
PIV Km 102+807 Demolición	1	0	1	1	1	Demolición de estribo de antigua estructura
PIV Km 102+807 Cimentación	1	0	1	1	1	Habilitado de cimbra y armado de acero para zapata de estribo #3
PIV Km 106+863 Demolición	1	0	1	1	1	Demolición de estribo #2 de estructura antigua.
PIV Km 108+915 Subestructura	1	0	1	1	1	Colado de concreto hidráulico para zapata en estribo #2.
PSG Km 120+390	1	0	1	1	1	Colado de concreto hidráulico para losa
PSG Km 124+670	1	0	1	1	1	Habilitado de cimbra para segundo trepado del estribo 1

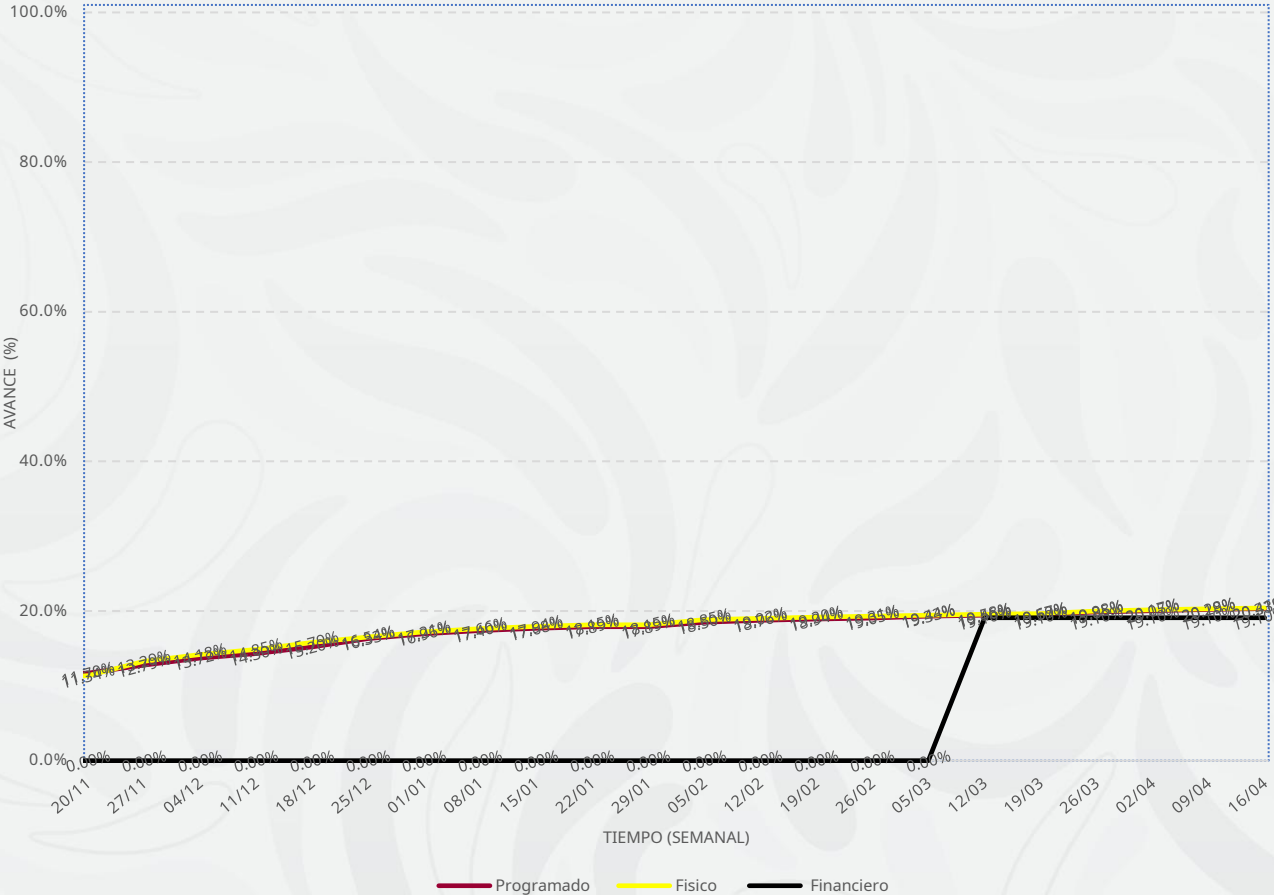

	Del 02 de abril al 09 de abril de 2026.	Del 09 de abril al 16 de abril de 2026.
Fuerza de Trabajo (personas)	805	805
Maquinaria	250	255
Frente de Trabajo	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369, PSG km 120+390	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369, PSG km 120+390, PSG km 124+670
