

Michoacán

Lázaro Cárdenas-Nueva Italia

Avance físico

- Programado: 0.00%
- Real: 0.075%
- Semanal: 0.005 %
- Financiero: 0.00%



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Inversión: 16,000 mdp



Inicio: Marzo 2026
Término: 2029



Meta: 146 km

45 PIV's | 3 PSV's | 28
Puentes de concreto | 5 PSFCC
| 1 Túnel
1 Ampliación de plaza de cobro
3 Puentes de acero (estructuras
complejas)



4,123 empleos generados




**1,800,000 habitantes
beneficiados**

Michoacán

Lázaro Cárdenas-Nueva Italia



Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	16/04/2026 al 23/04/2026	
				Programado	Ejecutado
Desmonte	146 km	9.20 km	136.80 km	.200 km	.200 km
Movimiento de tierras	146 km	0.600 km	145.400 km	.200 km	.200 km

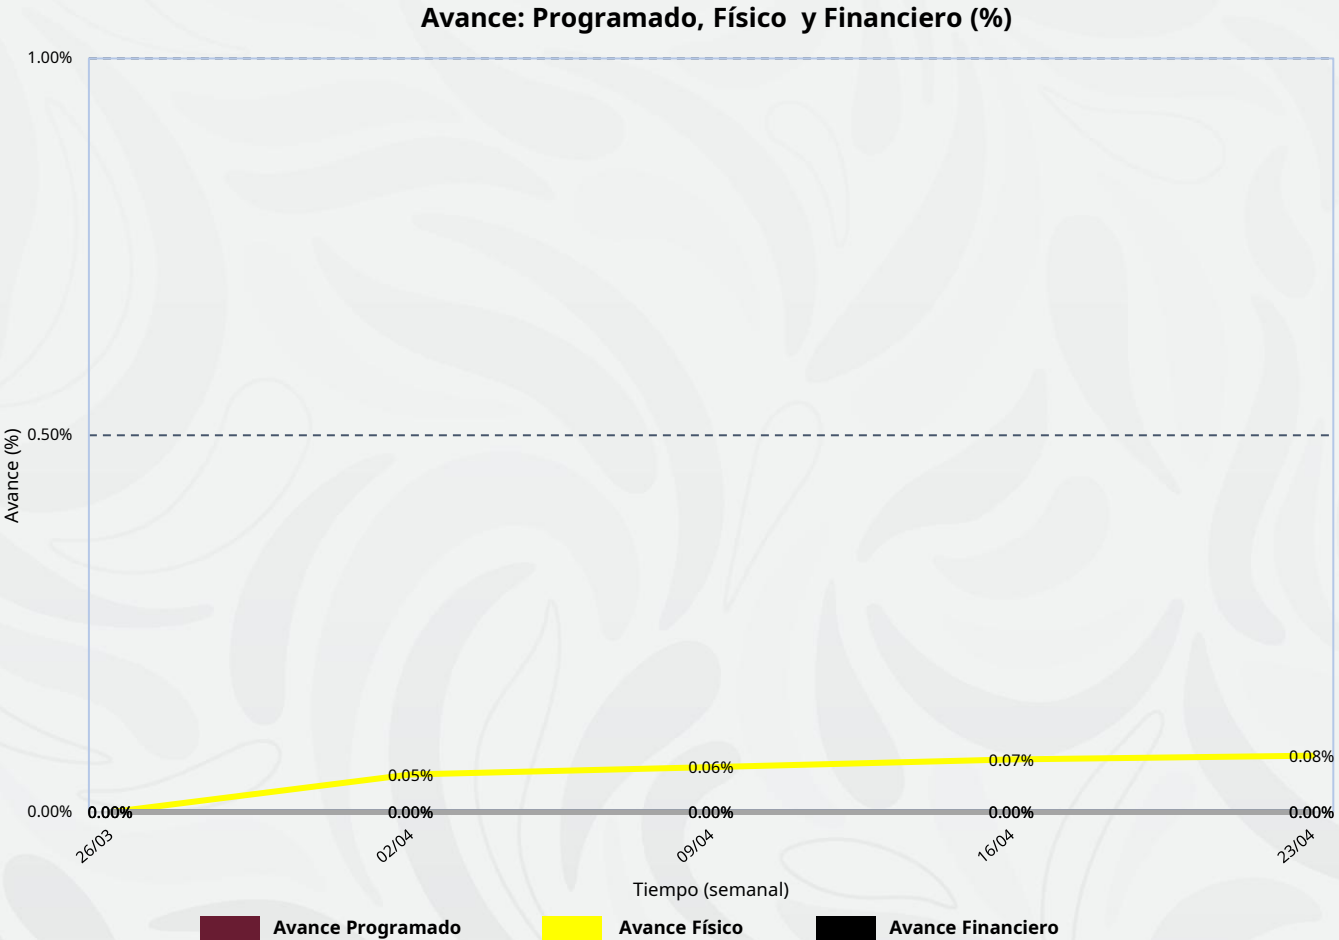

	Del 09 de abril al 16 de abril de 2026..	Del 17 de abril al 23 de abril de 2026.
Fuerza de Trabajo (personas)	50	50
Maquinaria	20	20
Frente de Trabajo	Actividades de deshierbe y desmonte	Actividades de deshierbe y desmonte
