

Michoacán

Tramo Pátzcuaro-Uruapan

Avance físico

• Programado: 100.00% • Real: 100.00%

• Financiero: 88.46% • Semanal: 0.00 %

CONCLUIDA



Descripción	
1	Entronque Zirimicuaro km 93+500
2	Trabe Canal km 92+210
3	Entronque Caracha km 92+100,
4	PIFFCC Caracha km 91+754
5	Puente Canintzio km 88+283
6	PIV km 88+054,

Descripción	
7	Entronque San Ángel km 87+400
8	Rampa de emergencia II km 86+500
9	Rampa de emergencia I km 84+100
10	Entronque Jucato km 79+489
11	PIFFCC Zirahuén km 73+584
12	Viaducto Zirahuén km 70+278
13	Entronque Zirahuén km 68+600

Descripción	
14	Caseta de cobro remota Zirahuén 68+600
15	Plaza de cobro Zirahuén km 60+500
16	Entronque Pátzcuaro II km 53+600
17	Entronque Pátzcuaro I km 47+500
18	Entronque las trojas km 47+000



Inversión: 1,792 mdp



Inicio: Julio 2017



Término: Febrero 21, 2026



Meta: 48.47 km

- 46.79.00 km (troncal)
- 1.68 km (estructuras)
- 58 Totales (1 plaza de cobro, 1 puente, 1 viaducto, 8 entronques, 45 cruces, 2 rampas de frenado)



5,376 Empleos generados
1,792 empleos directos
3,584 empleos indirectos



200 mil habitantes beneficiados




25 minutos de ahorro en tiempo.

Concesionaria : PINFRA.

Michoacán

Tramo Pátzcuaro-Uruapan

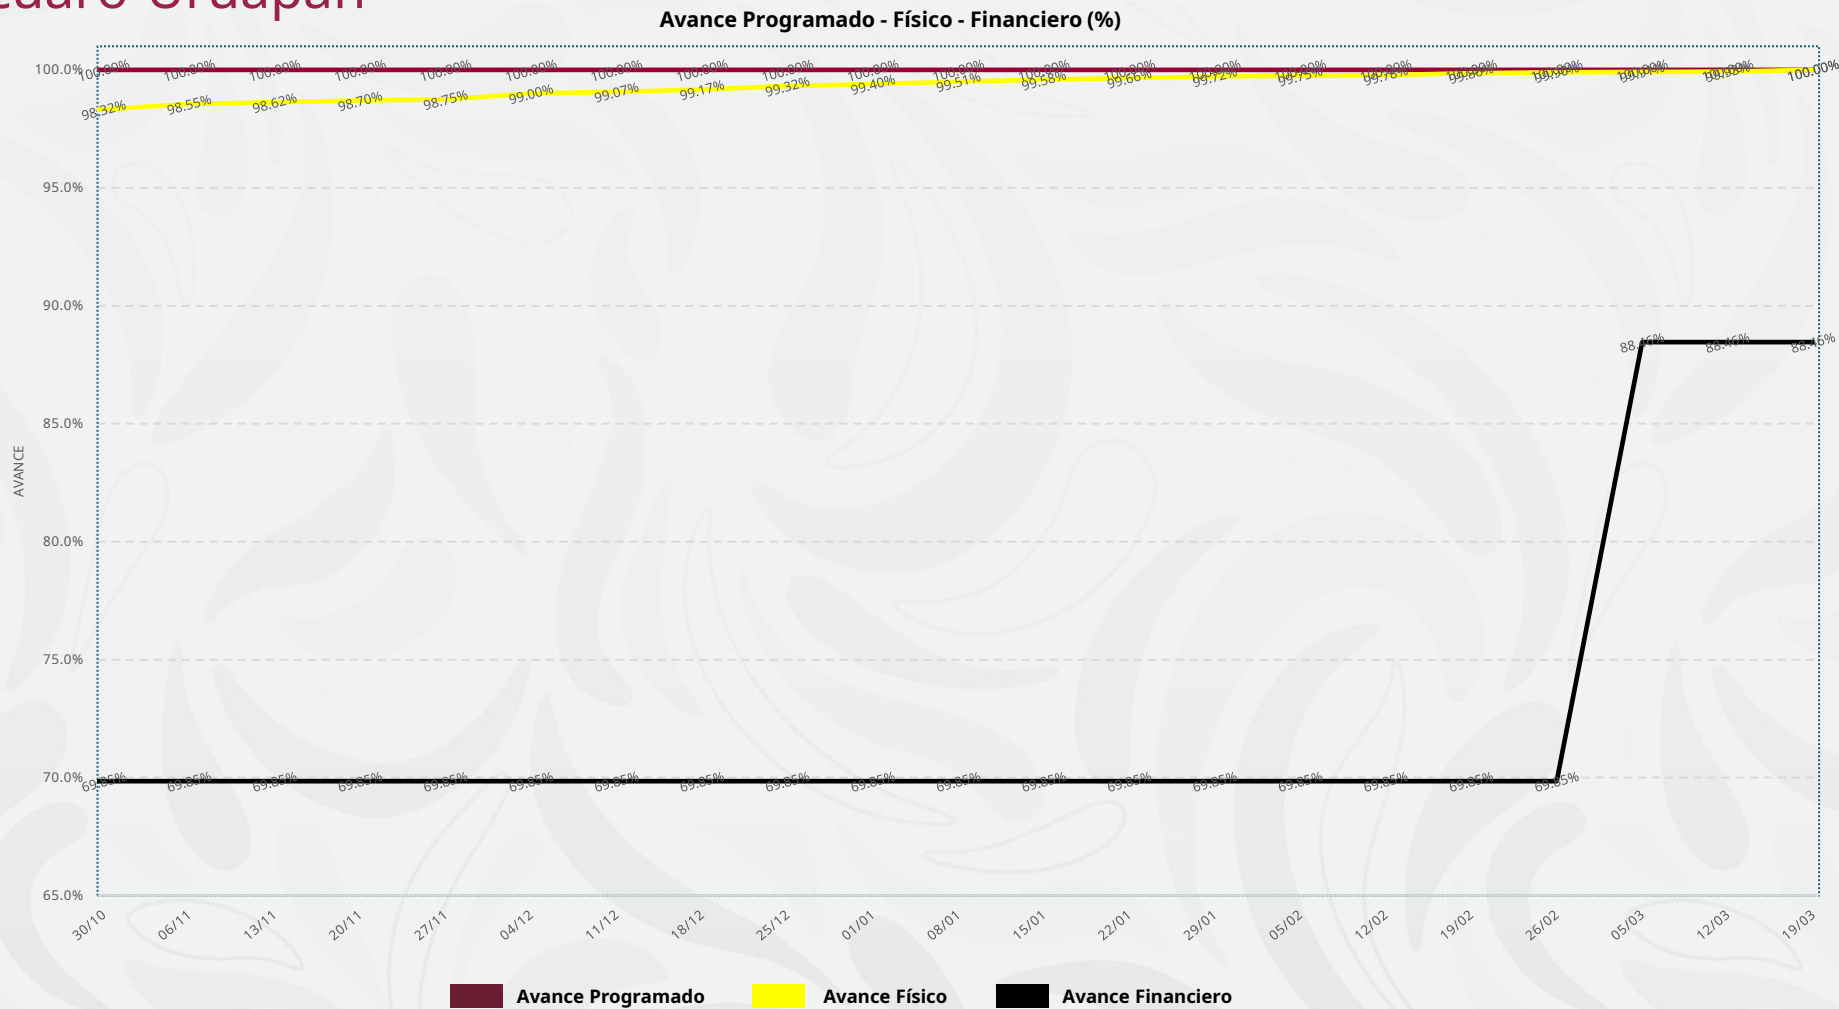

	Del 05 de marzo al 12 de marzo de 2026	Del 12 de marzo al 19 de marzo de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	80	0
Maquinaria	9	0
Frente de Trabajo	PIFFCC km 91+754 y PIFFCC km 73+584	-
