

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia


Avance físico

• Programado: 20.19%

• Real: 20.28 %

• Semanal: 0.11 %

• Financiero: 19.10%

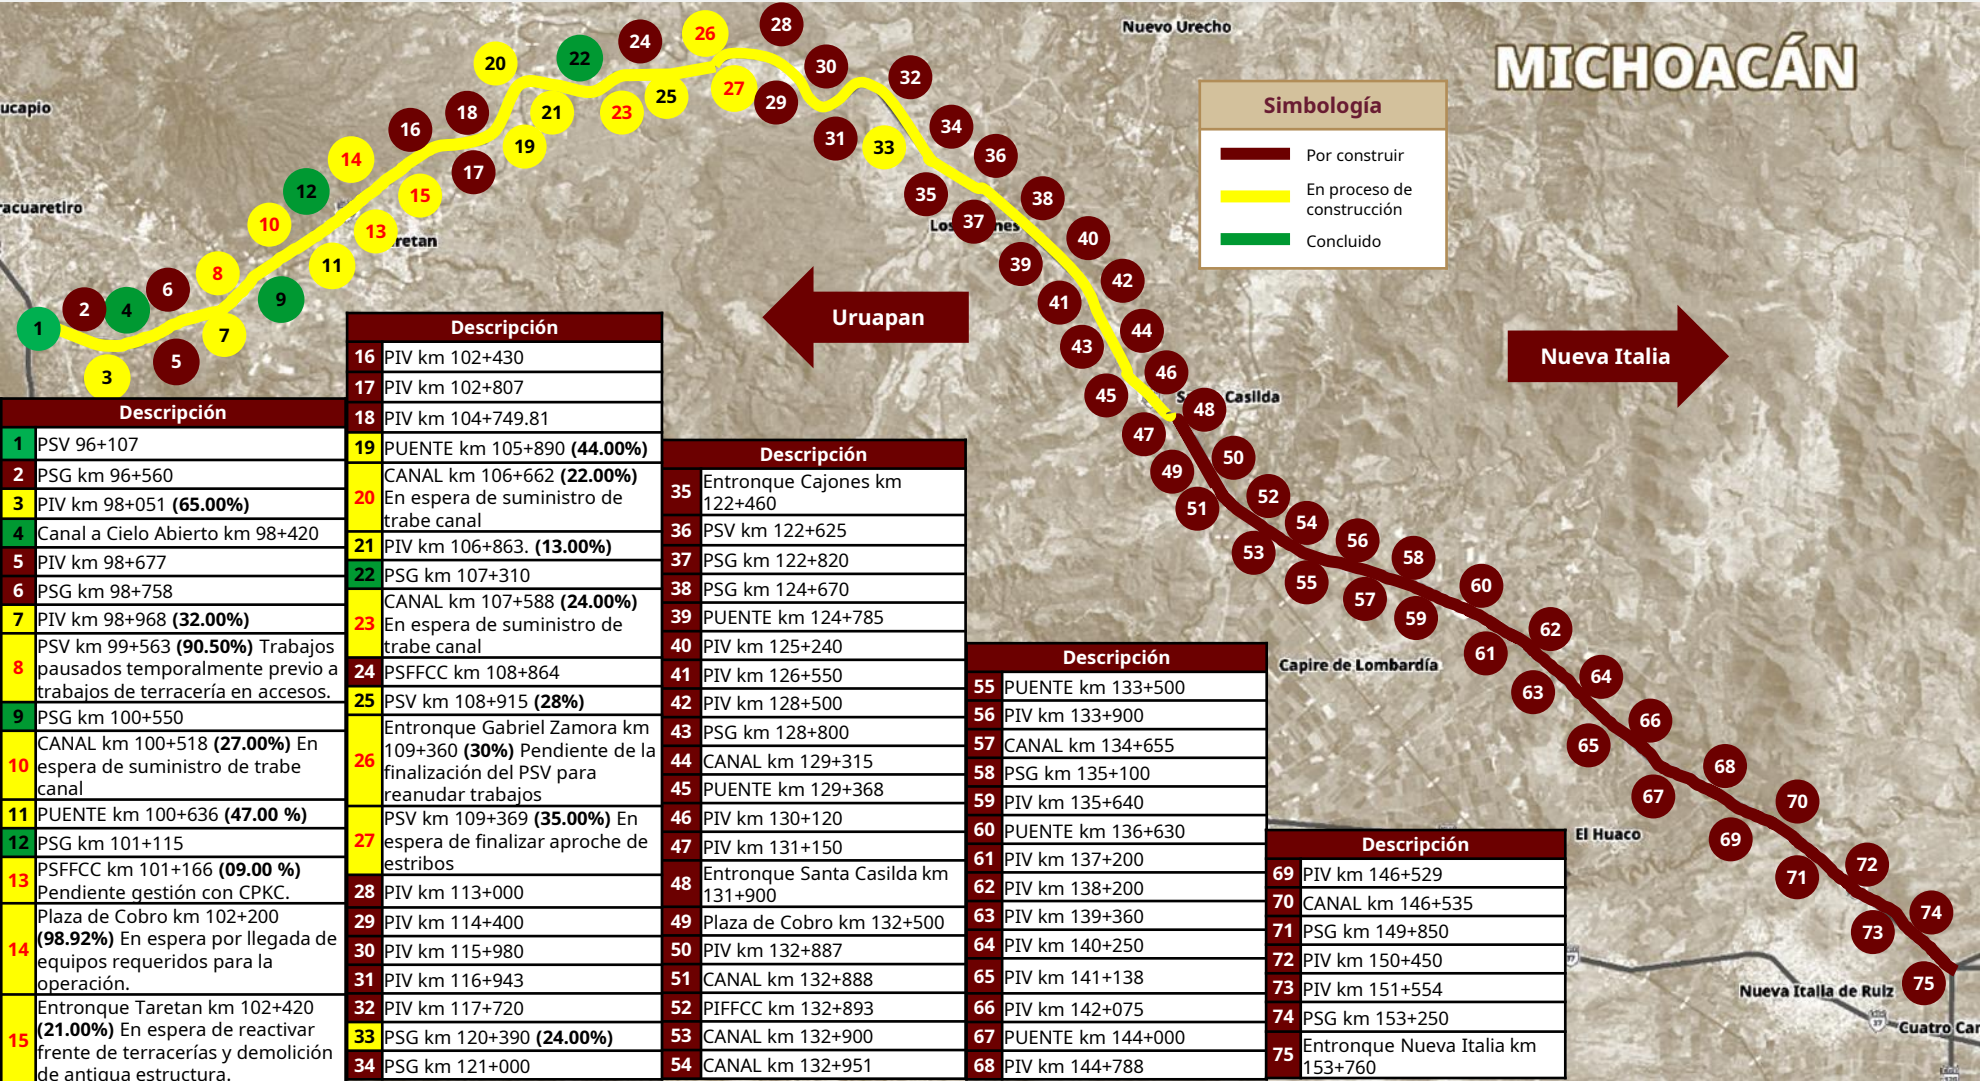

- Inversión: 7,049.9 mdp

Inicio: noviembre de 2023

Término: agosto de 2027
- Meta: 67.09 km

65.00 km (troncal)

2.09 km (estructuras)

2 Plazas de Cobro, 7 puentes, 5 Entronques, 60 cruces (5 PSV's, 30 PIV's, 13 PSG's, 1 PIFFCC, 2 PSFFCC, 9 trabes canales), 1 canal a cielo abierto (cien fuegos) y múltiples obras de drenaje.
- 21,147 empleos generados

7,049 empleos directos


14,098 empleos indirectos
- 1,800,000 habitantes beneficiados
- 25 minutos de ahorro en tiempo
- Concesionaria : PINFRA.

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	02/04/2026 al 09/04/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Asfáltica	65 km	10.90 km	54.10 km	.300 km	.300 km	
Base Hidráulica	65 km	12.10 km	52.90 km	.300 km	.300 km	
Subbase	65 km	14.00 km	51.00 km	.300 km	.300 km	
Subyacente	65 km	16.60 km	47.60 km	.400 km	.400 km	
PIV Km 98+051 Superestructura	1	0	1	1	1	Colado de concreto hidráulico para losa claro #1.
PIV Km 98+968 Superestructura	8	0	8	8	8	Colado de concreto hidráulico para diafragmas
Puente Km 105+890 Superestructura	9	0	9	9	9	Habilitado de cimbra de madera para diafragmas interiores
PIV Km 106+863 Superestructura	1	0	1	1	13	Colado de concreto hidráulico para cabezal
PSG Km 120+390 Subestructura	1	0	1	1	1	Armado de acero de refuerzo para losa

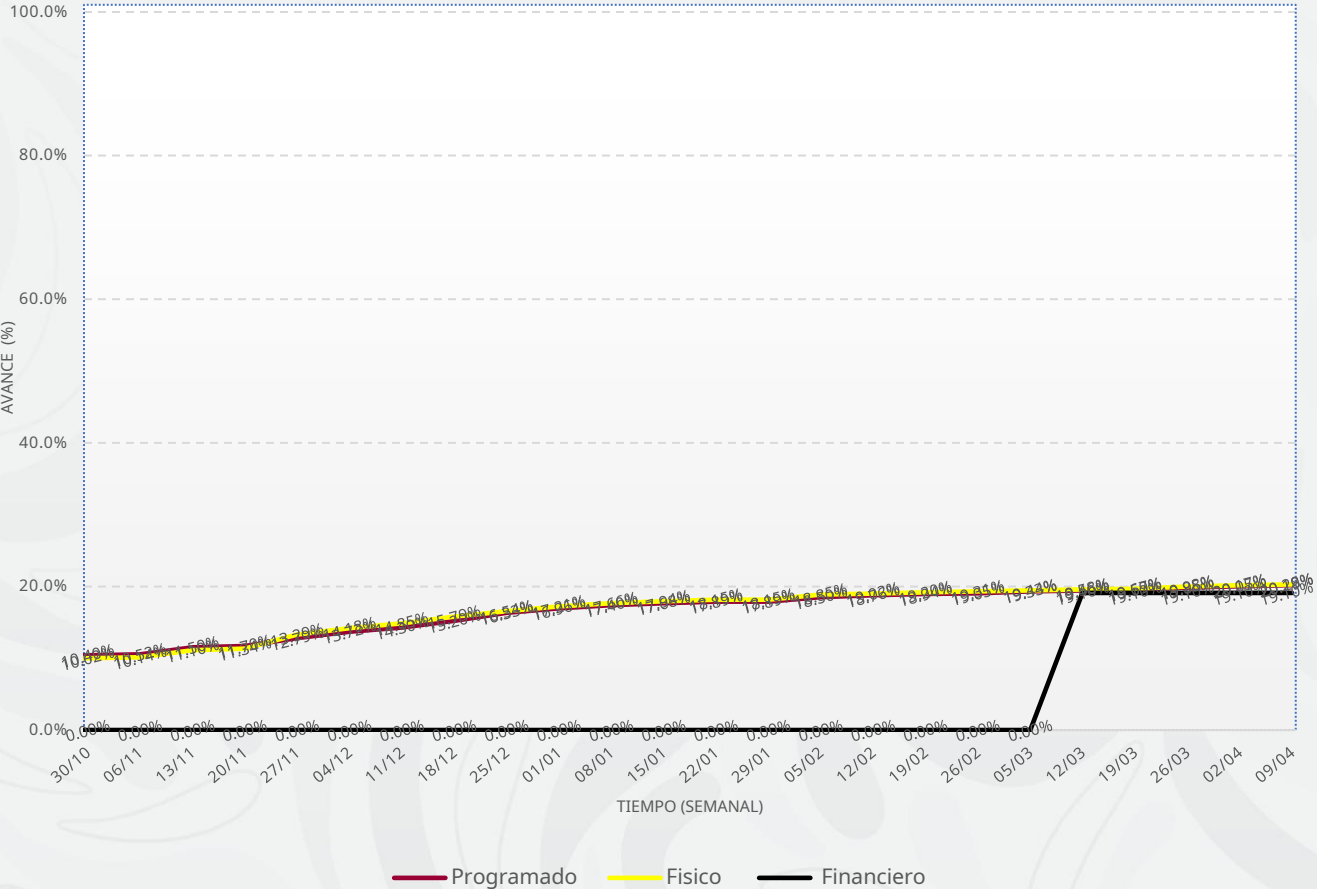

	Del 26 de marzo al 02 de abril de 2026.	Del 02 de abril al 07 de abril de 2026.
Fuerza de Trabajo (personas)	805	805
Maquinaria	250	250
Frente de Trabajo	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369, PSG km 120+390	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369, PSG km 120+390
