

# Michoacán

## Tramo Pátzcuaro-Uruapan

Avance físico

• Programado: 100.00%

• Real: 100.00%

• Semanal: 0.00 %

• Financiero: 88.46%

CONCLUIDA



| Descripción |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 1           | Entronque Zirimicuaro km 93+500 |
| 2           | Trabe Canal km 92+210           |
| 3           | Entronque Caracha km 92+100,    |
| 4           | PIFFCC Caracha km 91+754        |
| 5           | Puente Canintzio km 88+283      |
| 6           | PIV km 88+054,                  |

| Descripción |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 7           | Entronque San Ángel km 87+400    |
| 8           | Rampa de emergencia II km 86+500 |
| 9           | Rampa de emergencia I km 84+100  |
| 10          | Entronque Jujucato km 79+489     |
| 11          | PIFFCC Zirahuén km 73+584        |
| 12          | Viaducto Zirahuén km 70+278      |
| 13          | Entronque Zirahuén km 68+600     |

| Descripción |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| 14          | Caseta de cobro remota Zirahuén 68+600 |
| 15          | Plaza de cobro Zirahuén km 60+500      |
| 16          | Entronque Pátzcuaro II km 53+600       |
| 17          | Entronque Pátzcuaro I km 47+500        |
| 18          | Entronque las trojas km 47+000         |

 **Inversión:** 1,792 mdp

 **Inicio:** Julio 2017  
**Término:** Febrero 21, 2026

 **Meta:** 48.47 km  
46.79.00 km (tronal)  
1.68 km (estructuras)  
58 Totales (1 plaza de cobro, 1 puente, 1 viaducto, 8 entronques, 45 cruces, 2 rampas de frenado).

 **5,376** Empleos generados  
**1,792** empleos directos  
**3,584** empleos indirectos


 **200 mil** habitantes beneficiados

 **25 minutos** de ahorro en tiempo.

**Concesionaria :** PINFRA.

# Michoacán

## Tramo Pátzcuaro-Uruapan

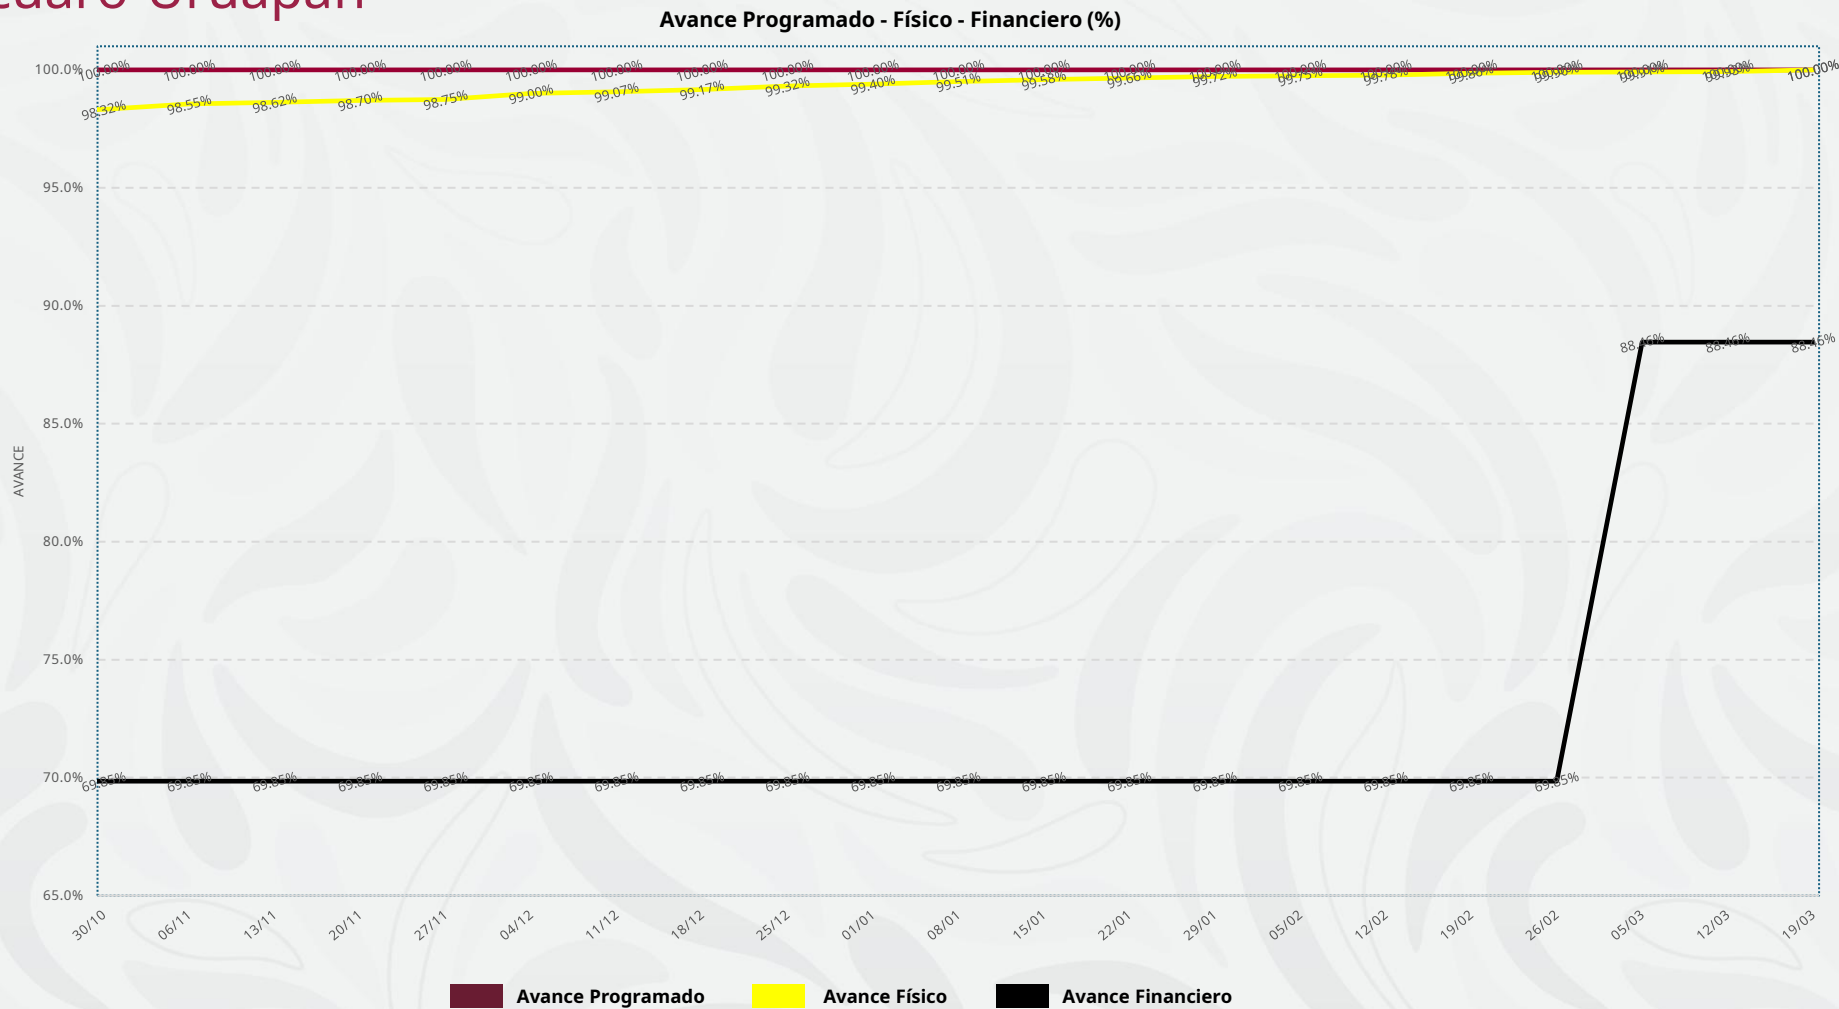

|                              | Del 05 de marzo al 12 de marzo de 2026 | Del 12 de marzo al 19 de marzo de 2026 |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 80                                     | 0                                      |
| Maquinaria                   | 9                                      | 0                                      |
| Frente de Trabajo            | PIFFCC km 91+754 y PIFFCC km 73+584    | -                                      |
