

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia




Gobierno de
México

Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 20.05%
- Real: 20.17 %
- Semanal: 0.19 %
- Financiero: 19.10%

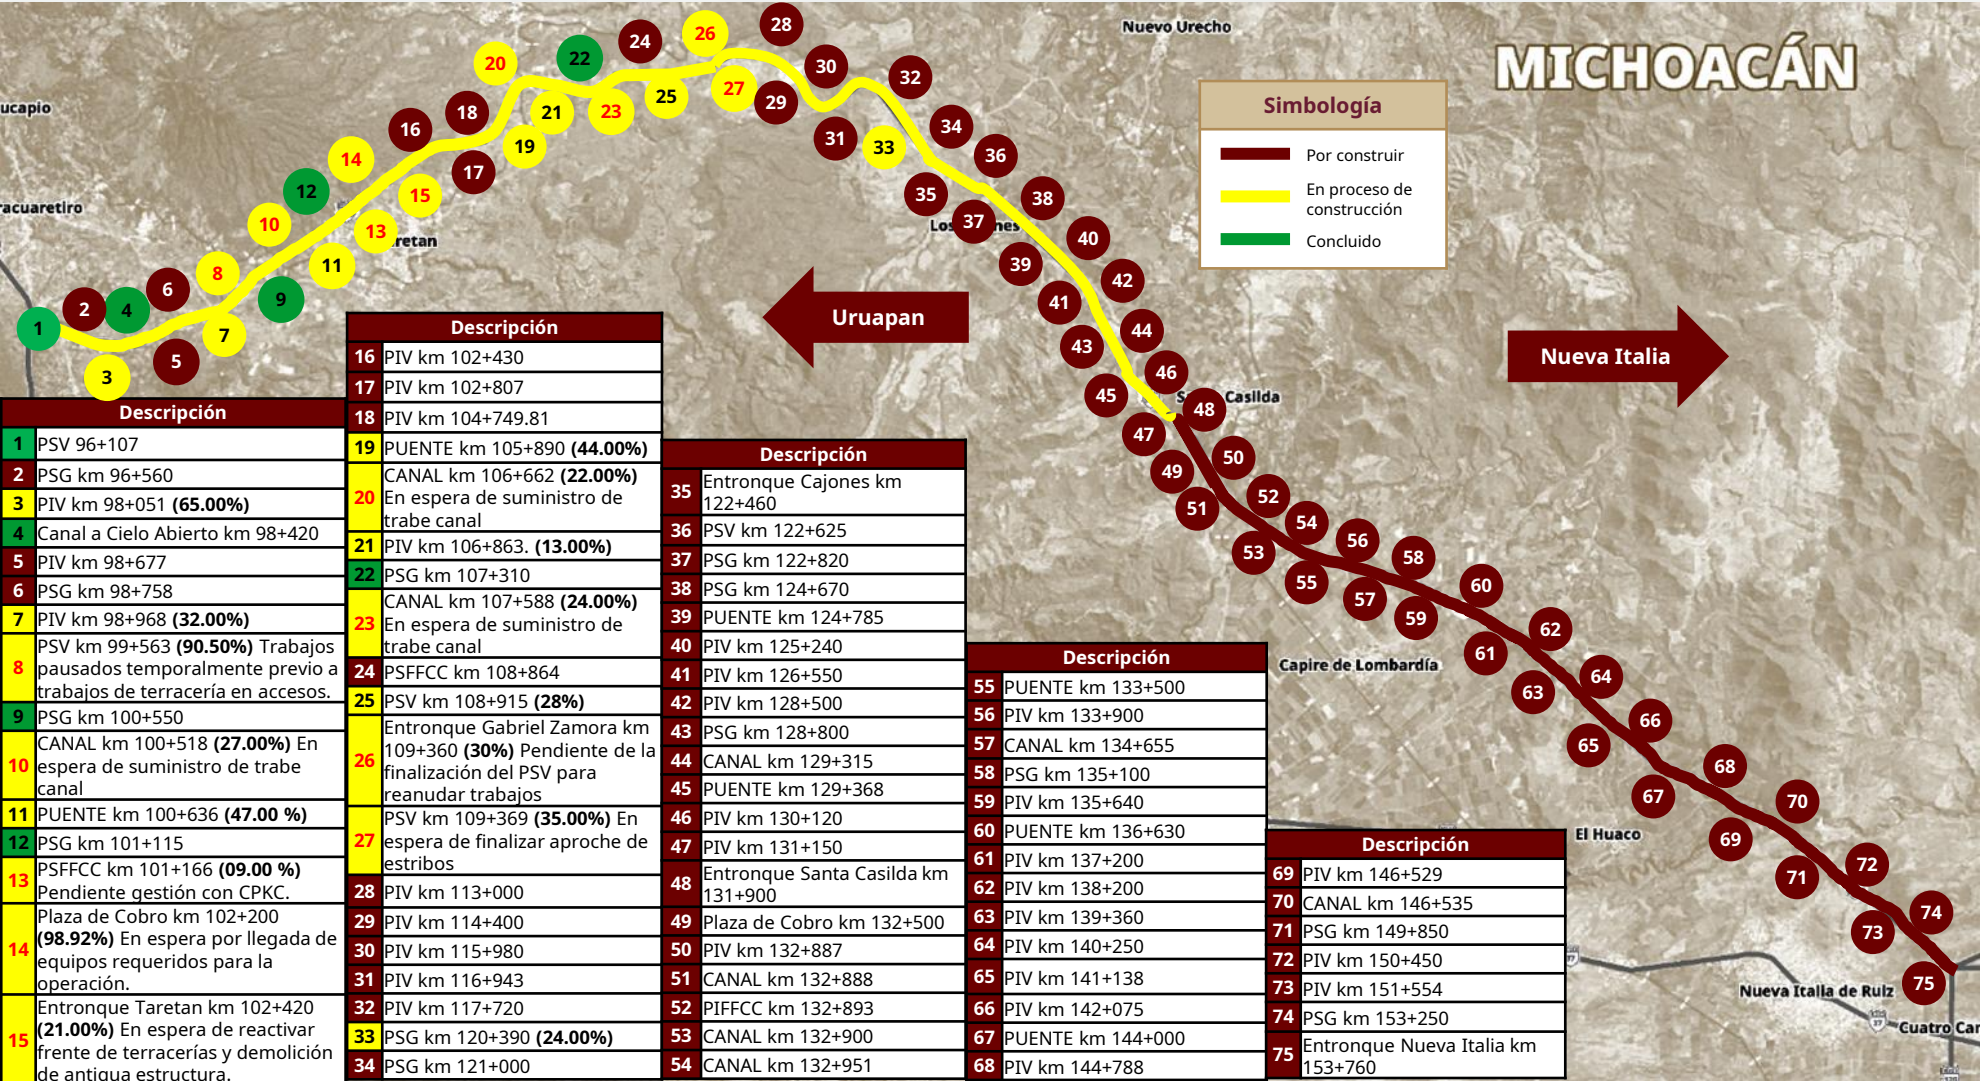


- Inversión: 7,049.9 mdp**
- Inicio:** noviembre de 2023
Término: agosto de 2027
- Meta: 67.09 km**
 - 65.00 km (troncal)
 - 2.09 km (estructuras)

2 Plazas de Cobro, 7 puentes, 5 Entronques, 60 cruces (5 PSV's, 30 PIV's, 13 PSG's, 1 PIFFCC, 2 PSFFCC, 9 trabes canales), 1 canal a cielo abierto (cien fuegos) y múltiples obras de drenaje.
- 21,147** empleos generados
7,049 empleos directos
14,098 empleos indirectos
- 1,800,000** habitantes beneficiados
- 25 minutos** de ahorro en tiempo
- Concesionaria : PINFRA.**

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	19/03/2026 al 26/03/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Asfáltica	65 km	10.30 km	54.70 km	.300 km	.300 km	
Base Hidráulica	65 km	11.50 km	53.50 km	.300 km	.300 km	
Subbase	65 km	13.40 km	51.60 km	.300 km	.300 km	
Subyacente	65 km	15.80 km	48.40 km	.400 km	.400 km	
PIV Km 98+051 Superestructura	1	0	1	1	1	Armado de acero de refuerzo para losa.
PIV Km 98+968 Superestructura	9	4	5	5	5	Retiro de cimbra de madera en diafragmas intermedios
PSF Km 101+166 Cimentación	2	0	2	1	1	Armado de acero de refuerzo para pilas lado C1.
Puente Km 105+890 Superestructura	1	0	1	1	1	Retiro de cimbra de madera de cabezal, banco de apoyo y topes sísmicos apoyo C1
PSG Km 120+390 Subestructura	1	0	1	1	1	Colado de concreto hidráulico para segundo trepado en el estribo #1

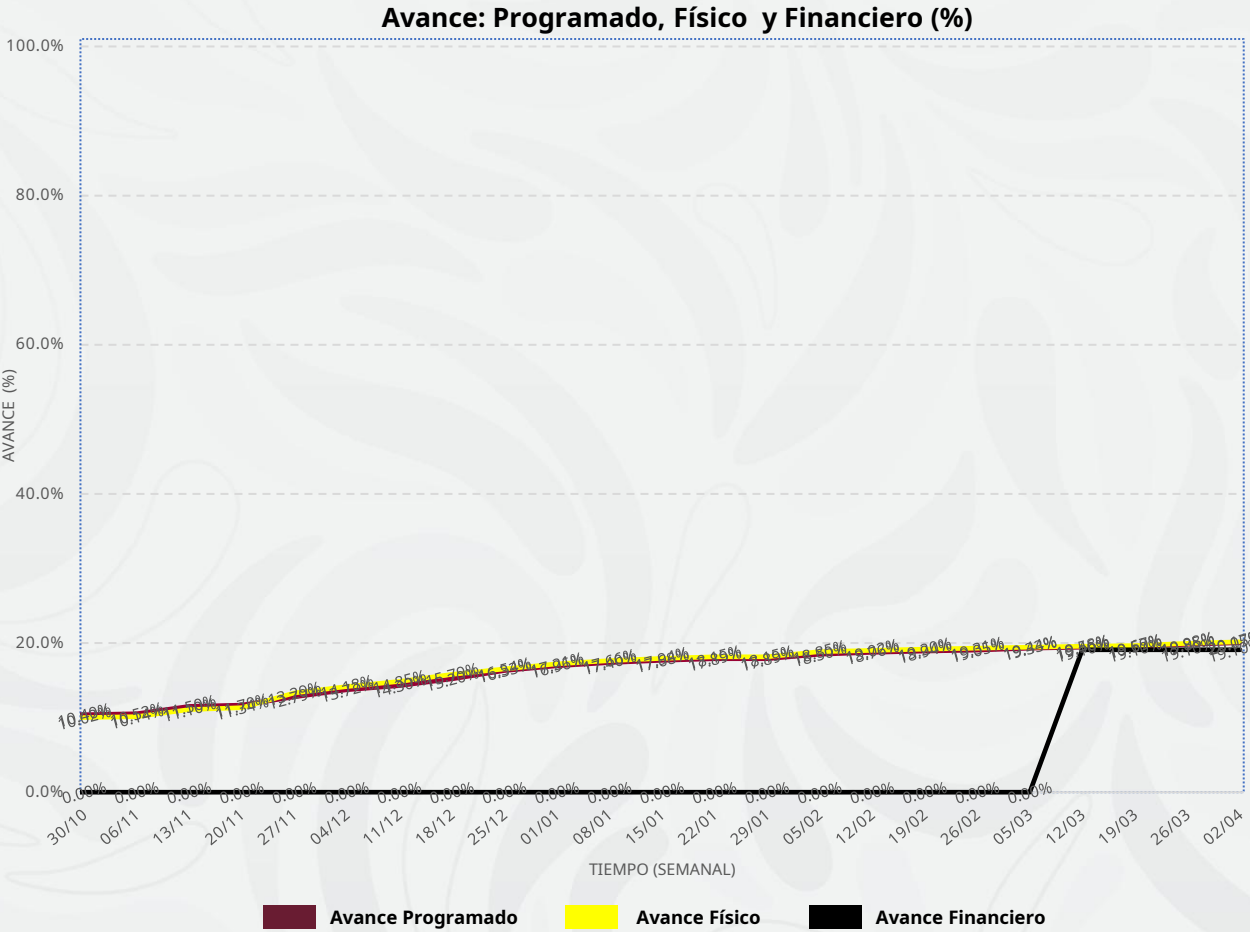

	Del 19 de marzo al 26 de marzo de 2026.	Del 26 de marzo al 02 de abril de 2026.
Fuerza de Trabajo (personas)	805	805
Maquinaria	250	250
Frente de Trabajo	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369
