

Michoacán

Tramo Pátzcuaro-Uruapan

Avance físico

• Programado: 100.00%

• Real: 100.00%

• Semanal: 0.00 %

• Financiero: 88.46%

CONCLUIDA



Descripción	
1	Entronque Zirimicuaro km 93+500
2	Trabe Canal km 92+210
3	Entronque Caracha km 92+100,
4	PIFFCC Caracha km 91+754
5	Puente Canintzio km 88+283
6	PIV km 88+054,

Descripción	
7	Entronque San Ángel km 87+400
8	Rampa de emergencia II km 86+500
9	Rampa de emergencia I km 84+100
10	Entronque Jujucato km 79+489
11	PIFFCC Zirahuén km 73+584
12	Viaducto Zirahuén km 70+278
13	Entronque Zirahuén km 68+600

Descripción	
14	Caseta de cobro remota Zirahuén 68+600
15	Plaza de cobro Zirahuén km 60+500
16	Entronque Pátzcuaro II km 53+600
17	Entronque Pátzcuaro I km 47+500
18	Entronque las trojas km 47+000

 **Inversión:** 1,792 mdp

 **Inicio:** Julio 2017
Término: Febrero 21, 2026

 **Meta:** 48.47 km
46.79.00 km (tronal)
1.68 km (estructuras)
58 Totales (1 plaza de cobro, 1 puente, 1 viaducto, 8 entronques, 45 cruces, 2 rampas de frenado).

 **5,376 Empleos generados**
1,792 empleos directos
3,584 empleos indirectos


 **200 mil habitantes beneficiados**

 **25 minutos de ahorro en tiempo.**

Concesionaría : PINFRA.

Michoacán

Tramo Pátzcuaro-Uruapan

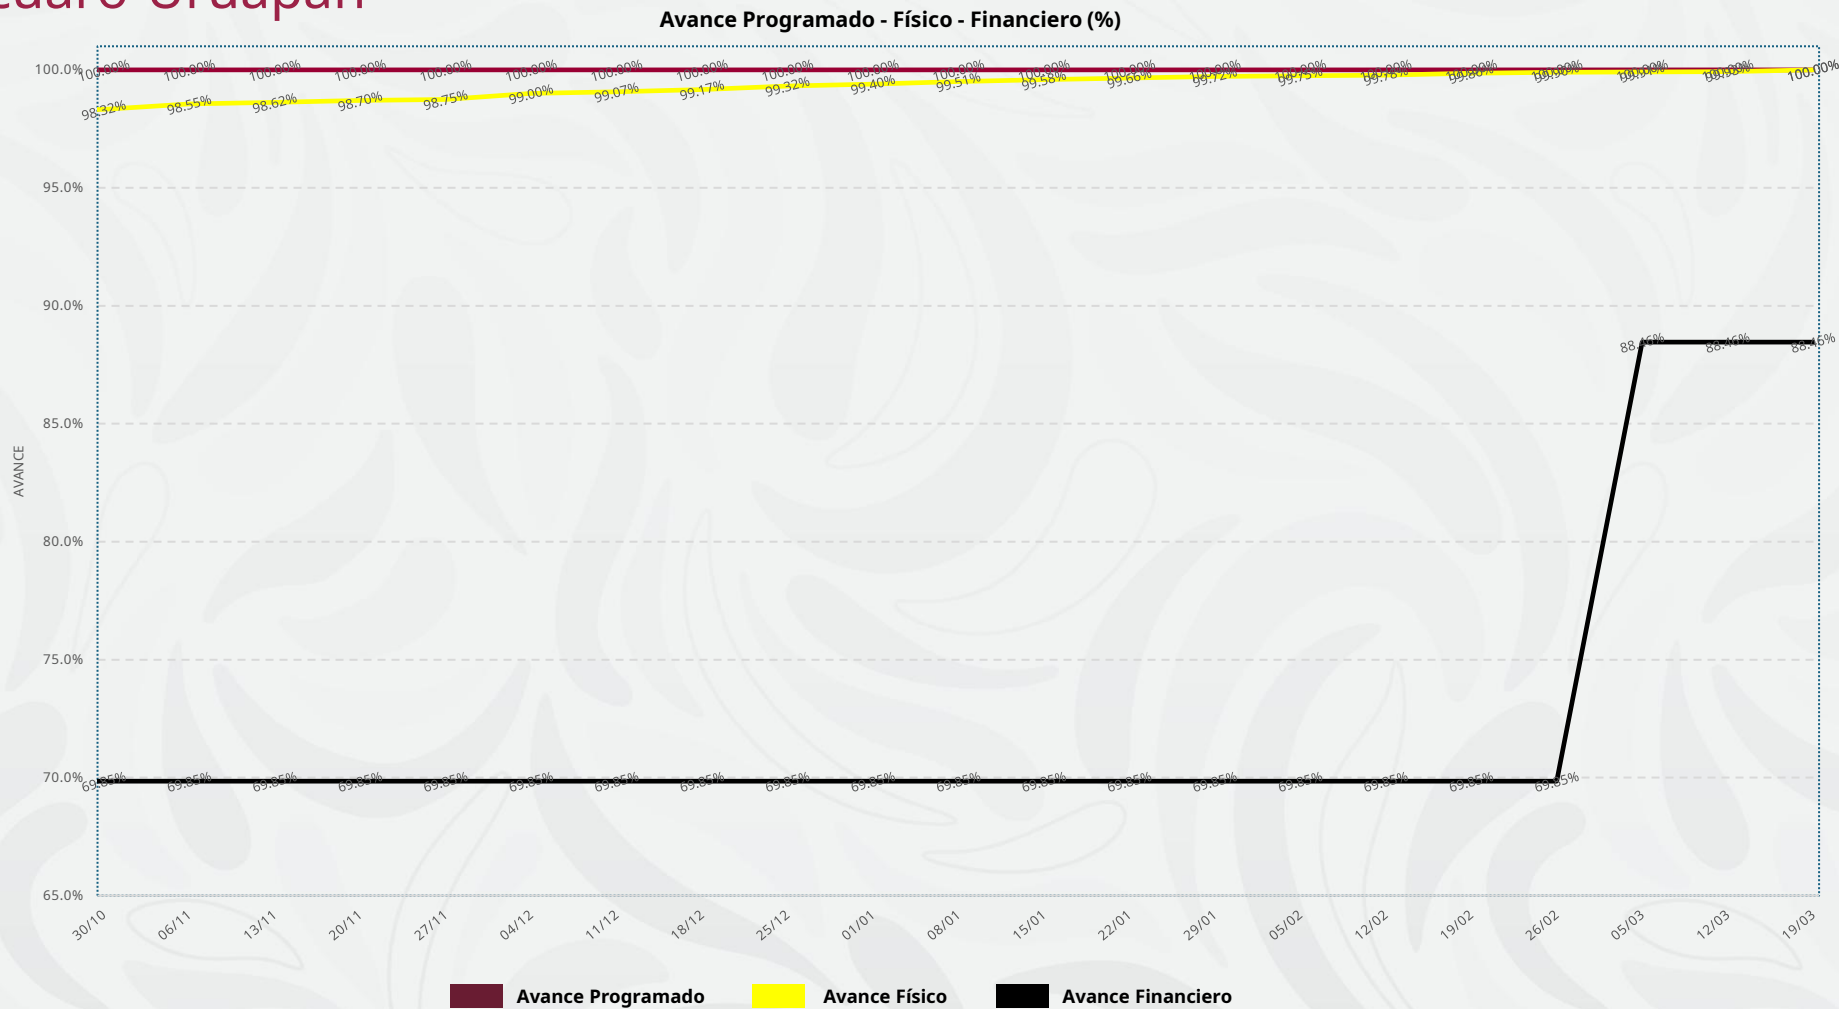

	Del 05 de marzo al 12 de marzo de 2026	Del 12 de marzo al 19 de marzo de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	80	0
Maquinaria	9	0
Frente de Trabajo	PIFFCC km 91+754 y PIFFCC km 73+584	-
