Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.

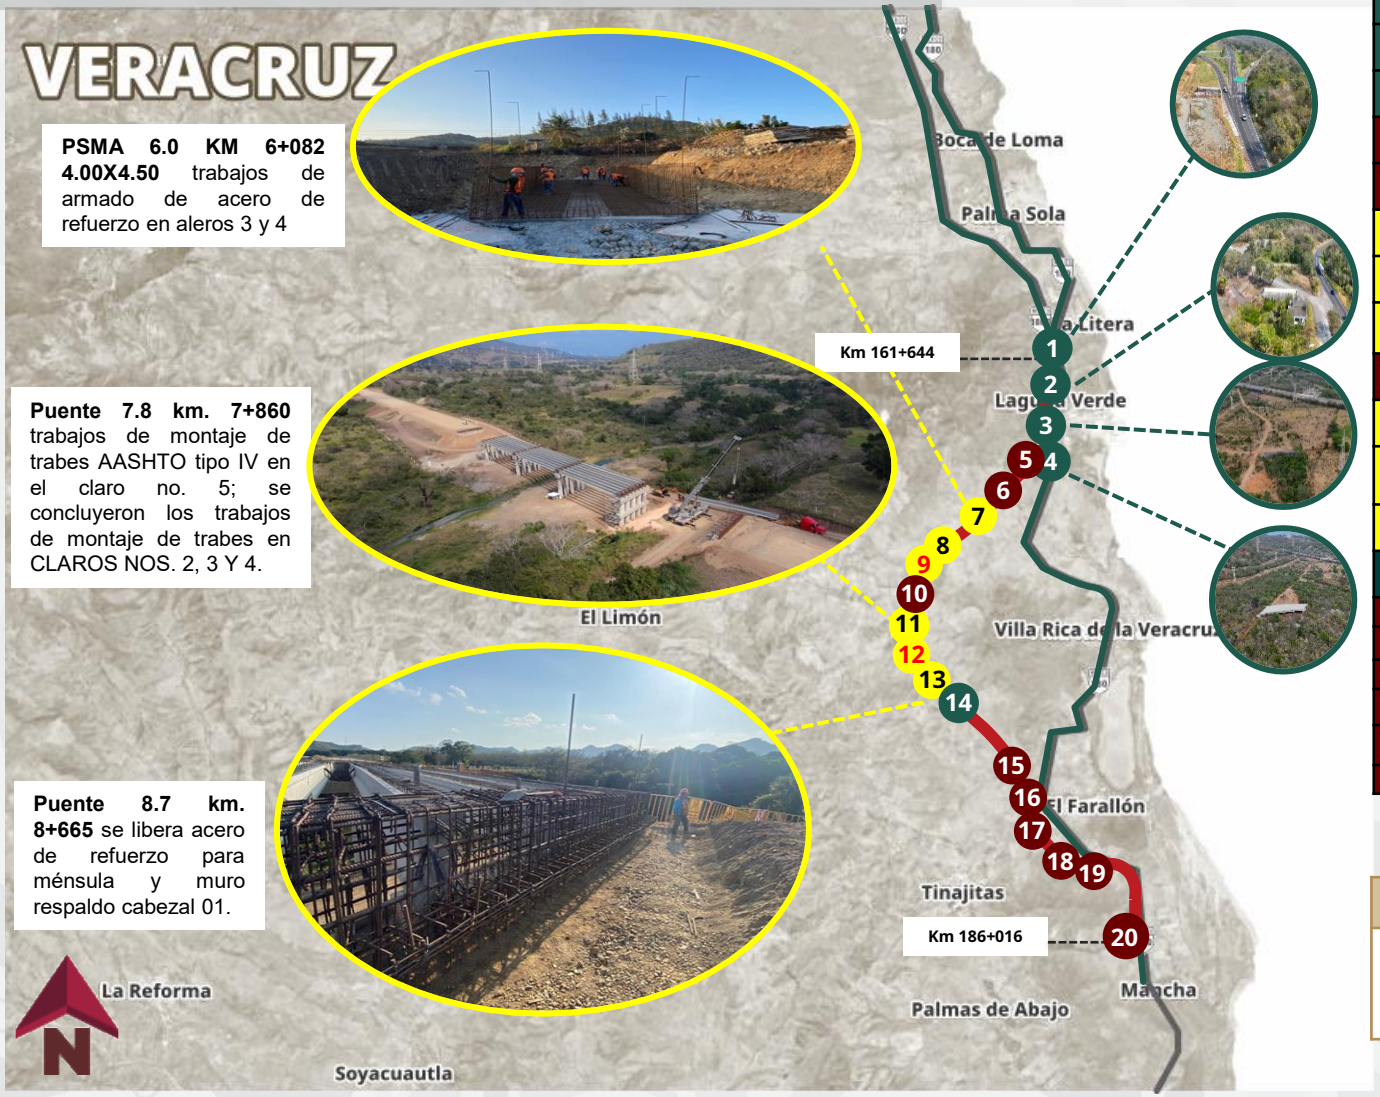

PSMA 6.0 KM 6+082 4.00X4.50 trabajos de armado de acero de refuerzo en aleros 3 y 4

Puente 7.8 km. 7+860 trabajos de montaje de trabes AASHTO tipo IV en el claro no. 5; se concluyeron los trabajos de montaje de trabes en CLAROS NOS. 2, 3 Y 4.

Puente 8.7 km. 8+665 se libera acero de refuerzo para ménsula y muro respaldo cabezal 01.

	Descripción
1	Entronque Laguna Verde II Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.05 Km 3+041
5	Entronque Laguna Verde I Km 3+041
6	PSMA 3.9 Km 3+900
7	PSMA 6.0 Km 6+080 **(43.00%)**
8	PIV 6.8 Km 6+806 **(47.00%)**
9	PIV 7.04 Km 7+040 **(5.00%)** Se continua con la evaluación de la reubicación de la estructura.
10	PUENTE 7.3 Km 7+330
11	PUENTE 7.8 Km 7+815, **(53.00%)**
12	PLAZA DE COBRO Km 8+300, **(16.00%)** El proyecto ejecutivo está en revisión en la DGDC.
13	PUENTE 8.7 Km 8+665, **(60.00%)**
14	PSMA 8.9 Km 8+960, **(100.00%)**
15	PUENTE 14 Km 14+000
16	PUENTE 14.7 Km 14+700
17	PSV Km 14+900
18	PSMA 15.3 Km 15+370
19	PSV 16.8 Km 16+800
20	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+841

Simbología

- Por construir
- En proceso de construcción
- Concluido

Avance físico

- Programado: 64.01%
- Real: 25.61% Incluye Ent. Chapachapa
- Financiero: 15.71%
- Semanal: 0.58%

Inversión: 2,252.78 mdp

Inicio: Marzo de 2025
Término: Agosto de 2026

Meta: 19.84 km, 5 Puentes, 1 Plaza de Cobro, 3 Entronques, 2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMAs, 59 ODTs y el Entronque Chapachapa

2,252.78 (1)=2,253 empleos directos generados/millón de inversión
2,252.78 (2)= 4,506 empleos indirectos generados/millón de inversión

128,000 habitantes beneficiados

45 minutos de ahorro en tiempo, Tramo 4

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.

Ejes 11, 41, 31 y 21 TRABAJOS CONCLUIDOS.

Simbología
Por construir
En proceso de construcción
Concluido

	Descripción
1	Entronque Chapachapa Km 739+733 (Km op. 92+512) **(100.00%)**
2	ODT 92+827.25 **(100.00%)**
3	PSPyG 92+832.22 **(100.00%)**
4	Ampliación de ODT 100+102, **(100.00%)**

Avance físico

- Real: 100.00%
- Programado: 100.00%
- Financiero: 74.48%
- Semanal: 0.00%

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	19/02/26 al 26/02/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Volúmenes de obra						
Despalme	229,302.80	68,484.97	160,817.83	7,165.00	2,485.94	El volumen programado corresponde a los **19. 8 km** y solo se trabaja en **6.5 km.**
Corte	1,414,039.20	152,853.88	1,261,185.32	27,193.00	4,157.18	El volumen programado corresponde a los **19. 8 km** y solo se trabaja en **6.5 km.**
Terraplén	1,155,915.50	171,962.58	983,952.92	20,641.00	1,138.94	El volumen programado corresponde a los **19. 8 km** y solo se trabaja en **6.5 km.**
Pedraplén	97,038.03	43,586.63	53,451.40	4,043.25	4,252.00	El volumen programado corresponde a los **19. 8 km** y solo se trabaja en **6.5 km.**
Estructuras Laguna Verde - La Mancha						
Zapata	4	2	2	0	0	**PIV 6.8 Km 6+806 Estribo 01** en espera de reajuste de zapata.
Muros	2	2	0	0	0	Se realizó el montaje de 4 trabes AASHTO tipo IV **PIV 6.8 Km 6+806**
Aleros	4	2	2	0	0	Se realizó el montaje de 4 trabes AASHTO tipo IV **PIV 6.8 Km 6+806**
Losa superior	4	4	0	2	2	**ODT 4.4 1C2x2 KM 4+483** Estructuralmente concluida.
Muros	2	2	0	2	2	**ODT 4.8 1C5.0x4.5 KM 4+871** estructuralmente concluida,
Aleros	4	4	0	1	3	**ODT 4.8 1C5.0x4.5 KM 4+871** estructuralmente concluida
Losa superior	1	1	0	0	1	**ODT 4.8 1C5.0x4.5 KM 4+871** estructuralmente concluida.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

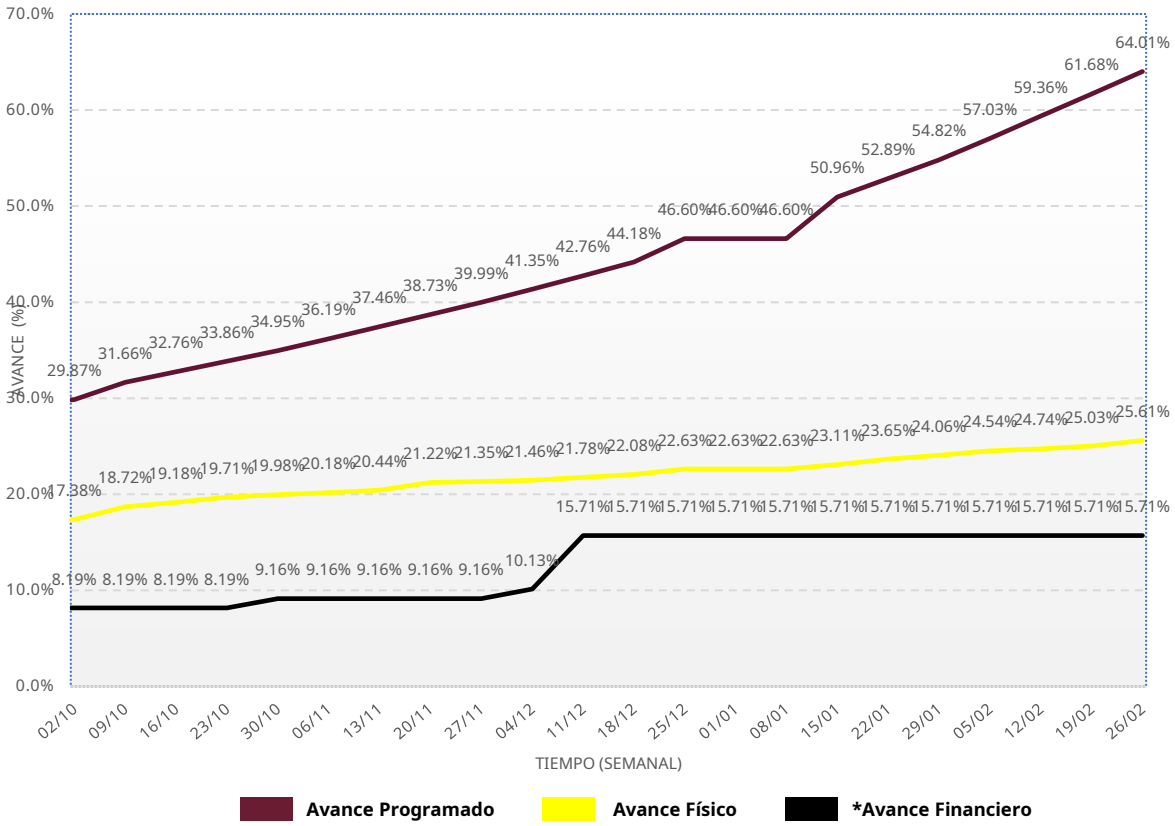

	13 de febrero al 19 de febrero	20 de febrero al 26 de febrero
Fuerza de Trabajo (personas)	127	154
Maquinaria	18	21
Fuerza de Trabajo	KM 5+810 AL KM 5+880 trabajos de suministro, conformación y compactación de capa de terraplén sobre ODT 5.8	PIV 6.8 KM 6+806 trabajos de izaje y colocación de trabes AASHTO tipo lV
