Michoacán

Tramo Pátzcuaro-Uruapan

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 100.00%
- Real: 99.90%
- Semanal: 0.04 %
- Financiero: 69.85%

	Descripción
1	Entronque Zirimicuaro km 93+500
2	Trabe Canal km 92+210
3	Entronque Caracha km 92+100,
4	PIFFCC Caracha km 91+754, **(99.55%).**
5	Puente Canintzio km 88+283
6	PIV km 88+054,

	Descripción
7	Entronque San Ángel km 87+400
8	Rampa de emergencia II km 86+500
9	Rampa de emergencia I km 84+100
10	Entronque Jujucato km 79+489
11	PIFFCC Zirahuén km 73+584, **(99.30%)**
12	Viaducto Zirahuén km 70+278
13	Entronque Zirahuén km 68+600

	Descripción
14	Caseta de cobro remota Zirahuén 68+600
15	Plaza de cobro Zirahuén km 60+500
16	Entronque Pátzcuaro II km 53+600
17	Entronque Pátzcuaro I km 47+500
18	Entronque las trojas km 47+000

Inversión: 1,792 mdp

Inicio: Julio 2017
Término: Febrero 21, 2026

Meta: 48.47 km
46.79.00 km (troncal)
1.68 km (estructuras)
58 Totales (1 plaza de cobro,1 puente,1 viaducto, 8 entronques, 45 cruces, 2 rampas de frenado).

5,376 Empleos generados
1,792 empleos directos
3,584 empleos indirectos

200 mil habitantes beneficiados

25 minutos de ahorro en tiempo.

Concesionaría : PINFRA.

Michoacán

Tramo Pátzcuaro-Uruapan

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	19/02/2026 al 26/02/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Troncal						
PIFCC km 73+584. Obra complementario	1	0	1	1	1	Construcción de parapeto metálico en superestructura
PIFCC km 91+754 Obra complementario	1	0	1	1	1	Construcción de parapeto metálico en superestructura

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

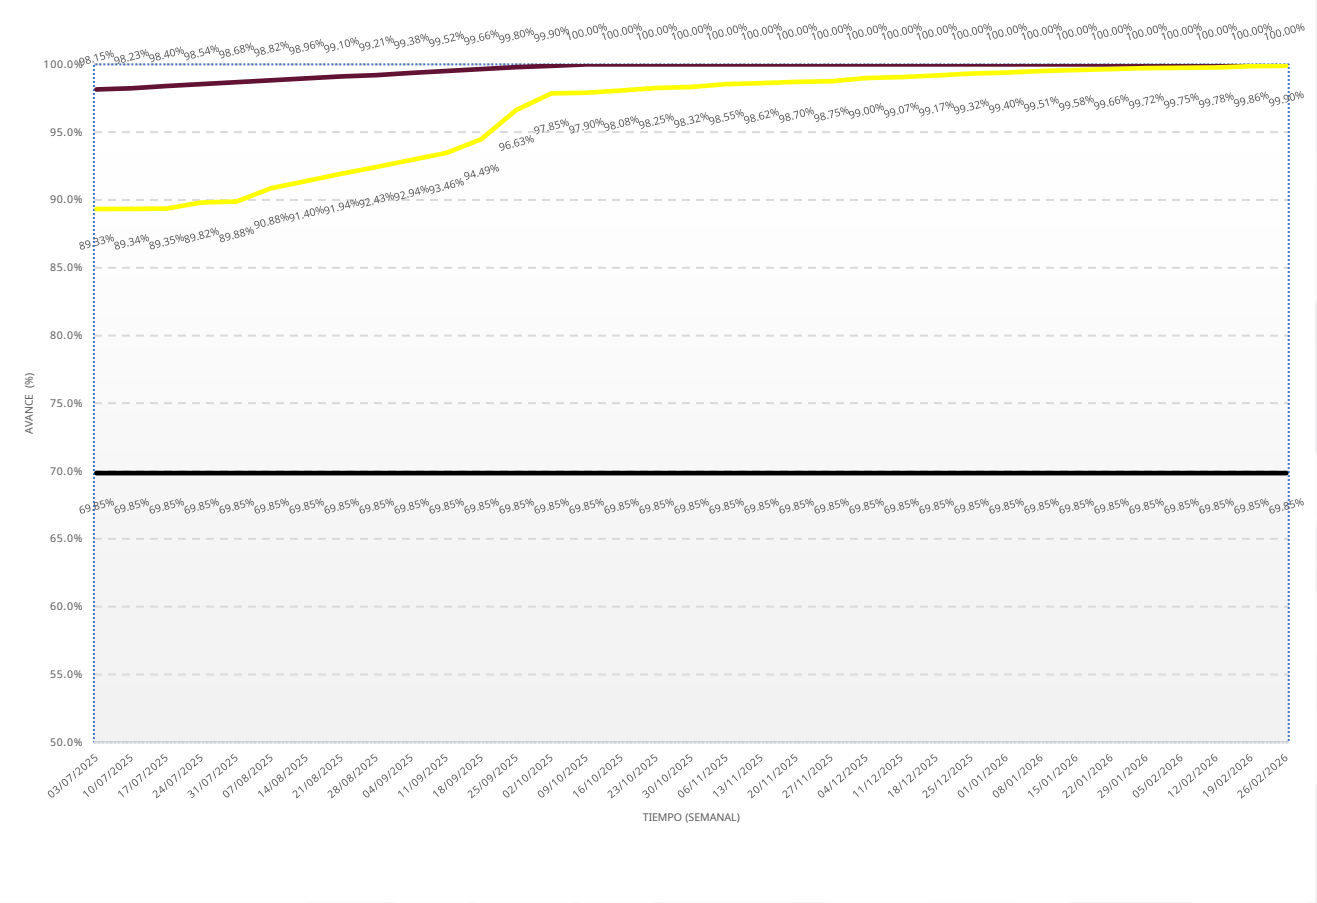

	Del 12 de febrero al 19 de febrero de 2026	Del 19 de febrero al 26 de febrero de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	80	80
Maquinaria	12	9
Frente de Trabajo	PIFFCC km 91+754 y PIFFCC km 73+584	PIFFCC km 91+754 y PIFFCC km 73+584

2026 año de Margarita Maza
