Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico
- Programado: 19.05%
- Real: 19.31 %
- Semanal: 0.11 %
- Financiero: 0%

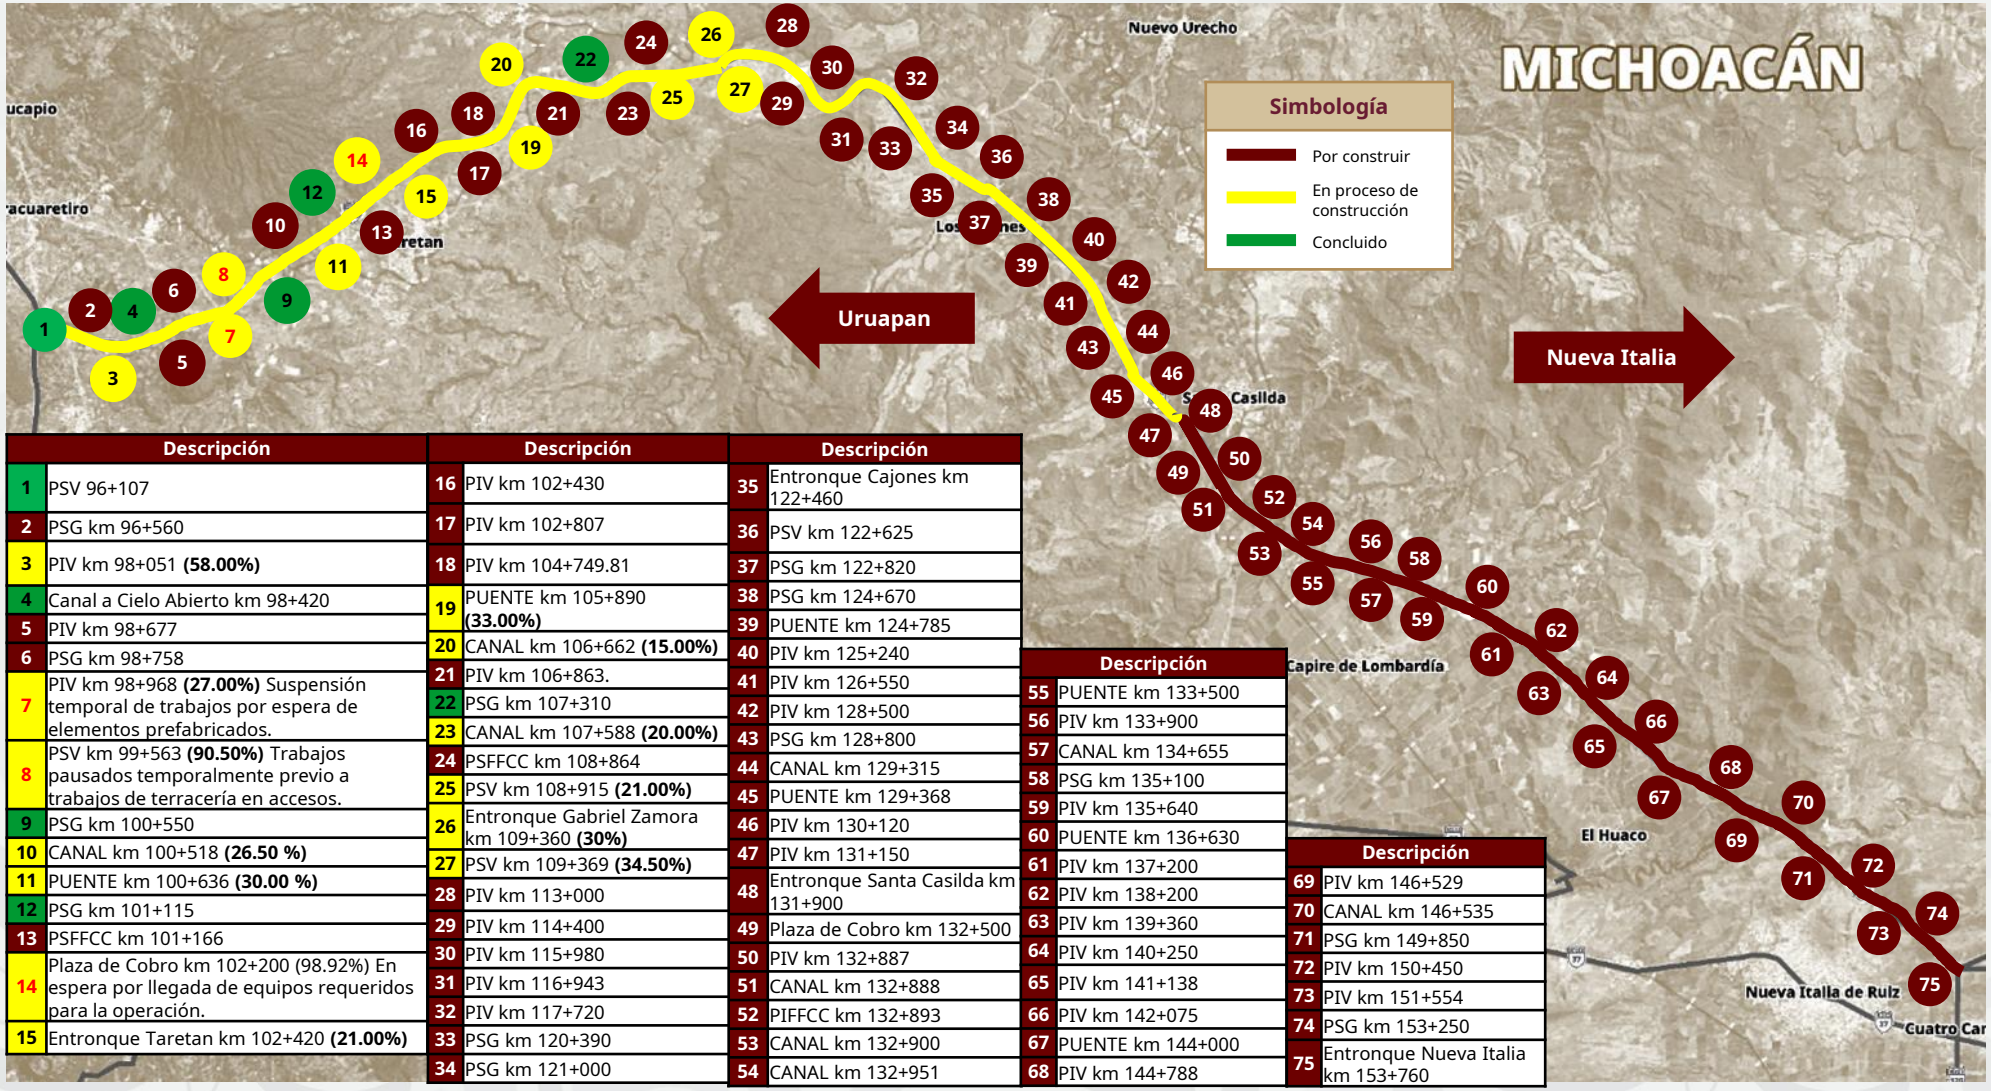

	Descripción
1	PSV 96+107
2	PSG km 96+560
3	PIV km 98+051 **(58.00%)**
4	Canal a Cielo Abierto km 98+420
5	PIV km 98+677
6	PSG km 98+758
7	PIV km 98+968 **(27.00%)** Suspensión temporal de trabajos por espera de elementos prefabricados.
8	PSV km 99+563 **(90.50%)** Trabajos pausados temporalmente previo a trabajos de terracería en accesos.
9	PSG km 100+550
10	CANAL km 100+518 **(26.50 %)**
11	PUENTE km 100+636 **(30.00 %)**
12	PSG km 101+115
13	PSFFCC km 101+166
14	Plaza de Cobro km 102+200 (98.92%) En espera por llegada de equipos requeridos para la operación.
15	Entronque Taretan km 102+420 **(21.00%)**

	Descripción
16	PIV km 102+430
17	PIV km 102+807
18	PIV km 104+749.81
19	PUENTE km 105+890 **(33.00%)**
20	CANAL km 106+662 **(15.00%)**
21	PIV km 106+863.
22	PSG km 107+310
23	CANAL km 107+588 **(20.00%)**
24	PSFFCC km 108+864
25	PSV km 108+915 **(21.00%)**
26	Entronque Gabriel Zamora km 109+360 **(30%)**
27	PSV km 109+369 **(34.50%)**
28	PIV km 113+000
29	PIV km 114+400
30	PIV km 115+980
31	PIV km 116+943
32	PIV km 117+720
33	PSG km 120+390
34	PSG km 121+000

	Descripción
35	Entronque Cajones km 122+460
36	PSV km 122+625
37	PSG km 122+820
38	PSG km 124+670
39	PUENTE km 124+785
40	PIV km 125+240
41	PIV km 126+550
42	PIV km 128+500
43	PSG km 128+800
44	CANAL km 129+315
45	PUENTE km 129+368
46	PIV km 130+120
47	PIV km 131+150
48	Entronque Santa Casilda km 131+900
49	Plaza de Cobro km 132+500
50	PIV km 132+887
51	CANAL km 132+888
52	PIFFCC km 132+893
53	CANAL km 132+900
54	CANAL km 132+951

	Descripción
55	PUENTE km 133+500
56	PIV km 133+900
57	CANAL km 134+655
58	PSG km 135+100
59	PIV km 135+640
60	PUENTE km 136+630
61	PIV km 137+200
62	PIV km 138+200
63	PIV km 139+360
64	PIV km 140+250
65	PIV km 141+138
66	PIV km 142+075
67	PUENTE km 144+000
68	PIV km 144+788

	Descripción
69	PIV km 146+529
70	CANAL km 146+535
71	PSG km 149+850
72	PIV km 150+450
73	PIV km 151+554
74	PSG km 153+250
75	Entronque Nueva Italia km 153+760

Inversión: 7,049 mdp

Inicio: noviembre de 2023
Término: diciembre 2026

Meta: 67.09 km
65.00 km (troncal)
2.09 km (estructuras)
2 Plazas de Cobro, 7 puentes, 5 Entronques, 60 cruces (5 PSV's, 30 PIV's, 13 PSG's, 1 PIFFCC, 2 PSFFCC, 9 trabes canales), 1 canal a cielo abierto (cien fuegos) y múltiples obras de drenaje.

21,147 empleos generados
7,049 empleos directos
14,098 empleos indirectos

1,800,000 habitantes beneficiados

25 minutos de ahorro en tiempo

Concesionaría : PINFRA.

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	19/02/2026 al 26/02/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica	65 km	10.60 km	54.40 km	.300 km	.300 km	
Subbase	65 km	12.50 km	52.50 km	.300 km	.300 km	
Subyacente	65 km	15.40 km	49.60 km	.400 km	.400 km	
PIV Km 98+051 Subestructura	6	4	2	2	2	Suministro de trabe de concreto previo a maniobras de montaje
Puente Km 100+636 Subestructura	16	0	16	8	8	Habilitado de cimbra en bancos de apoyo (ambos cabezales)
Puente Km 105+890 Subestructura	5	2	3	2	2	Habilitado de acero para pilas en apoyo C1 y en cabezal apoyo C4
Canal Km 106+662 Subestructura	3	1	2	1	1	Colado de concreto hidráulico en primer alzado de columna 2
Canal Km 107+588 Subestructura	2	0	2	1	1	Habilitado de cimbra de madera previo al colado de cabezal en apoyos 2 y 3
PSV Km 108+915 Subestructura	2	1	2	1	1	Armado de acero para 3er trepado de estribo en eje 1

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

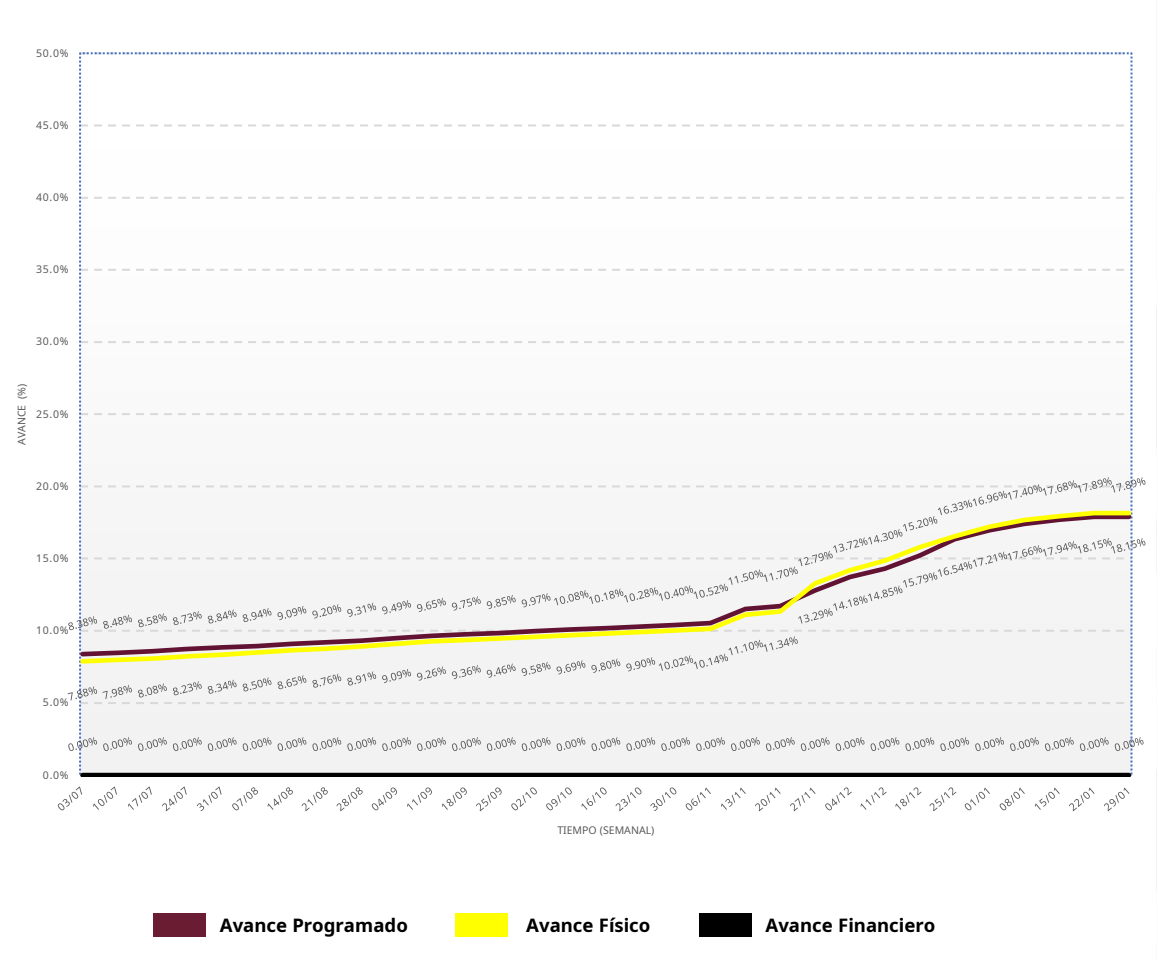

	Del 12 de febrero al 19 de febrero de 2026.	Del 19 de febrero al 26 de febrero de 2026.
Fuerza de Trabajo (personas)	805	805
Maquinaria	250	250
Frente de Trabajo	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369
