Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

	Descripción
1	Entronque Pomas km 9+380
2	Entronque San Vicente km 14+500
3	PIP km 18+370
4	Entronque Zinzingareo km 18+700
5	Entronque Senguio km 21+280
6	PIP km 22+280
7	Entronque Santa Rosa km 32+420
8	Entronque Ziranda-Jaripeo km 33+500
9	Puente Turundeo Km 36+460 (100.00%),
10	Entronque Turundeo I km 37+550 (100.00%),
11	Entronque Turundeo II km 38+780 (100.00%),
12	Puente Obispo Km 50+400 **(0.00%)**, Sin Iniciar

	Descripción
13	Entronque Jungapeo km 56+700 **(90.65%)**
14	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 **(69.33%)**, Sin actividad, pendiente suministro de base hidráulica en ampliación de corona.
15	Entronque Zirahuato km 62+500 **(62.01%)**, Pendiente tendido de base asfáltica en ampliaciones de corona
16	Entronque San Felipe I km 64+400 **(28.76%)**, Sin actividad.
17	Entronque San Felipe II Km 64+640 **(28.76%)**, Sin actividad.
18	Entronque Macutzio km 65+620 **(22.34%)**
19	Entronque Valle Verde km 67+220 **(71.96%)**
20	Entronque Curungueo I Km 68+240 **(74.43%)**
21	Entronque Curungueo II Km 68+780 **(74.43%)**
22	Puente San Juan Viejo Km 69+860 **(96.26%)**
23	PSV Zitácuaro Km 72+160 **(95.36%)**

Avance físico

- Programado: 58.64% (Reprogramación T8)
- Real: 61.86%
- Semanal: 0.42%
- Financiero: 17.56%

Nota 1:
Los avances se calculan en relación a la Inversión total del Ramal

Inversión: $**4,575.3 mdp (total Ramal)**
$3,048.81 mdp (modernización)
$1,526.49 mdp (Libramientos)

4,800 empleos generados

Meta: 71.3 Km

126,000 habitantes beneficiados

Inicio: septiembre 2020
Reinicio: 27 de ene de 2024
Término: 31 de diciembre de 2026

Ahorro en tiempo: 25 min

Concesionaria: Red de carreteras de occidente

Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Zitácuaro - Maravatío

TERRACERIAS							
Concepto		Total	Ejecutado	Faltante	Del 20 feb al 26 feb 26		Observaciones
					Programado	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	759,616.08	-54,058.08	0.00	5,506.87		
Terraplén (m3)	445,687.00	430,594.18	15,092.82	2,293.38	8,195.59		
Subyacente (m3)	256,097.00	261,208.15	-5,111.15	2,257.38	1,330.14		CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS EN MODIFICACIÓN DE TRAZO T9 Y RECTIFICACIÓN DE TRAZO EN T6
Subrasante (m3)	170,688.00	169,610.51	1,077.49	1,249.75	852.51		CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS EN MODIFICACIÓN DE TRAZO T9 Y RECTIFICACIÓN DE TRAZO EN T6

PAVIMENTOS							
Concepto		Total	Ejecutado	Faltante	Del 20 feb al 26 feb 26		Observaciones
					Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	119,896.20	5,762.84	521.70	562.37		
Bacheo (m3)	1,800.00	1,808.25	-8.25	65.00	60.00		SE ESTÁN TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6 Y 7.
Fresado (m3)	10,676.00	10,694.10	-18.10	0.00	7.00		
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	29.16	1.08	0.00	0.12		EN PROCESO TRAMO 6
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	119,151.67	1,262.38	1,049.47	127.06		SE ESTÁN TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	29,946.21	15,301.59	887.56	882.87		CONTINUAN TRABAJOS DE TENDIDO EN TRAMO 4 Y TRAMO 6

ESTRUCTURAS							
Concepto		Total	Ejecutado	Faltante	Del 20 feb al 26 feb 26		Observaciones
					Programado	Ejecutado	
PIV JUNGAPEO	1.00	1.0085	0.0000	0.0000		0.0001	CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN GASA SALIDA
PSV SAN FELIPE	1.00	0.4141	0.5859	0.0753		0.0031	CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.9626	0.0374	0.0436		0.0036	APROCHE DE CABEZALES
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.9536	0.0464	0.0591		0.0029	ARMADO, CIMBRADO Y COLADO DE GURANICIONES DE REMATE DE MURO.
DEFENSA METÁLICA	35,327.00 ml	29,382.42 ml	5,944.58 ml	0.00 ml		76.47 ml	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4 Y 10
CUNETA	12,028.95 ml	10,658.13 ml	1,370.82 ml	0.00 ml		12.60 ml	CONTINÚA LA CONSTRUCCIÓN EN TRAMO 4

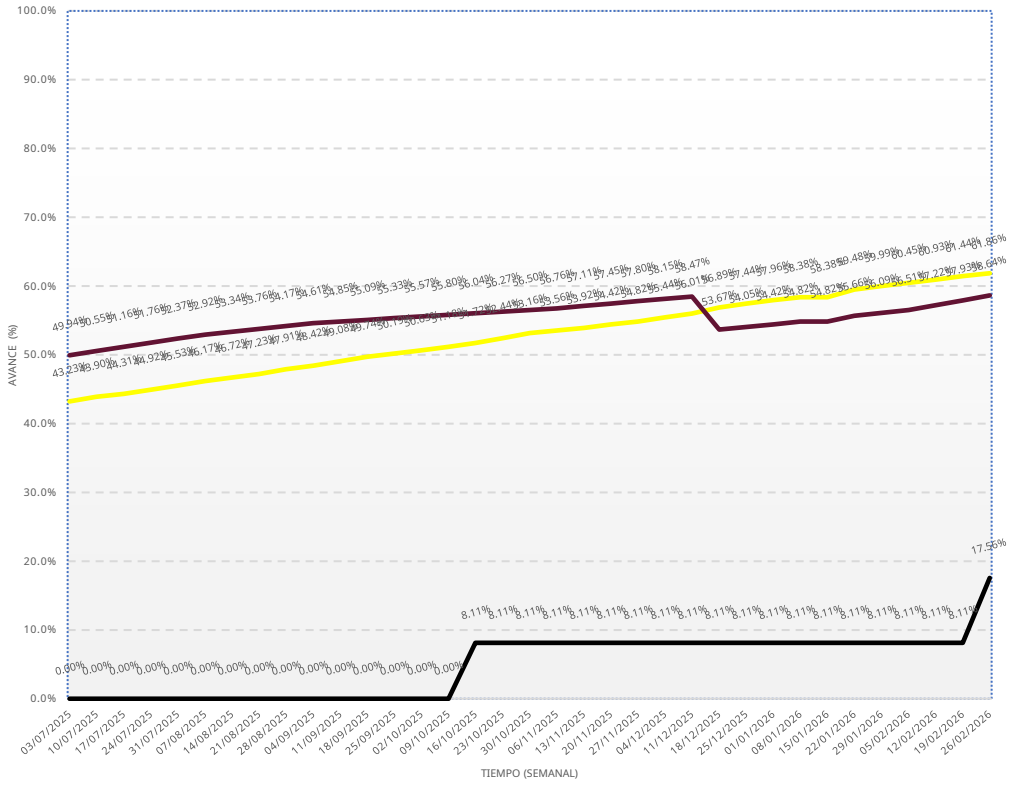

Avance Programado | Avance Físico | *Avance Financiero

	Del 13 al 19 feb 26	Del 20 al 26 feb 26
Fuerza de Trabajo (personas)	287	285
Maquinaria	192	183
Frentes de trabajo (totales)	31	31
