Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 99.26%
- Real: 39.97%
- Semanal: 1.15%
- Financiero: 35.25%

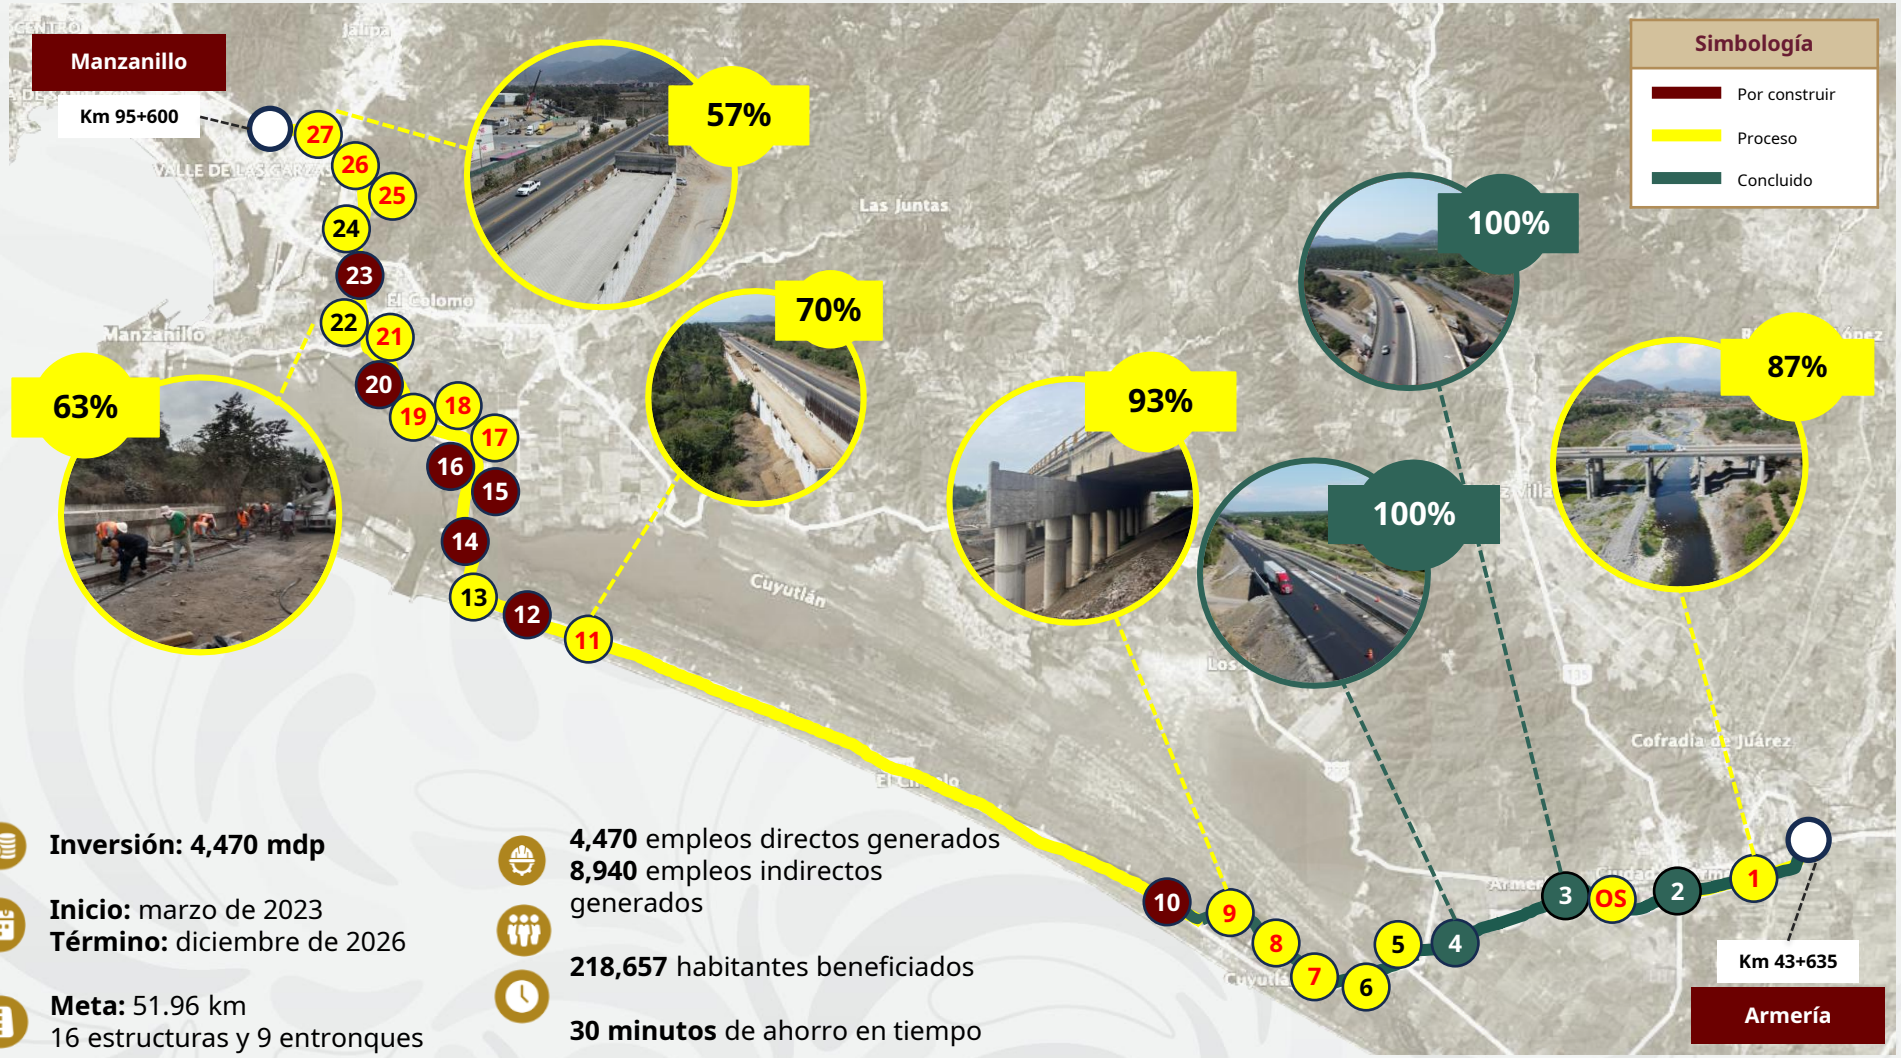

	Descripción
1	Puente Armería I km 45+500 **(87%)** No se ejecutan trabajos por falta de personal y maquinaria.
2	Entronque Paraíso km 47+741 **(100%)**
3	PSFFCC Armería II km 50+100 **(100%)**
4	PSV Tilapia km 54+350 **(100%)**
5	Puente Palo Verde I km 55+950 **(79%)**
6	Puente Palo Verde II km 56+650 **(67%)**
7	PIV Ent. Salinero II km 59+500 **(83%)** El trabajo programado para esta semana, está concluido.
8	Entronque Salineros km 59+551 **(27%)** Sin trabajos programados
9	PSFFCC Salinero I km 60+500 **(93%)** Sin trabajos programados
10	Entronque Cuyutlán km 60+800 (A la espera de regularización de catálogo)
11	PIV Retorno en U km 77+600 **(71%)** Sin trabajos programados
12	Entronque Retorno en U km 77+600 (A la espera de regularización de catálogo)
13	PSFFCC Tepalcates I km 80+240**(52.5%)** Se movió la fuerza de trabajo
14	Entronque Tepalcates I km 79+660 (A la espera de regularización de catálogo)
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+581
16	Entronque Tepalcates II km 80+500
17	Entronque 83+500 km **(42%)** No se tiene Fuerza de Trabajo Suficiente
18	Puente Adjuntas km 86+420**(71%)** Se conciliaron volúmenes
19	PSV Panteones km 87+760 **(21%)** Son se ha comenzado con esta estructura por priorizar entrega de tramos 1 y 2.
20	Entronque Panteones km 87+760
21	PIV Minatitlán Lib. km 92+000 **(4%)** Se detuvieron trabajos por interferencia con instalaciones de CFE.
22	PIV Minatitlán Lib. II km 92+000 **(63%)**
23	Entronque Minatitlán km 92+731
24	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 **(16%)** No hay trabajos por logística de perforación.
25	Puente Canal km 93+220 **(54%)** Se realizó cambio de tránsito a Cuerpo Derecho
26	Entronque Jalipa km 94+400 **(24%)**
27	Puente Jalipa km 94+158 **(57%)** El trabajo programado para esta semana, está concluido
OS	PSV Obra social retorno en U 49+900 **(96%)**

Inversión: 4,470 mdp

Inicio: marzo de 2023
Término: diciembre de 2026

Meta: 51.96 km
16 estructuras y 9 entronques

4,470 empleos directos generados
8,940 empleos indirectos generados

218,657 habitantes beneficiados

30 minutos de ahorro en tiempo

Concesionaria: PINFRA

Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	13/02/26 al 19/02/26 Programado	13/02/26 al 19/02/26 Ejecutado	Observaciones
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m^3)	210,113	278,185	0	0	2,400	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m^3)	813,909	555,101	258,808	0	3,376	
Base y sub base (m^3)	260,119	181,761	78,358	0	1,059	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente.
El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.

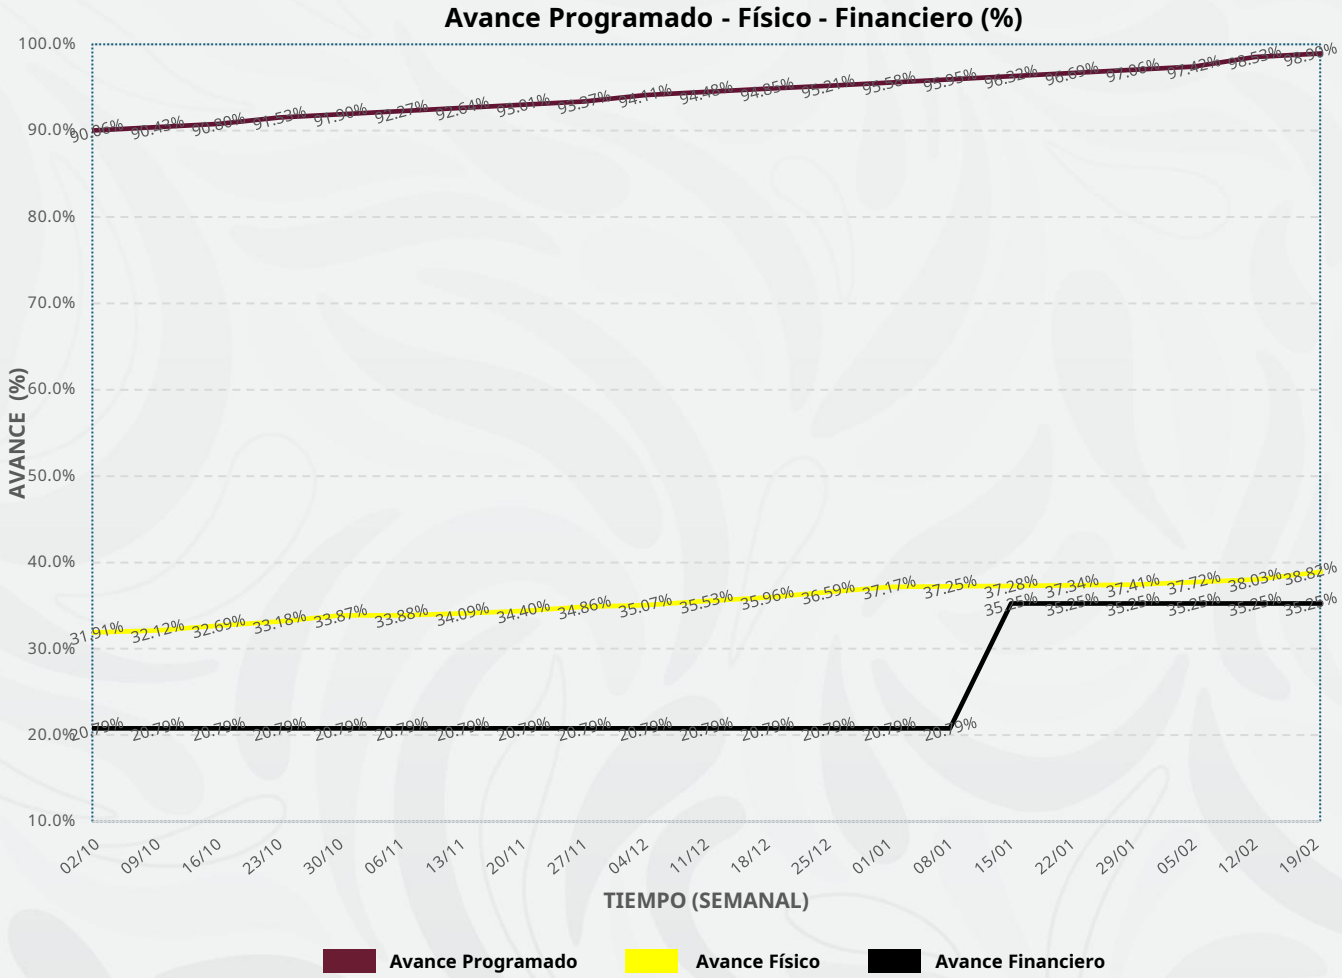

	06 de enero al 12 de febrero	13 de enero al 19 de febrero
Fuerza de Trabajo (personas)	83	137
Maquinaria	43	74
Frente de trabajo	Tramo 1 del km 50+240 al km 50+620 Tramo 2 del km 59+300 al km 59+680 Tramo 4 del km 74+790 al km 76+980	Del Km 30+320 al km 30+380 Del Km 50+220 al Km 50+380 Del Km 66+520 al km 73+520 Del Km 74+980 al Km 76+420
