Estado de México

Atizapán-Atlacomulco

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

	Descripción
1	Entronque Chiluca **15.00%,** sin actividad, falta de recursos
2	Viaducto Sin Nombre km 20+880.00 **53.82%**
3	Viaducto La Estadía km 22+332.00 **53.85%**
4	Viaducto Los Gallos km 27+425.00 **45.82%**
5	Túnel Los Gallos km 27+770.00 **95.00%,** sin actividad, faltan todos los elementos electromecánicos y pavimento
6	Viaducto Sin Nombre km 31+033.00 **49.78%**
7	Viaducto Tlazala km 31+359.00 **43.92%**
8	Túnel Cahuacán I km 36+258.00 **95.00%,** sin actividad, faltan todos los elementos electromecánicos y pavimento
9	Viaducto Cahuacán III km 38+995.00 **26.06%,**
10	Viaducto Sin Nombre km 42+053.00 **3.73%**
11	Entronque Villa del Carbón km 47+974.00 **00.00%** (no se han iniciado trabajos)
12	Viaducto El Llano km 51+016.**00.90%** sin actividad, problemas sociales
13	Viaducto Sin Nombre km 54+770.00 **03.80%,** sin actividad, problemas sociales
14	Viaducto Los Chaparrales km 73+387.00 **00.00%** (no se han iniciado trabajos)
15	Viaducto El Pescado km 75+482.00 **00.00%** (no se han iniciado trabajos)
16	Entronque Ixtlahuaca km 76+188.00 **35.00%,** sin actividades, problemas sociales
17	Entronque La Luna km 83+960.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
18	Viaducto El Salto km 91+874.00 **16.80%,** sin actividad, problemas sociales
19	Entronque Atlacomulco

Simbología

- Por construir
- En proceso de modernización
- Modernizado

Inversión: 9,865.8 mdp a precios de 2014 incluye I.V.A., incluye monto de obra (7,662mdp) y Fondo de Obra Adicional (843 mdp)

Meta: 74 km, 2 Plazas de cobro, 12 Viaductos, 2 Túneles, 4 Entronques, 80 PSVyG

Inicio: 01 marzo 2016
Término: 30 junio 2027

Avance físico:
- Programado: 96.50%
- Real: 53.12%
- Financiero: 24.70%
- Semanal: 00.20%

132,909 empleos generados (**44,303** directos y **88,606** indirectos)

1 millón 244 mil habitantes beneficiados

60 minutos de ahorro en tiempo

Estado de México

Atizapán-Atlacomulco

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	13/02/26 al 19/02/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Pilotes	344	193	151	2	0.67	• La mano de obra se mantiene para alcanzar las expectativas correspondientes.
Zapatas	86	47	39	1	0.93	
Columnas	96	28	68	1	1.00	
Cabezales	76	13	63	1	0.73	
Caballetes	24	8	16	1	0.96	
Trabes de concreto	395	0	395	0	0	
Trabes metálicas	29	1	28	1	0.31	

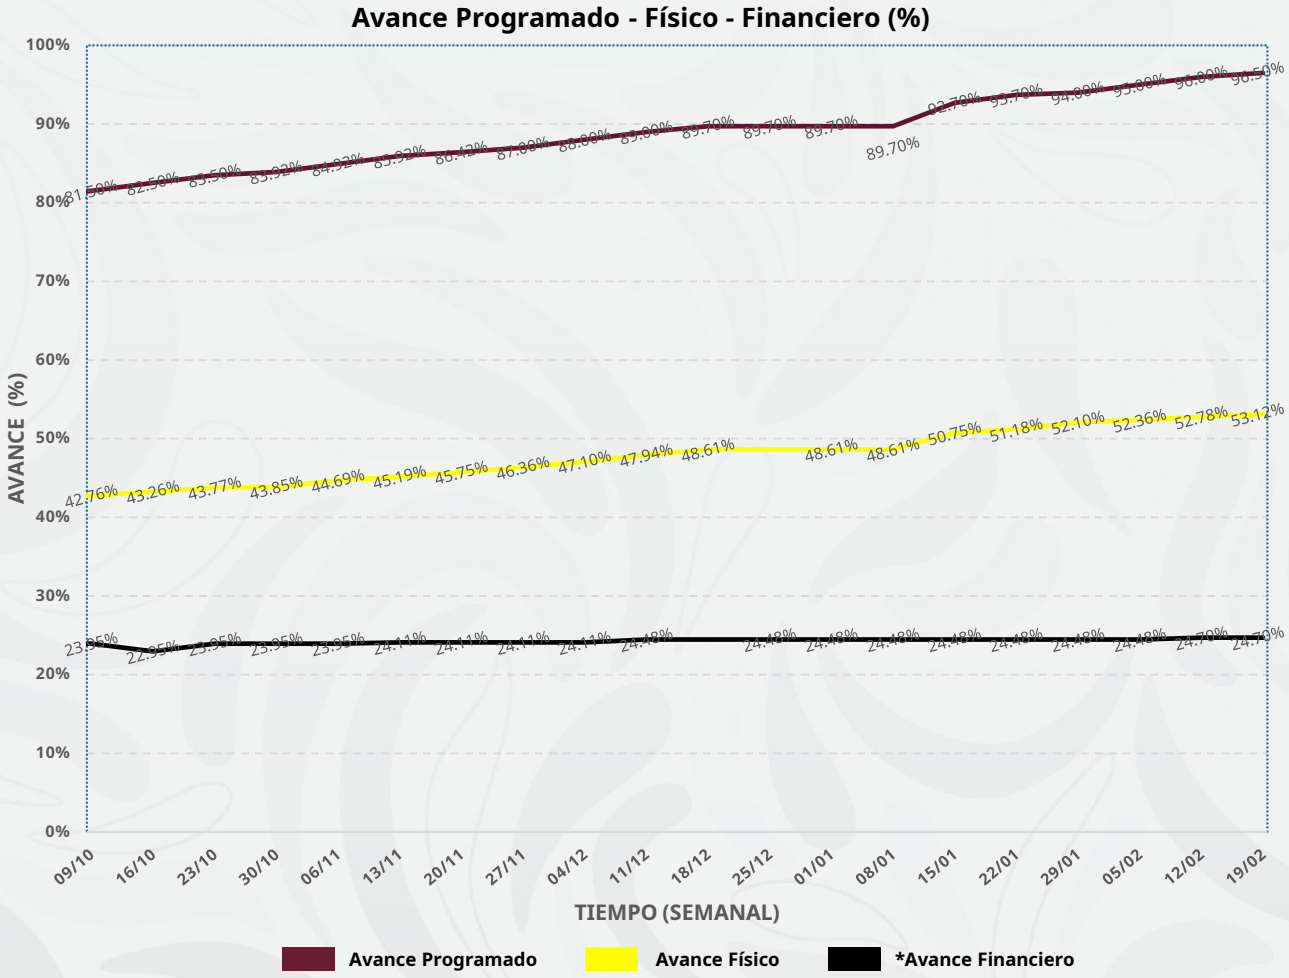

	Del 30 enero al 05 febrero	Del 06 febrero al 12 febrero
Fuerza de Trabajo (personas)	1,958	1,960
Maquinaria	505	507
Frentes de trabajo	Tramos 01, 2A y 2B	Tramos 01, 2A y 2B
