Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.

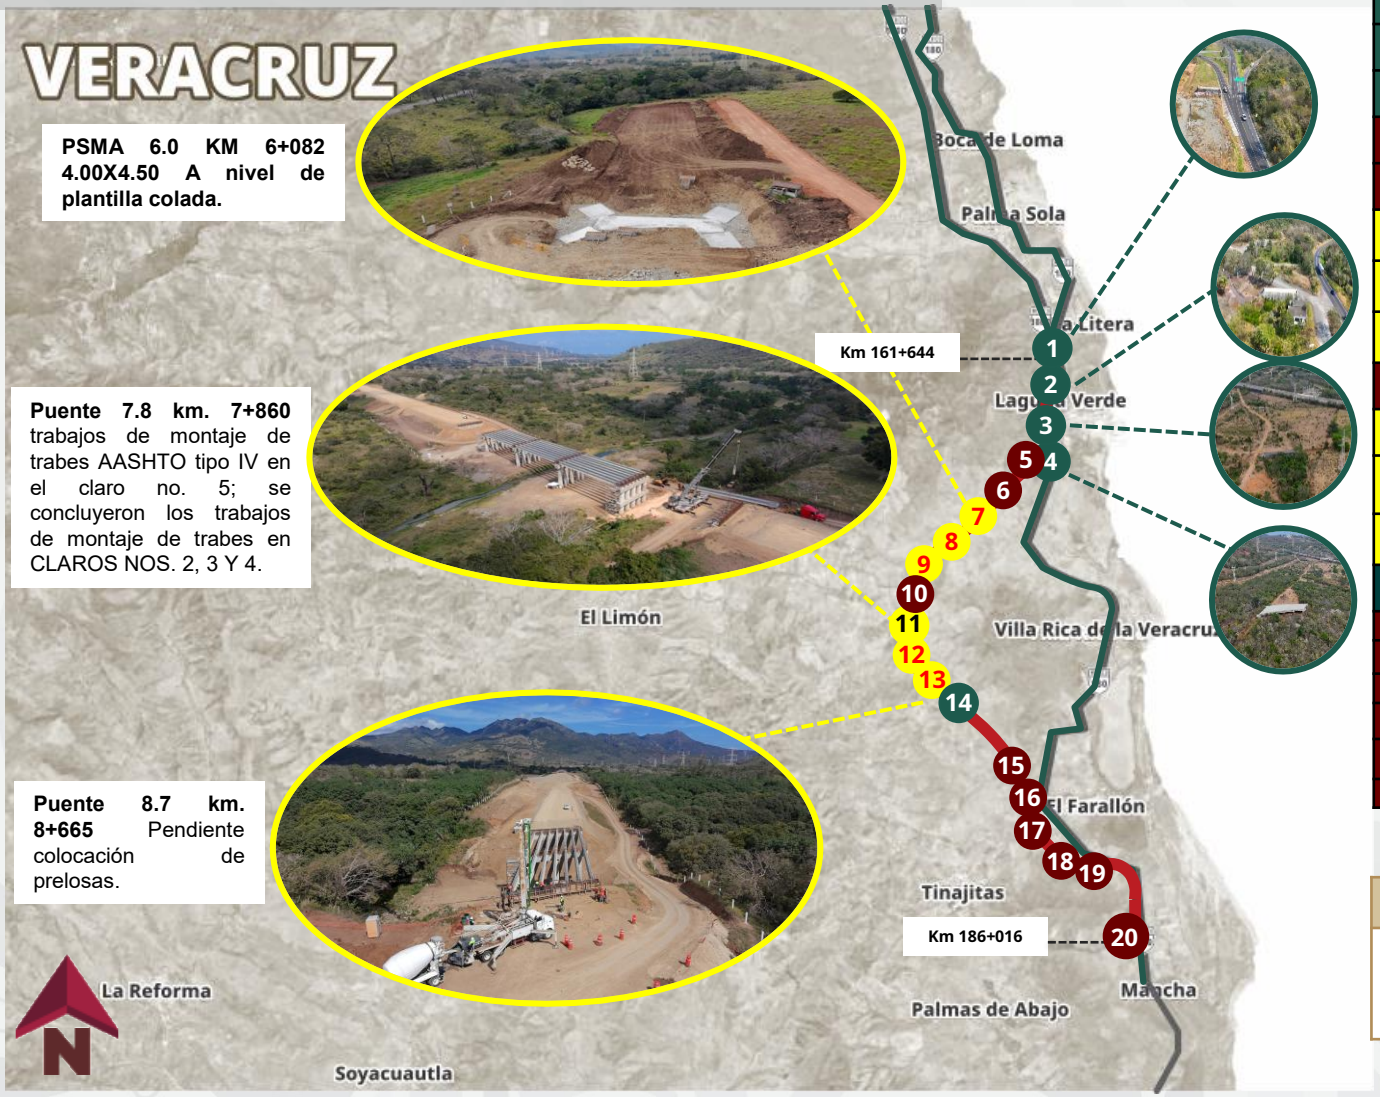

	Descripción
1	Entronque Laguna Verde II Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.05 Km 3+041
5	Entronque Laguna Verde I Km 3+041
6	PSMA 3.9 Km 3+900
7	PSMA 6.0 Km 6+080 **(15.00%)** (se movió la fuerza de trabajo)
8	PIV 6.8 Km 6+806 **(35.00%)** en espera de montaje de trabes.
9	PIV 7.04 Km 7+040 **(5.00%)** Se continua con la evaluación de la reubicación de la estructura.
10	PUENTE 7.3 Km 7+330
11	PUENTE 7.8 Km 7+815, **(52.00%)**
12	PLAZA DE COBRO Km 8+300, **(16.00%)** El proyecto ejecutivo está en revisión en la DGDC.
13	PUENTE 8.7 Km 8+665, **(58.30%)** en espera de colocación de prelosas
14	PSMA 8.9 Km 8+960, **(100.00%)**
15	PUENTE 14 Km 14+000
16	PUENTE 14.7 Km 14+700
17	PSV Km 14+900
18	PSMA 15.3 Km 15+370
19	PSV 16.8 Km 16+800
20	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+841

Simbología

- Por construir
- En proceso de construcción
- Concluido

Avance físico

- Programado: 61.68%
- Real: 25.03% Incluye Ent. Chapachapa
- Financiero: 15.71%
- Semanal: 0.29%

Inversión: 2,252.78 mdp

Inicio: Marzo de 2025
Término: Agosto de 2026

Meta: 19.84 km, 5 Puentes, 1 Plaza de Cobro, 3 Entronques, 2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMAs, 59 ODTs y el Entronque Chapachapa

2,252.78 (1)=2,253 empleos directos generados/millón de inversión
2,252.78 (2)= 4,506 empleos indirectos generados/millón de inversión

128,000 habitantes beneficiados

45 minutos de ahorro en tiempo, Tramo 4

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.

Ejes 11, 41, 31 y 21 TRABAJOS CONCLUIDOS.

Simbología
Por construir
En proceso de construcción
Concluido

	Descripción
1	Entronque Chapachapa Km 739+733 (Km op. 92+512) **(100.00%)**
2	ODT 92+827.25 **(100.00%)**
3	PSPyG 92+832.22 **(100.00%)**
4	Ampliación de ODT 100+102, **(100.00%)**

Avance físico

- Real: 100.00%
- Programado: 100.00%
- Financiero: 74.48%
- Semanal: 0.00%

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	12/02/26 al 19/02/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Volúmenes de obra						
Despalme	229,302.80	65,999.03	163,303.77	27,193.00	105.05	El volumen programado corresponde a los **19. 8 km** y solo se trabaja en **6.5 km.**
Terraplén	1,155,915.50	170,823.64	985,091.86	20,641.00	919.35	El volumen programado corresponde a los **19. 8 km** y solo se trabaja en **6.5 km.**
Pedraplén	97,038.03	39,334.63	57,703.40	4,043.25	1,099.88	El volumen programado corresponde a los **19. 8 km** y solo se trabaja en **6.5 km.**
Subyacente	162,462.20	52,036.37	110,425.83	27,077.03	1,517.88	El volumen programado corresponde a los **19. 8 km** y solo se trabaja en **6.5 km.**
Estructuras Laguna Verde - La Mancha						
Zapata	4	2	2	0	0	**PIV 6.8 Km 6+806 Estribo 01** en espera de reajuste de zapata.
Muros	2	2	0	0	0	En espera de montaje de trabes **PIV 6.8 Km 6+806**
Aleros	4	2	2	0	0	En espera de montaje de trabes **PIV 6.8 Km 6+806**
Losa superior	4	4	0	2	2	**ODT 4.4 1C2x2 KM 4+483** Estructuralmente concluida.
Muros	2	2	0	2	2	**ODT 4.8 1C5.0x4.5 KM 4+871** Se concluyeron los trabajos de colado de muros ambos lados.
Aleros	4	1	3	1	1	**ODT 4.8 1C5.0x4.5 KM 4+871** trabajos de colado en alero No. 3
Losa superior	1	0	1	0	0	**ODT 4.8 1C5.0x4.5 KM 4+871** trabajos de cimbrado para armado y colado de losa.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

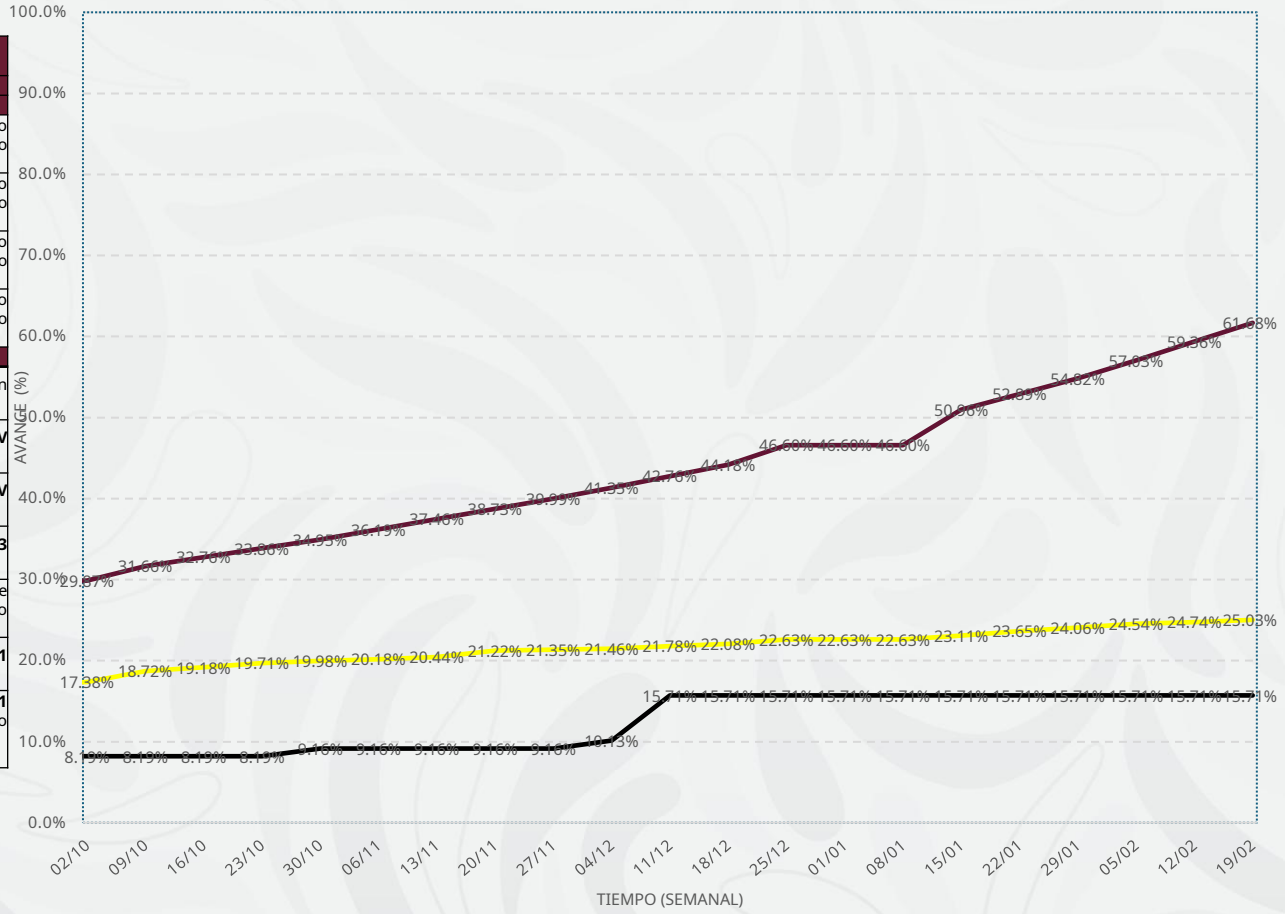

Avance Programado **Avance Físico** ***Avance Financiero**

	30 de enero al 05 de febrero	06 de febrero al 12 de febrero	13 de febrero al 19 de febrero
Fuerza de Trabajo (personas)	90	94	127
Maquinaria	21	16	18
