Michoacán

Tramo Pátzcuaro-Uruapan

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 100.00%
- Real: 99.86%
- Semanal: 0.08 %
- Financiero: 69.85%

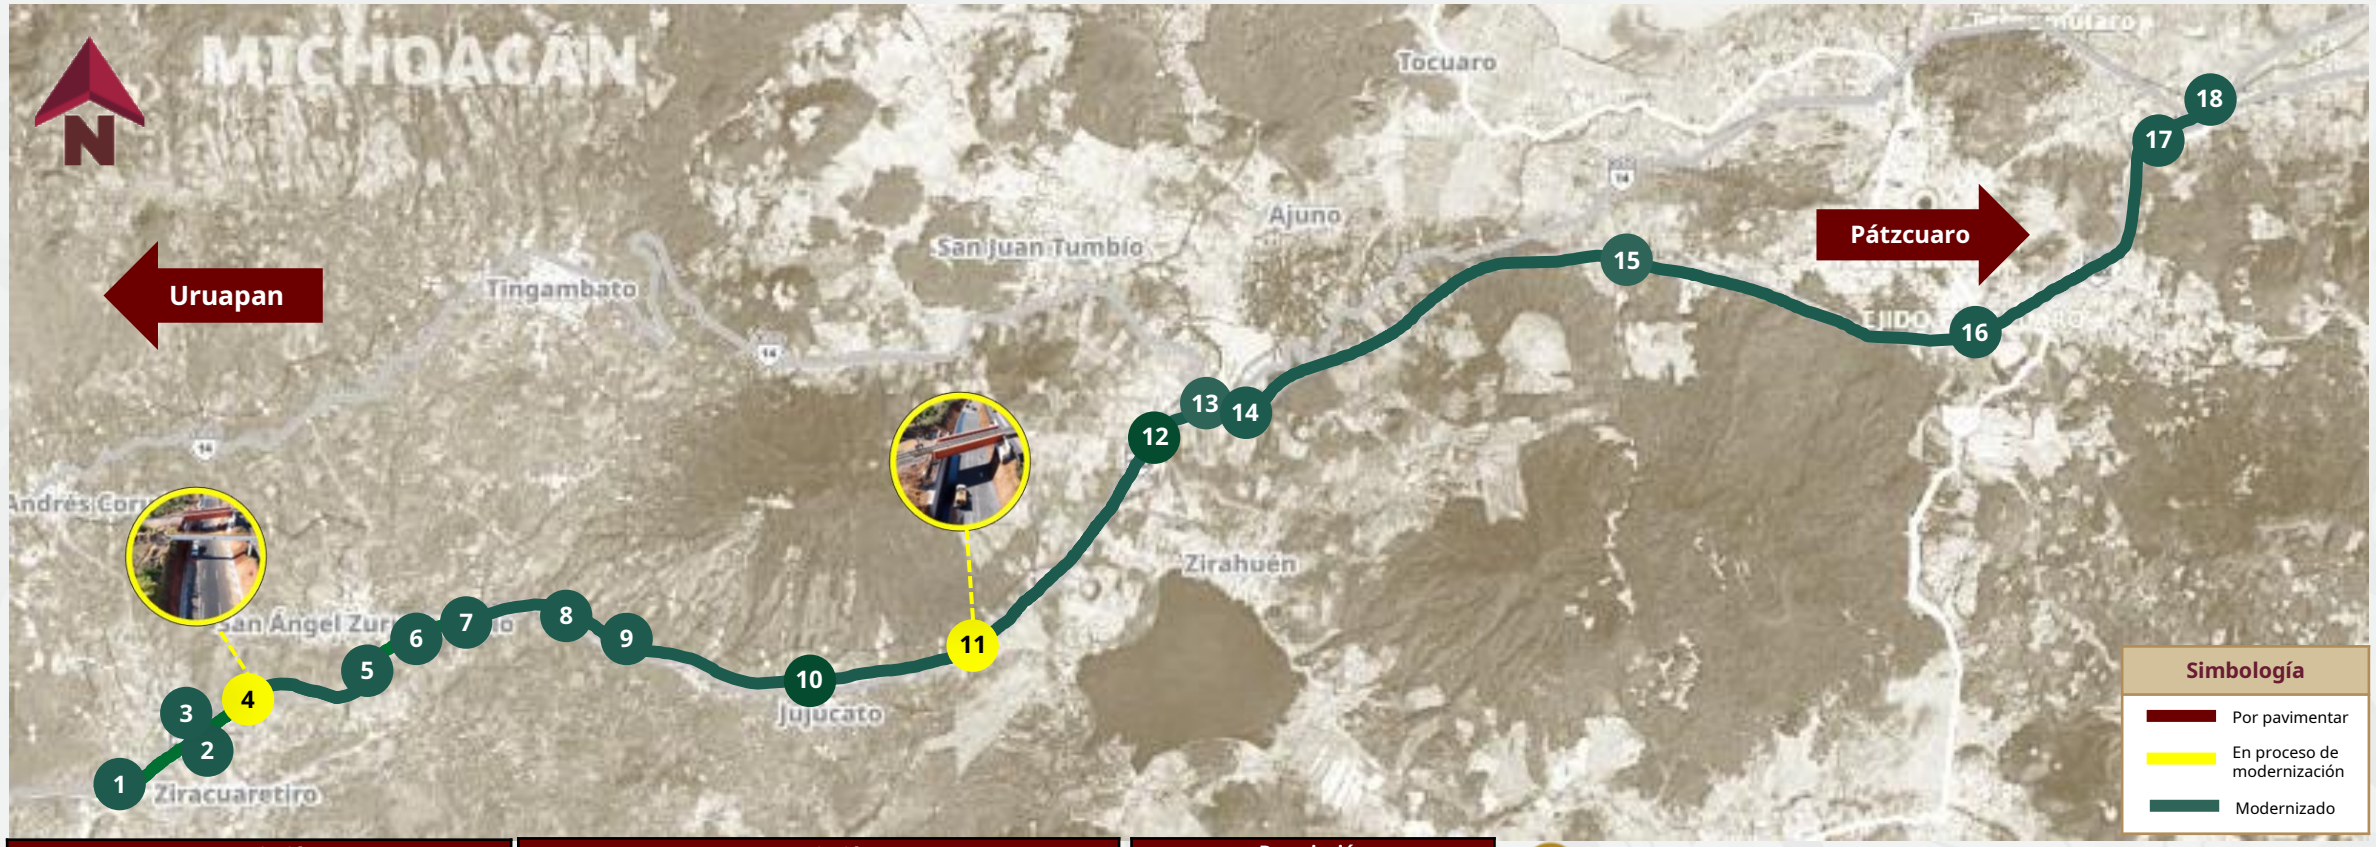

	Descripción
1	Entronque Zirimicuaro km 93+500
2	Trabe Canal km 92+210
3	Entronque Caracha km 92+100,
4	PIFFCC Caracha km 91+754, **(99.50%).**
5	Puente Canintzio km 88+283
6	PIV km 88+054,

	Descripción
7	Entronque San Ángel km 87+400
8	Rampa de emergencia II km 86+500
9	Rampa de emergencia I km 84+100
10	Entronque Jujucato km 79+489
11	PIFFCC Zirahuén km 73+584, **(98.50%)**
12	Viaducto Zirahuén km 70+278
13	Entronque Zirahuén km 68+600

	Descripción
14	Caseta de cobro remota Zirahuén 68+600
15	Plaza de cobro Zirahuén km 60+500
16	Entronque Pátzcuaro II km 53+600
17	Entronque Pátzcuaro I km 47+500
18	Entronque las trojas km 47+000

Inversión: 1,792 mdp

Inicio: Julio 2017
Término: Febrero 21, 2026

Meta: 48.47 km
46.79.00 km (troncal)
1.68 km (estructuras)
58 Totales (1 plaza de cobro,1 puente,1 viaducto, 8 entronques, 45 cruces, 2 rampas de frenado).

5,376 Empleos generados
1,792 empleos directos
3,584 empleos indirectos

200 mil habitantes beneficiados

25 minutos de ahorro en tiempo.

Concesionaría : PINFRA.

Michoacán

Tramo Pátzcuaro-Uruapan

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	12/02/2026 al 19/02/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Troncal						
PIFCC km 73+584. Pavimentos	0.100 km	0	0.100 km	0.100 km	0.100 km	Tendido de carpeta asfáltica
PIFCC km 73+584. Obra complementario	1	0	1	1	1	Construcción de cunetas laterales
PIFCC km 73+584. Obra complementario	1	0	1	1	1	Construcción de muro de mampostería en apoyo c2

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

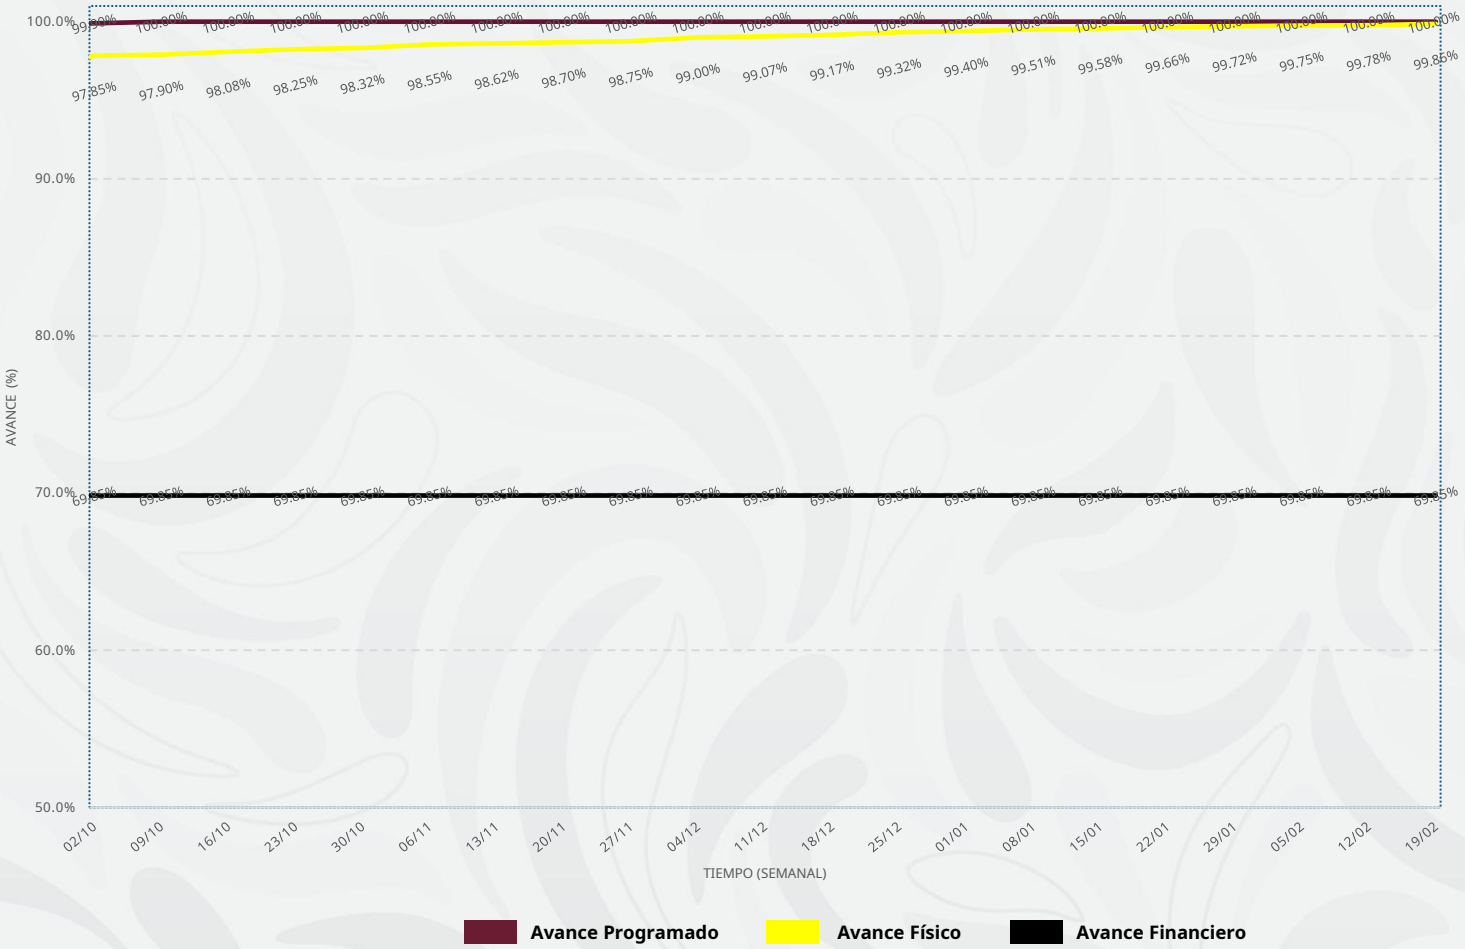

	Del 05 de febrero al 12 de febrero de 2026	Del 12 de febrero al 19 de febrero de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	80	80
Maquinaria	12	12
Frente de Trabajo	PIFFCC km 91+754 y PIFFCC km 73+584	PIFFCC km 73+584
