Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

	Descripción
1	Entronque Pomas km 9+380
2	Entronque San Vicente km 14+500
3	PIP km 18+370
4	Entronque Zinzingareo km 18+700
5	Entronque Senguio km 21+280
6	PIP km 22+280
7	Entronque Santa Rosa km 32+420
8	Entronque Ziranda-Jaripeo km 33+500
9	Puente Turundeo Km 36+460 (100.00%),
10	Entronque Turundeo I km 37+550 (100.00%),
11	Entronque Turundeo II km 38+780 (100.00%),
12	Puente Obispo Km 50+400 **(0.00%)**, Sin Iniciar

	Descripción
13	Entronque Jungapeo km 56+700 **(85.21%)**
14	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 **(69.33%)**, Sin actividad, pendiente suministro de base hidráulica en ampliación de corona.
15	Entronque Zirahuato km 62+500 **(62.01%)**
16	Entronque San Felipe I km 64+400 **(28.76%)**, Sin actividad.
17	Entronque San Felipe II Km 64+640 **(28.76%)**, Sin actividad.
18	Entronque Macutzio km 65+620 **(21.59%)**
19	Entronque Valle Verde km 67+220 **(69.04%)**, Falta tendido de carpeta asfáltica.
20	Entronque Curungueo I Km 68+240 **(73.85%)**
21	Entronque Curungueo II Km 68+780 **(73.85%)**
22	Puente San Juan Viejo Km 69+860 **(95.90%)**
23	PSV Zitácuaro Km 72+160 **(95.07%)**

Avance físico

- Programado: 57.93% (Reprogramación T8)
- Real: 61.44%
- Semanal: 0.51%
- Financiero: 8.11%

Nota 1:
Los avances se calculan en relación a la Inversión total del Ramal

Inversión: $4,575.3 mdp (total Ramal)
$3,048.81 mdp (modernización)
$1,526.49 mdp (Libramientos)

4,800 empleos generados

Meta: 71.3 Km

126,000 habitantes beneficiados

Inicio: septiembre 2020
Reinicio: 27 de ene de 2024
Término: 31 de diciembre de 2026

Ahorro en tiempo: 25 min

Concesionaria: Red de carreteras de occidente

Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 13 feb al 19 feb 26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	754,109.21	-48,551.21	0.00	3,323.69	
Terraplén (m3)	445,687.00	422,398.59	23,288.41	2,293.38	9,602.69	
Subyacente (m3)	256,097.00	259,878.01	-3,781.01	2,257.38	1,908.37	CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS EN MODIFICACIÓN DE TRAZO T9
Subrasante (m3)	170,688.00	168,758.00	1,930.00	1,249.75	1,074.88	CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS EN MODIFICACIÓN DE TRAZO T9

PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 13 feb al 19 feb 26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	119,333.83	6,325.21	521.70	853.24	
Bacheo (m3)	1,800.00	1,748.25	51.75	65.00	33.00	SE ESTÁN TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6 Y 7.
Fresado (m3)	10,676.00	10,687.10	-11.10	0.00	8.40	
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	29.05	1.19	0.00	0.14	EN PROCESO TRAMO 6
Geomalla (m2)	84,520.00	80,887.88	3,632.12	1,802.00	284.64	EN PROCESO TRAMO 6
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	119,024.61	1,389.44	1,049.47	444.42	SE ESTÁN TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	29,063.34	16,184.46	887.56	746.10	CONTINUAN TRABAJOS DE TENDIDO EN TRAMO 4 Y TRAMO 6

ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 13 feb al 19 feb 26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PIV JUNGAPEO	1.00	1.0084	0.0000	0.0000	0.0005	CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE Y CORTE DE GASA DE SALIDA
PSV SAN FELIPE	1.00	0.4110	0.5890	0.0753	0.0086	CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.9590	0.0410	0.0436	0.0194	APROCHE DE CABEZALES
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.9507	0.0493	0.0591	0.0065	CCOLOCACIÓN DE BARRERA METÁLICA
DEFENSA METÁLICA	35,327.00 ml	29,305.95 ml	6,021.05 ml	0.00 ml	806.70 ml	CONTINÚA LA COLOCACIÓN EN TRAMO 4 Y 10
BALIZAMIENTO	157,137.60 ml	78,270.95 ml	78,866.65 ml	0.00 ml	1,161.58 ml	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4 y 6
CUNETA	12,028.95 ml	10,645.53 ml	1,383.42 ml	0.00 ml	17.20 ml	CONTINÚA LA CONSTRUCCIÓN EN TRAMO 4
BOTONES	12,041.00 pza	9,239.00 pza	2,802.00 pza	0.00 pza	39.00 pza	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4.
VERTICAL BAJO	1,011.00 pza	593.00 pza	418.00 pza	0.00 pza	14.00 pza	CONTINÚA LA COLOCACIÓN EN TRAMO 4.

Zitácuaro - Maravatío

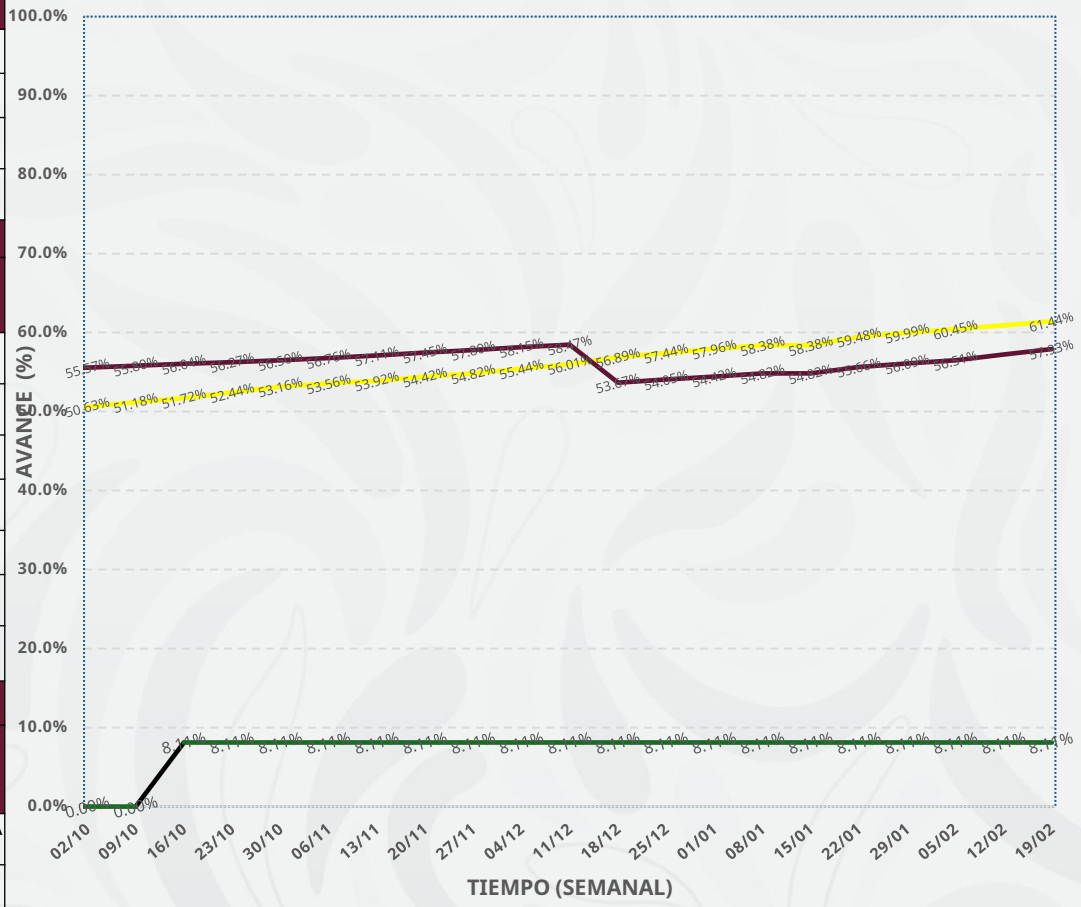

	Del 06 al 12 feb 26	Del 13 al 19 feb 26
Fuerza de Trabajo (personas)	286	287
Maquinaria	190	192
Frentes de trabajo (totales)	33	31
