Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico
- Programado: 100.00%
- Real: 41.18%
- Semanal: 0.99%
- Financiero: 35.25%

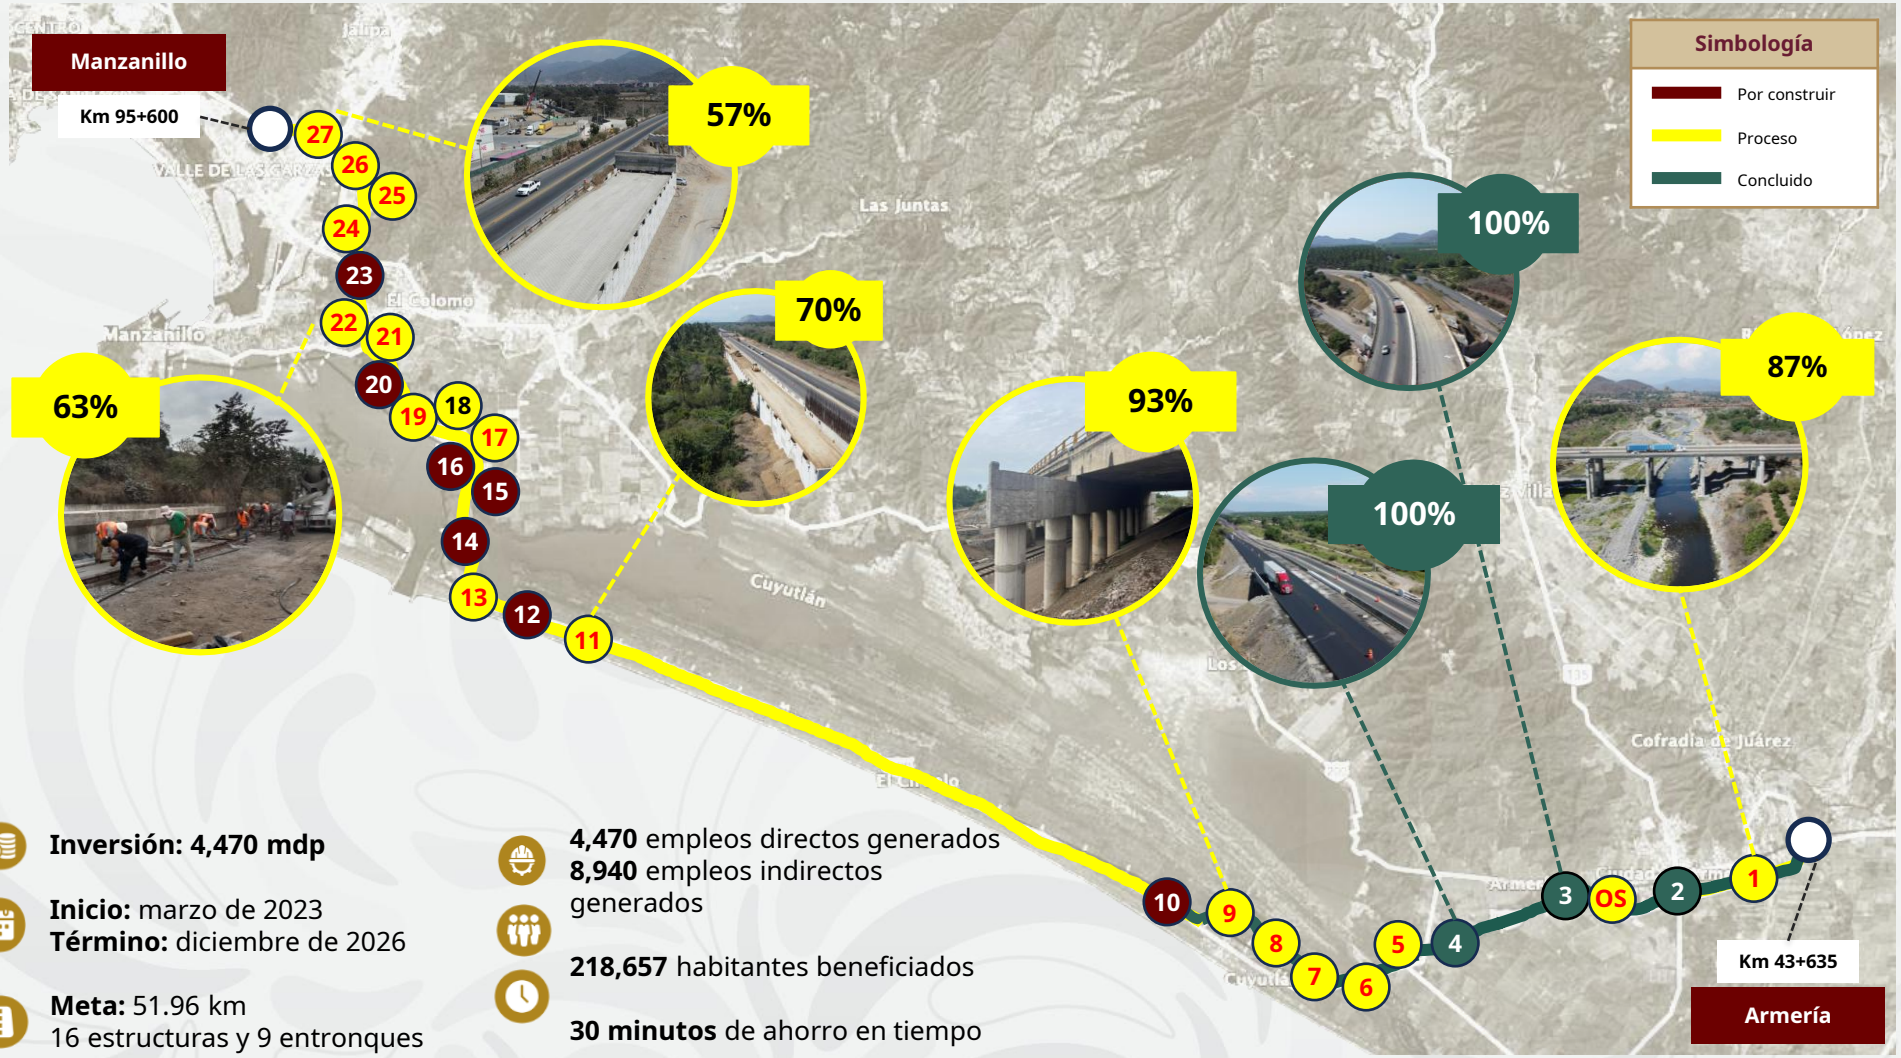

	Descripción
1	Puente Armería I km 45+500 **(87%)** No se ejecutan trabajos por falta de personal y maquinaria.
2	Entronque Paraíso km 47+741 **(100%)**
3	PSFFCC Armería II km 50+100 **(100%)**
4	PSV Tilapia km 54+350 **(100%)**
5	Puente Palo Verde I km 55+950 **(86%)** Se movió la fuerza de trabajo
6	Puente Palo Verde II km 56+650 **(75%)** Se movió la fuerza de trabajo
7	PIV Ent. Salinero II km 59+500 **(83%)** El trabajo programado para esta semana, está concluido.
8	Entronque Salineros km 59+551 **(27%)** Sin trabajos programados
9	PSFFCC Salinero I km 60+500 **(93%)** Sin trabajos programados
10	Entronque Cuyutlán km 60+800 (A la espera de regularización de catálogo)
11	PIV Retorno en U km 77+600 **(71%)** Sin trabajos programados
12	Entronque Retorno en U km 77+600 (A la espera de regularización de catálogo)
13	PSFFCC Tepalcates I km 80+240**(52.5%)**
14	Entronque Tepalcates I km 79+660 (A la espera de regularización de catálogo)
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+581
16	Entronque Tepalcates II km 80+500
17	Entronque 83+500 km **(42%)** No se tiene Fuerza de Trabajo Suficiente
18	Puente Adjuntas km 86+420 **(86%)**
19	PSV Panteones km 87+760 **(21%)** No se ha comenzado en ésta estructura por logística de perforación.
20	Entronque Panteones km 87+760
21	PIV Minatitlán Lib. km 92+000 **(4%)** Se detuvieron trabajos por interferencia con instalaciones de CFE.
22	PIV Minatitlán Lib. II km 92+000 **(63%)** Se movió la fuerza de trabajo
23	Entronque Minatitlán km 92+731
24	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 **(16%)** No hay trabajos por logística de perforación.
25	Puente Canal km 93+220 **(54%)** Se realizó cambio de tránsito a Cuerpo Derecho
26	Entronque Jalipa km 94+400 **(24%)** Se movió la fuerza de trabajo
27	Puente Jalipa km 94+158 **(60%)**
OS	PSV Obra social retorno en U 49+900 **(96%)**

Inversión: 4,470 mdp

Inicio: marzo de 2023
Término: diciembre de 2026

Meta: 51.96 km
16 estructuras y 9 entronques

4,470 empleos directos generados
8,940 empleos indirectos generados

218,657 habitantes beneficiados

30 minutos de ahorro en tiempo

Concesionaria: PINFRA

Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	27/02/26 al 05/03/26 Programado	27/02/26 al 05/03/26 Ejecutado	Observaciones
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m^3)	210,113	282,985	0	0	3,122	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m^3)	813,909	561,069	252,840	0	2,400	
Base y sub base (m^3)	260,119	183,470	76,649	0	1,379	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente.
El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

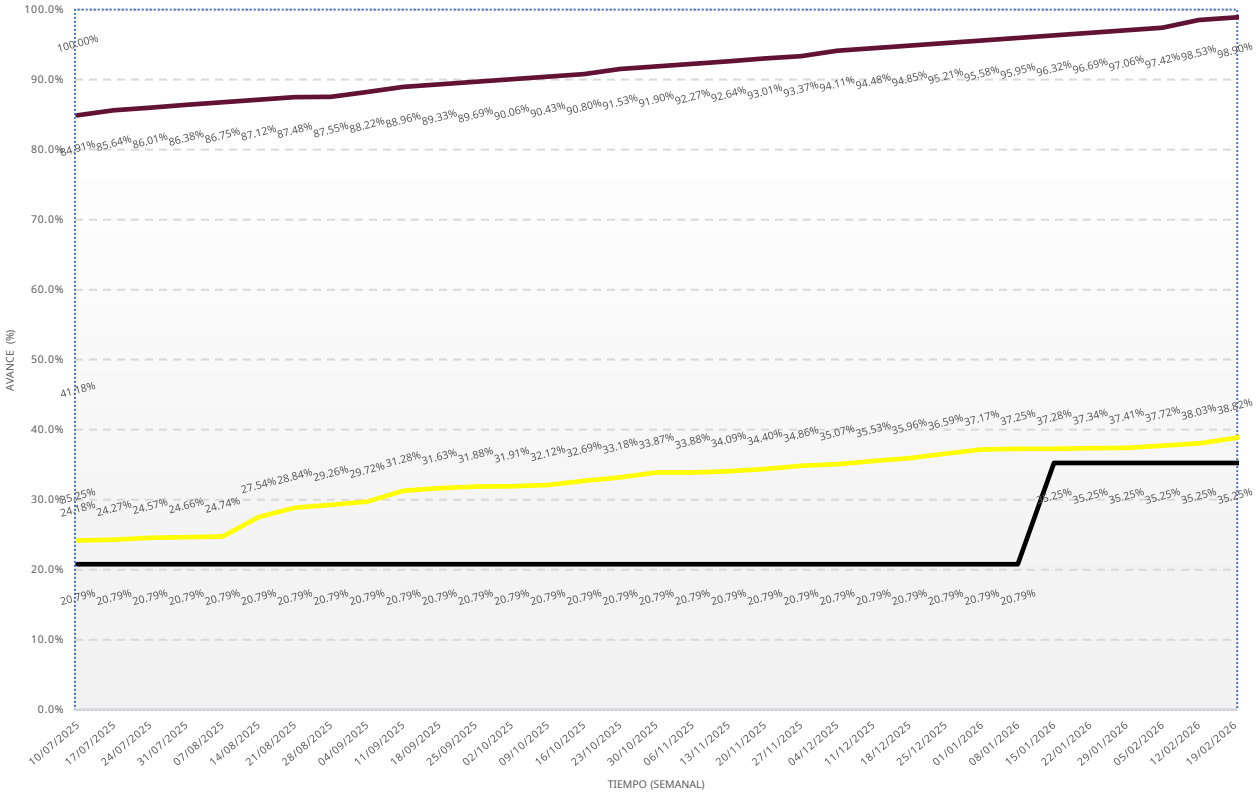

	20 de febrero al 26 de febrero de 2026	27 de febrero al 05 de marzo de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	75	83
Maquinaria	41	43
Frente de trabajo	Del Km 49+700 al Km 49+900 Del Km 56+140 al Km 57+938 Del Km 75+450 al Km 77+000	Del Km 49+680 al Km 49+850 Del Km 56+140 al Km 58+765 Del Km 77+000 al Km 76+050 Del Km 92+440 al Km 92+620
