# Jalisco

## Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

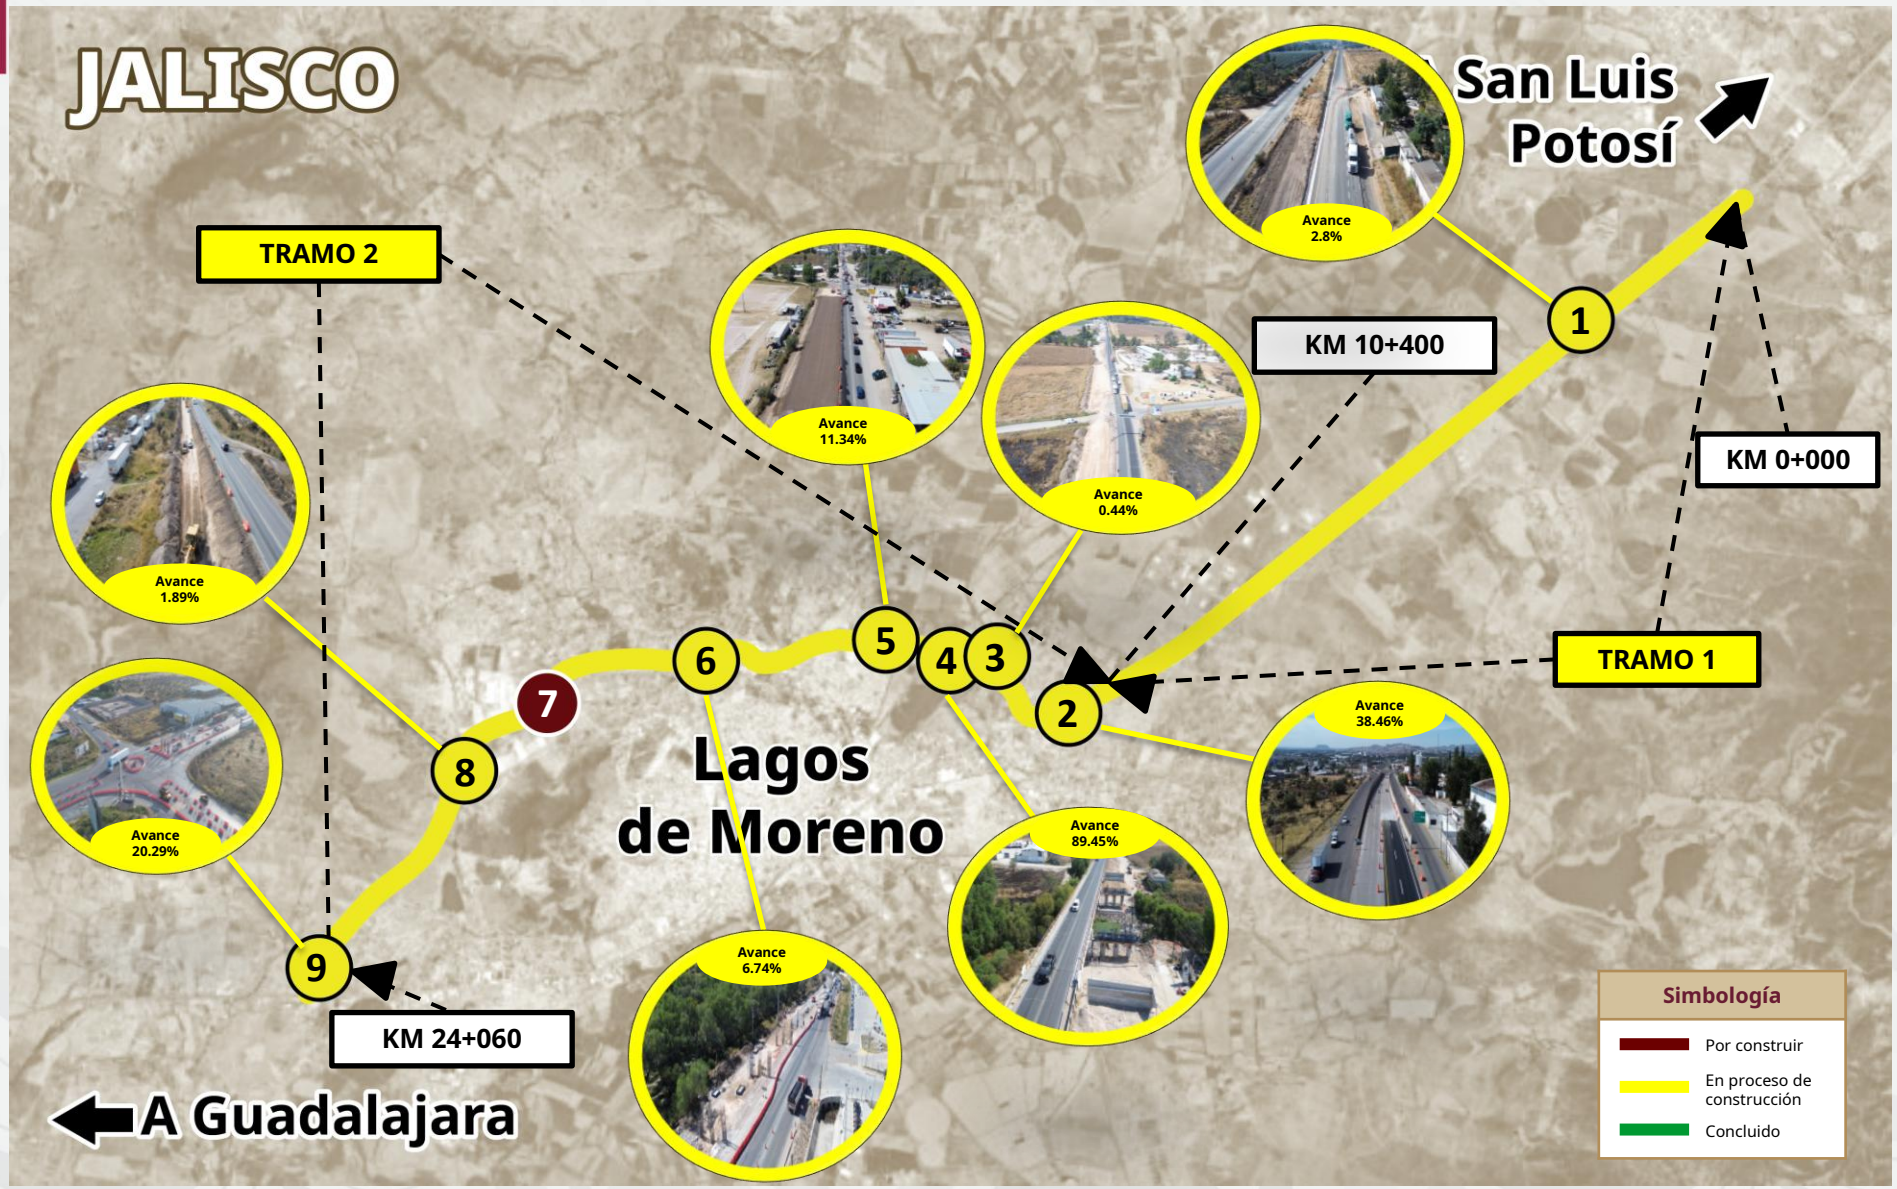


| | Descripción |
|---|---|
| 1 | PIV con entronque "El Maguey" km 1+300 - **Avance 2.8%.** Problemas de DDV. (Modificación de proyecto). |
| 2 | Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este km 11+800 (adecuación)- **Avance 38.46%** |
| 3 | PIV con entronque "Fracc. Andalucía" km 12+120 **Avance 0.44%.** |
| 4 | Puente km 12+450 "Rio Lagos"- **Avance 89.45%.** |
| 5 | PIV con entronque "Sepúlveda" km 13+620 **Avance 11.34%.** |
| 6 | PSV con entronque "DRÄXLMAIER" km 15+900 **Avance 6.74%** |
| 7 | PIV con entronque "Encarnación" km 18+200 |
| 8 | PSFC con retornos km 19+860 **Avance 1.89%** |
| 9 | PIV con entronque Tipo Glorieta "Lagos de Moreno Oeste" km 23+920 **Avance 20.29% .** |

### Avance físico general

- Real: 50.85%
- Programado: 50.05%
- Semanal: 0.17%
- Financiero: 31.38%

**Inversión: 2,720.20 mdp (C/IVA)**

**Inicio:** enero 2020
**Término:** diciembre 2027

**Meta:** 25 km

**2,345** empleos directos
**4,690** empleos indirectos

**250,000** habitantes beneficiados

**20 minutos** de ahorro en tiempo

# Jalisco

## Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

| TRAMO 2 - AVANCE TRONCAL Y ENTRONQUES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Unidad | Total | Ejecutado | Faltante | 27/02/26 al 05/03/26 | | Observaciones |
| | | | | | Programado | Ejecutado | |
| Terracerías Troncal | % | 100% | 45.87% | 54.13% | 0.014 | 1.25% | En proceso |
| Obras Inducidas | % | 100% | 3.52% | 96.48% | 0.00 | 0.33% | En proceso |
| Entronque 12+120 | % | 100% | 0.44% | 99.56% | 0.00 | 0.02% | En proceso |
| Puente 12+450 | % | 100% | 89.45% | 10.55% | 0.00 | 2.33% | En proceso |
| PSFC Km 19+860 con retornos | % | 100% | 1.89% | 98.11% | 0.00 | 0.08% | En proceso |
| Entronque 23+920 | % | 100% | 20.29% | 79.71% | 0.00 | 1.24% | En proceso |

### Descripción de la obra

Ampliación y modernización del Libramiento Lagos de Moreno de 25 km. 11.0 km a 21.0 m de ancho de corona pasando de una A2 a A4S; y 14.0 km a 19.0 m de ancho de corona tipo A4; ESTRUCTURA DE PAVIMENTO: Subrasante de 30 cms., de espesor, Base Hidráulica de 20 cms., de espesor, Base Asfáltica de 15 cms., de espesor y carpeta asfáltica de 6 cms., de espesor, Con un TDPA de 16,551 Veh/dia ESTRUCTURAS: 1 Retorno a Nivel, : 4 entronques a desnivel con PIV, 2 pasos Inferiores vehiculares (PIV), 1 Paso Superior Vehicular (PSV), 1 Puente, 1 Paso Superior Ferrocarril (PSFC), y 3 pasos Inferiores Peatonales con rampa (PIPR); Obras de drenaje, señalamiento Horizontal, Vertical y obras complementarias ( cunetas, bordillos y lavaderos)

**Avance: Programado, Físico y Financiero (%)**

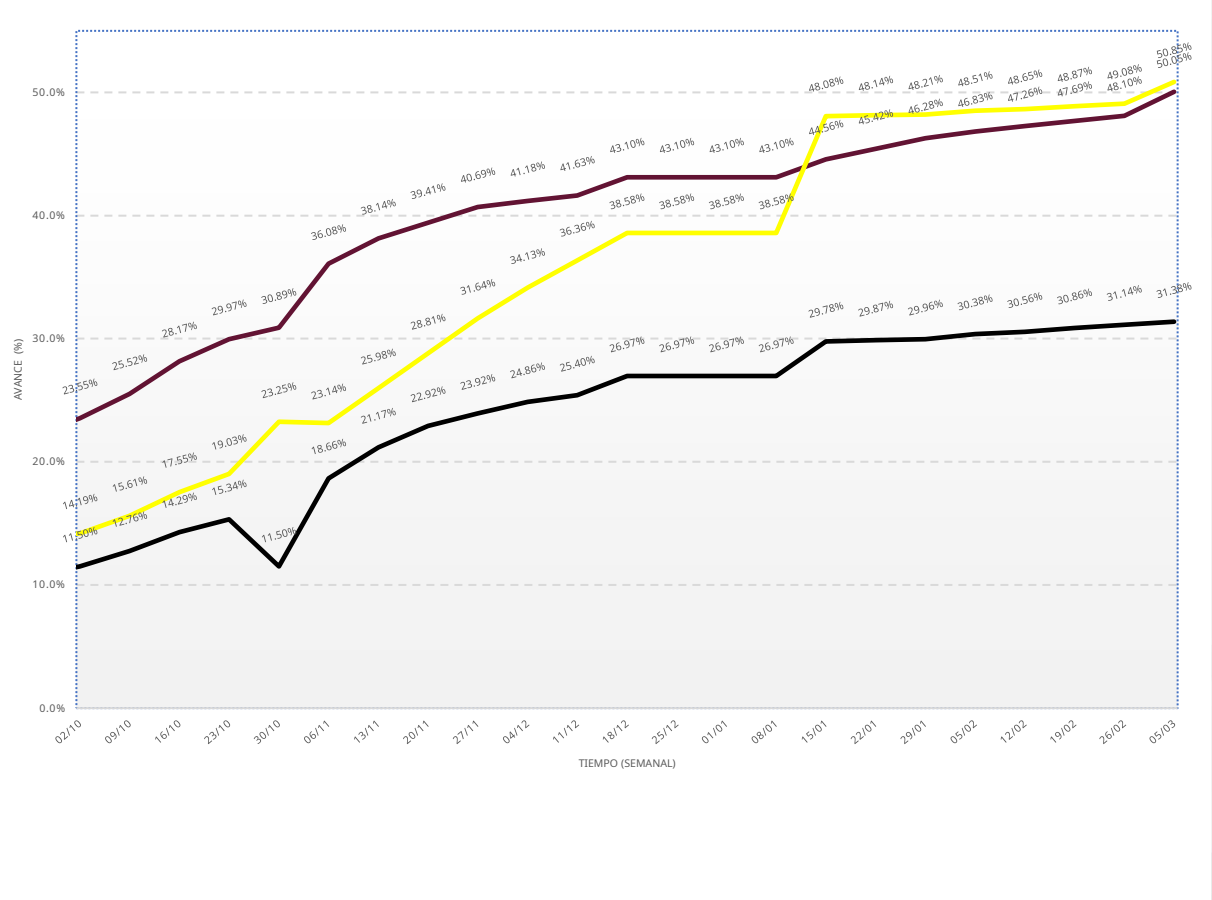


| | 20 al 26 de febrero 2026 | 27 febrero al 05 marzo 2026 |
|---|---|---|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 246 | 246 |
| Maquinaria | 69 | 69 |
| Fuerza de Trabajo | Puente km 12+450<br>PIV km 13+620<br>PSV km 15+900<br>PIV km 23+920 | Puente km 12+450<br>PIV km 13+620<br>PSV km 15+900<br>PIV km 23+920 |
