Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico Global:
- Programado: 100%
- Real: 99.14%
- Semanal: 0.00%

Avance físico Tramo 2:
- Real: 97.42%

Avance financiero
- Real pagado: 88.56%
- Con deuda: 97.42%
- Nota: De este porcentaje se tiene una deuda de 2,635.1 mdp incluye IVA, por trabajos ejecutados.

	Descripción
1	PIV km 87+900. **40% ***
2	PIP km 91+530. **100%**
3	PIPR km 92+436. **100%**
4	PIV km 92+438. **100%**
5	PIP km 92+680. **0% ***
6	Entronque Llano Crucero km 92+690. **82% ***
7	Muro de pilas km 92+700. **32% ***

	Descripción
8	Entronque Llano Laguna km 98+200. **100%**
9	Entronque Cerro Pascle km 100+500. **100%**
10	PIP km 106+570. **100%**
11	PIP km 108+570. **100%**
12	PIV km 109+247. **100%**
13	PIV km 110+460. **100%**
14	Entronque Danigare km 111+600. **100%**

	Descripción
15	PIP km 112+270. **100%**
16	PIV km 114+766. **100%**
17	Entronque Agua Blanca Km 122+600. **100%**
18	Entronque Quiavicuzas Km 137+900. **100%**
19	Túnel El Tornillo km 139+400 (Colapsado). En elaboración proyecto del puente.
20	PIPG Km 146+840. **95% ***
21	PIPG km159+400. **95% ***

*** No hay avances debido a la falta de asignación de recursos**

Inversión: 29,749.2 mdp incluye I.V.A sin incluir reclamos

Término: Inaugurada y puesta en operación 24 de enero de 2025 (pendiente obras complementarias)

Meta:169.23 km; el cual son 159.29 km de Troncal, 6.54 km de puentes, 1.78 km de viaductos y 1.62 km de túneles.

65 puentes, 14 viaductos, 10 túneles, 20 entronques, 2 casetas y 17 pasos de servidumbre.

En proceso: Trabajos en la troncal, 1 entronque y 8 pasos de servidumbre

- **Nota: De los pasos de servidumbre 9 están terminados, 2 con un 95%, 1 al 40% y 5 sin iniciar**
- **El Túnel Tornillo se encuentra colapsado y en proceso proyecto del puente**

10 Empleos directos generados
30 Empleos indirectos generados

+1 millón 400 mil habitantes beneficiados

2 hrs. de ahorro en tiempo

Concesionaria: Autovía Mitla Tehuantepec, S.A. de C.V. (IDEAL)

Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	27/02/26 al 05/03/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Muro de pilas km 92+700						
Perforación de pilastrones	38	17	21	0	0	• Trabajos suspendidos por falta de asignación de recursos.
Armado y colado de pilastrones	38	17	21	0	0	

❖ Nota: A partir de esta fecha, ya no existirán avances debido a la considerable deuda que se tiene con las empresas contratadas por la concesionaria a la fecha y la falta de recursos presupuestales.

Maquinaria:

- Excavadora (1) inactivo

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Mitla - Tehuantepec

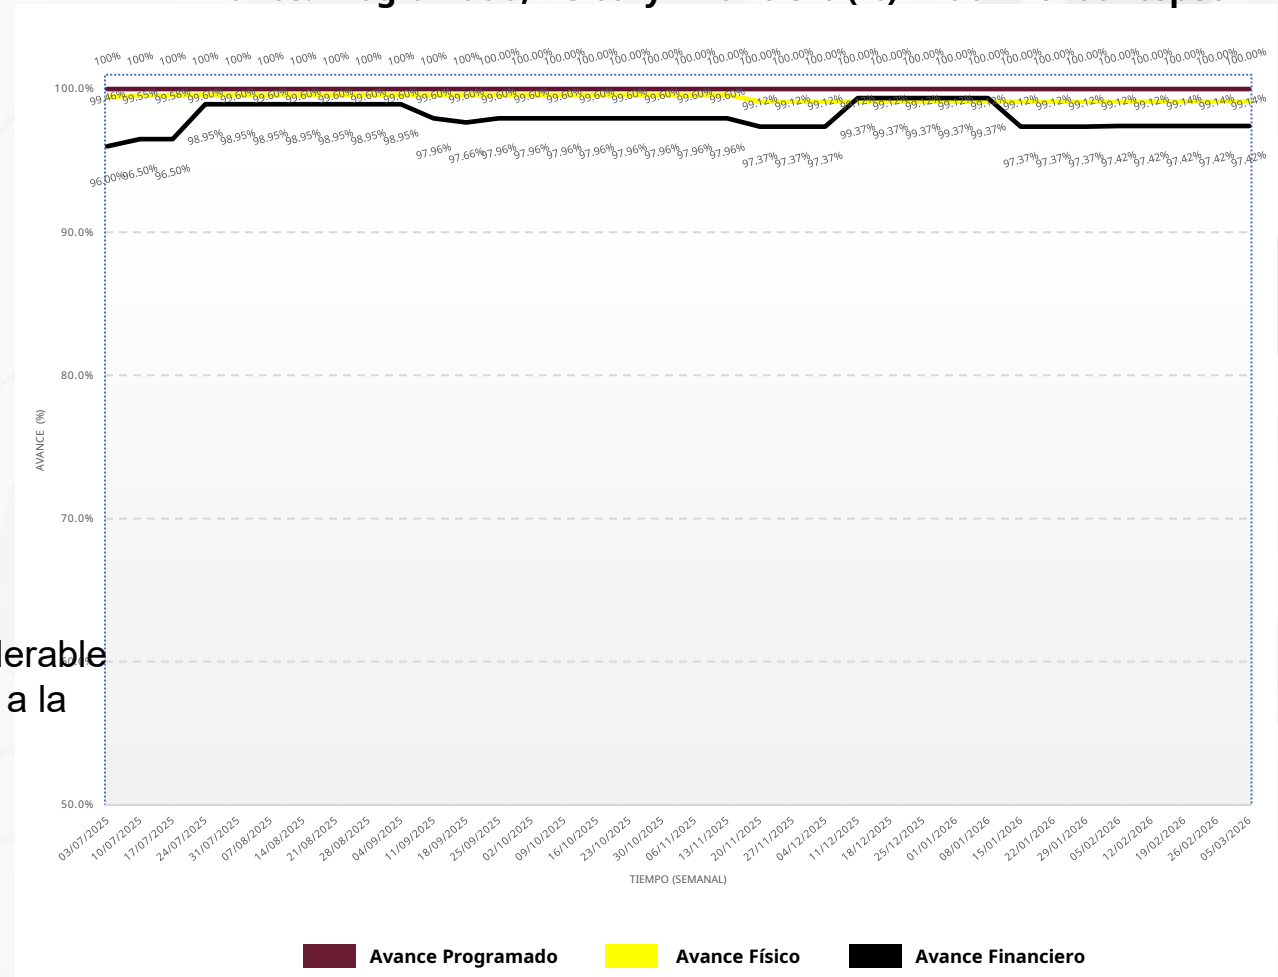

	20 de febrero al 26 de febrero de 2026	27 de febrero al 05 de marzo de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	10	10
Maquinaria	0	0
Frente de Trabajo	No Aplica	No Aplica
