Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

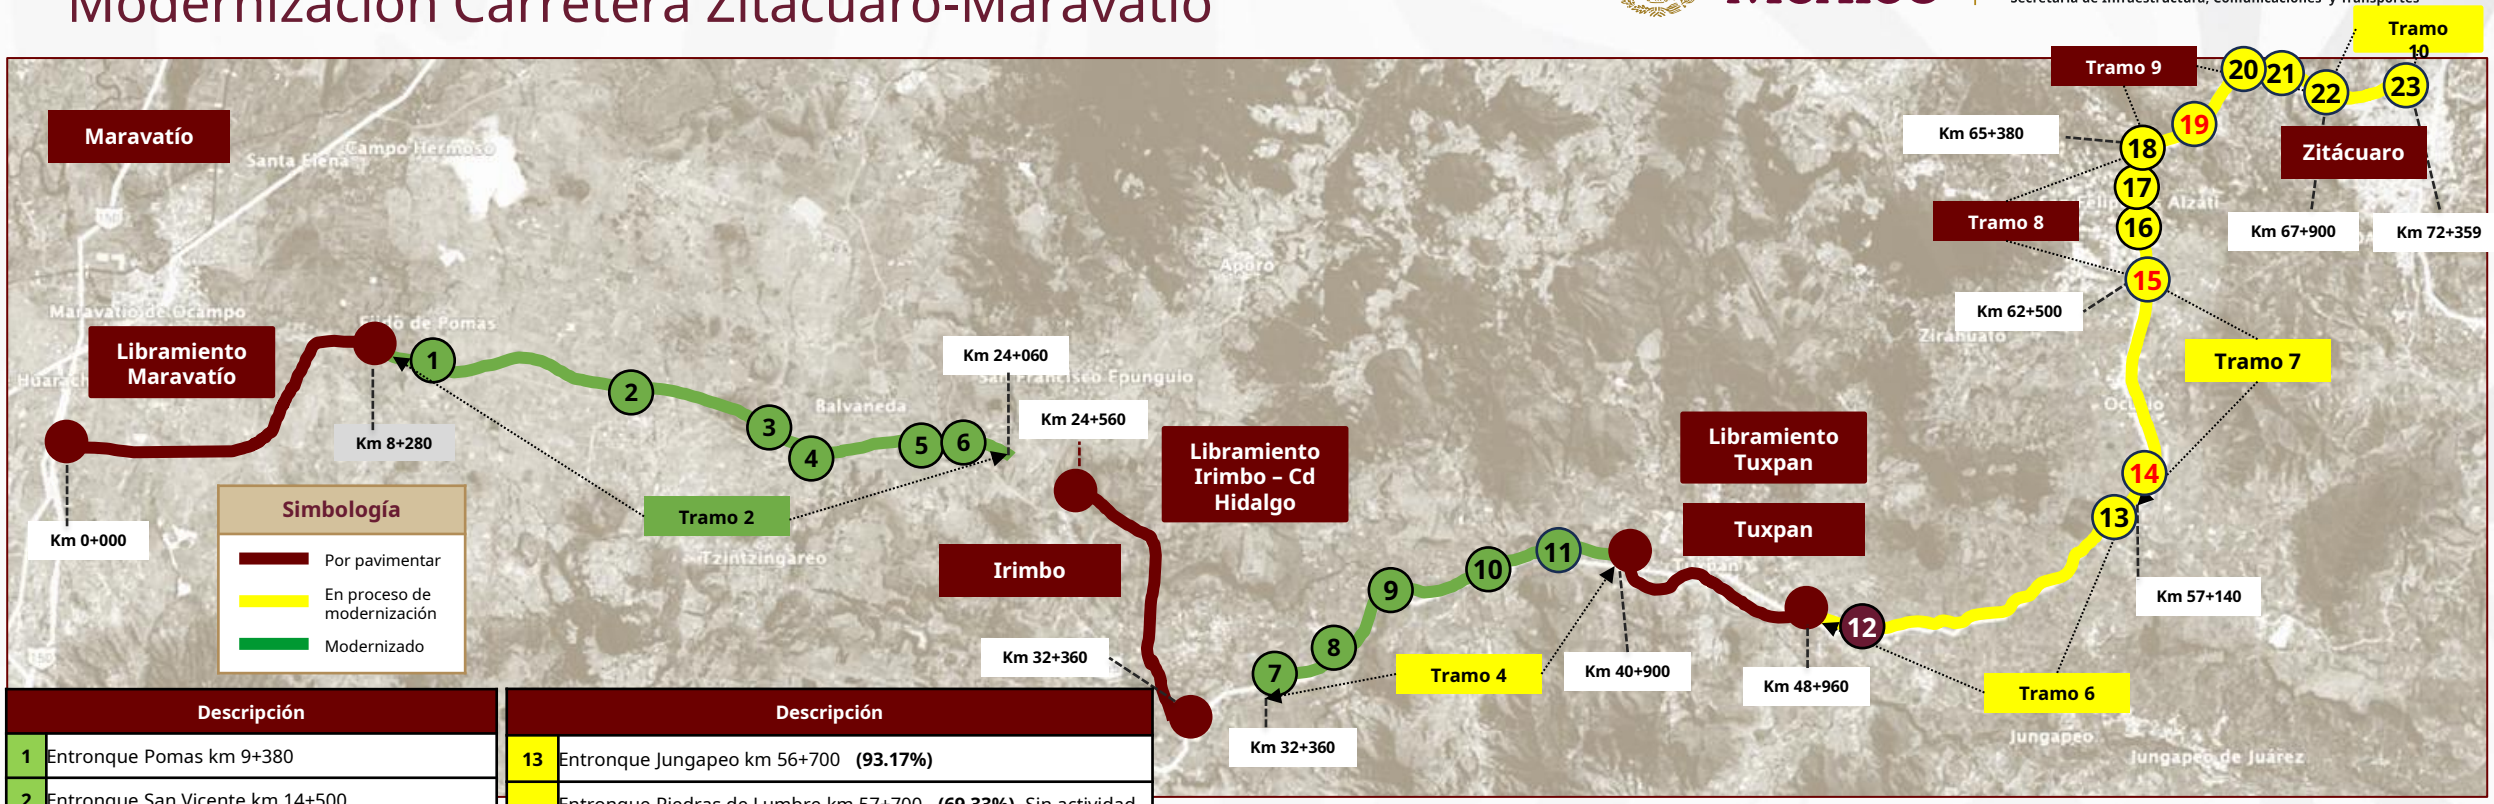

	Descripción
1	Entronque Pomas km 9+380
2	Entronque San Vicente km 14+500
3	PIP km 18+370
4	Entronque Zinzingareo km 18+700
5	Entronque Senguio km 21+280
6	PIP km 22+280
7	Entronque Santa Rosa km 32+420
8	Entronque Ziranda-Jaripeo km 33+500
9	Puente Turundeo Km 36+460 **(100.00%),**
10	Entronque Turundeo I km 37+550 **(100.00%),**
11	Entronque Turundeo II km 38+780 **(100.00%),**
12	Puente Obispo Km 50+400 **(0.00%)**, Sin Iniciar

	Descripción
13	Entronque Jungapeo km 56+700 **(93.17%)**
14	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 **(69.33%)**, Sin actividad, pendiente suministro de base hidráulica en ampliación de corona.
15	Entronque Zirahuato km 62+500 **(62.01%)**, Pendiente tendido de base asfáltica en ampliaciones de corona
16	Entronque San Felipe I km 64+400 **(30.50%)**
17	Entronque San Felipe II Km 64+640 **(30.50%)**
18	Entronque Macutzio km 65+620 **(23.47%)**
19	Entronque Valle Verde km 67+220 **(71.96%)**, Falta tendido de carpeta asfáltica.
20	Entronque Curungueo I Km 68+240 **(74.72%)**
21	Entronque Curungueo II Km 68+780 **(74.72%)**
22	Puente San Juan Viejo Km 69+860 **(96.38%)**
23	PSV Zitácuaro Km 72+160 **(95.42%)**

Avance físico

- Programado: 59.36% (Reprogramación T8)
- Real: 62.17%
- Semanal: 0.32%
- Financiero: 17.56%

Nota 1:
Los avances se calculan en relación a la Inversión total del Ramal

Nota 2:
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal, o no han iniciado.

Inversión: $4,575.3 mdp (total Ramal)
$3,048.81 mdp (modernización)
$1,526.49 mdp (Libramientos)

Meta: 71.3 Km

Inicio: septiembre 2020
Reinicio: 27 de enero de 2024
Término: 31 de diciembre de 2026

4,800 empleos generados

126,000 habitantes beneficiados

Ahorro en tiempo: 25 min

Concesionaria: Red de carreteras de occidente

Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Zitácuaro - Maravatío

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 27 feb al 05 mar 26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	762,076.94	-56,518.94	0.00	7,967.73	
Terraplén (m3)	445,687.00	433,922.70	11,764.30	4,586.75	11,524.12	
Subyacente (m3)	256,097.00	262,754.31	-6,657.31	4,514.75	2,876.30	CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS EN MODIFICACIÓN DE TRAZO T9 Y RECTIFICACIÓN DE TRAZO EN T6
Subrasante (m3)	170,688.00	170,561.95	126.05	2,499.50	1,803.95	CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS EN MODIFICACIÓN DE TRAZO T9 Y RECTIFICACIÓN DE TRAZO EN T6

PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 27 feb al 05 mar 26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	120,476.96	5,182.08	1,043.40	1,143.13	
Bacheo (m3)	1,800.00	1,812.75	-12.75	130.00	64.50	SE ESTÁN TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6 Y 7.
Fresado (m3)	10,676.00	10,704.61	-28.61	0.00	17.51	
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	29.16	1.08	0.00	0.12	EN PROCESO TRAMO 6
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	119,501.04	913.01	2,098.95	476.43	SE ESTÁN TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	30,227.56	15,020.24	1,775.13	1,164.22	CONTINUAN TRABAJOS DE TENDIDO EN TRAMO 4 Y TRAMO 6

ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 27 feb al 05 mar 26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PIV JUNGAPEO	1.00	1.0086	0.0000	0.0000	0.0002	CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN GASA SALIDA
PSV SAN FELIPE	1.00	0.4459	0.5541	0.1506	0.0349	CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.9638	0.0362	0.0872	0.0048	APROCHE DE CABEZALES
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.9542	0.0458	0.1182	0.0036	ARMADO, CIMBRADO Y COLADO DE GURANICIONES DE REMATE DE MURO.

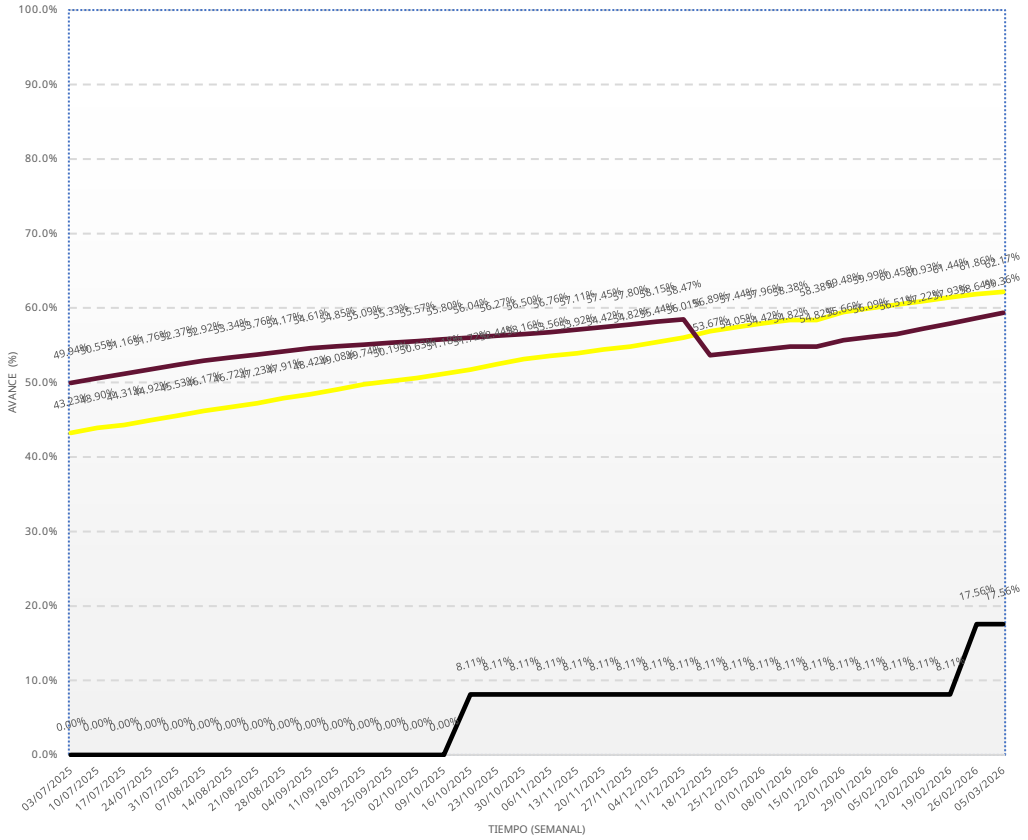

Avance Programado **Avance Físico** ***Avance Financiero**

	20 de febrero al 26 de febrero	27 de febrero al 05 de marzo
Fuerza de Trabajo (personas)	285	291
Maquinaria	183	192
Frentes de trabajo (totales)	31	29
