Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 99.63%
- Real: 40.19%
- Semanal: 0.22%
- Financiero: 35.25%

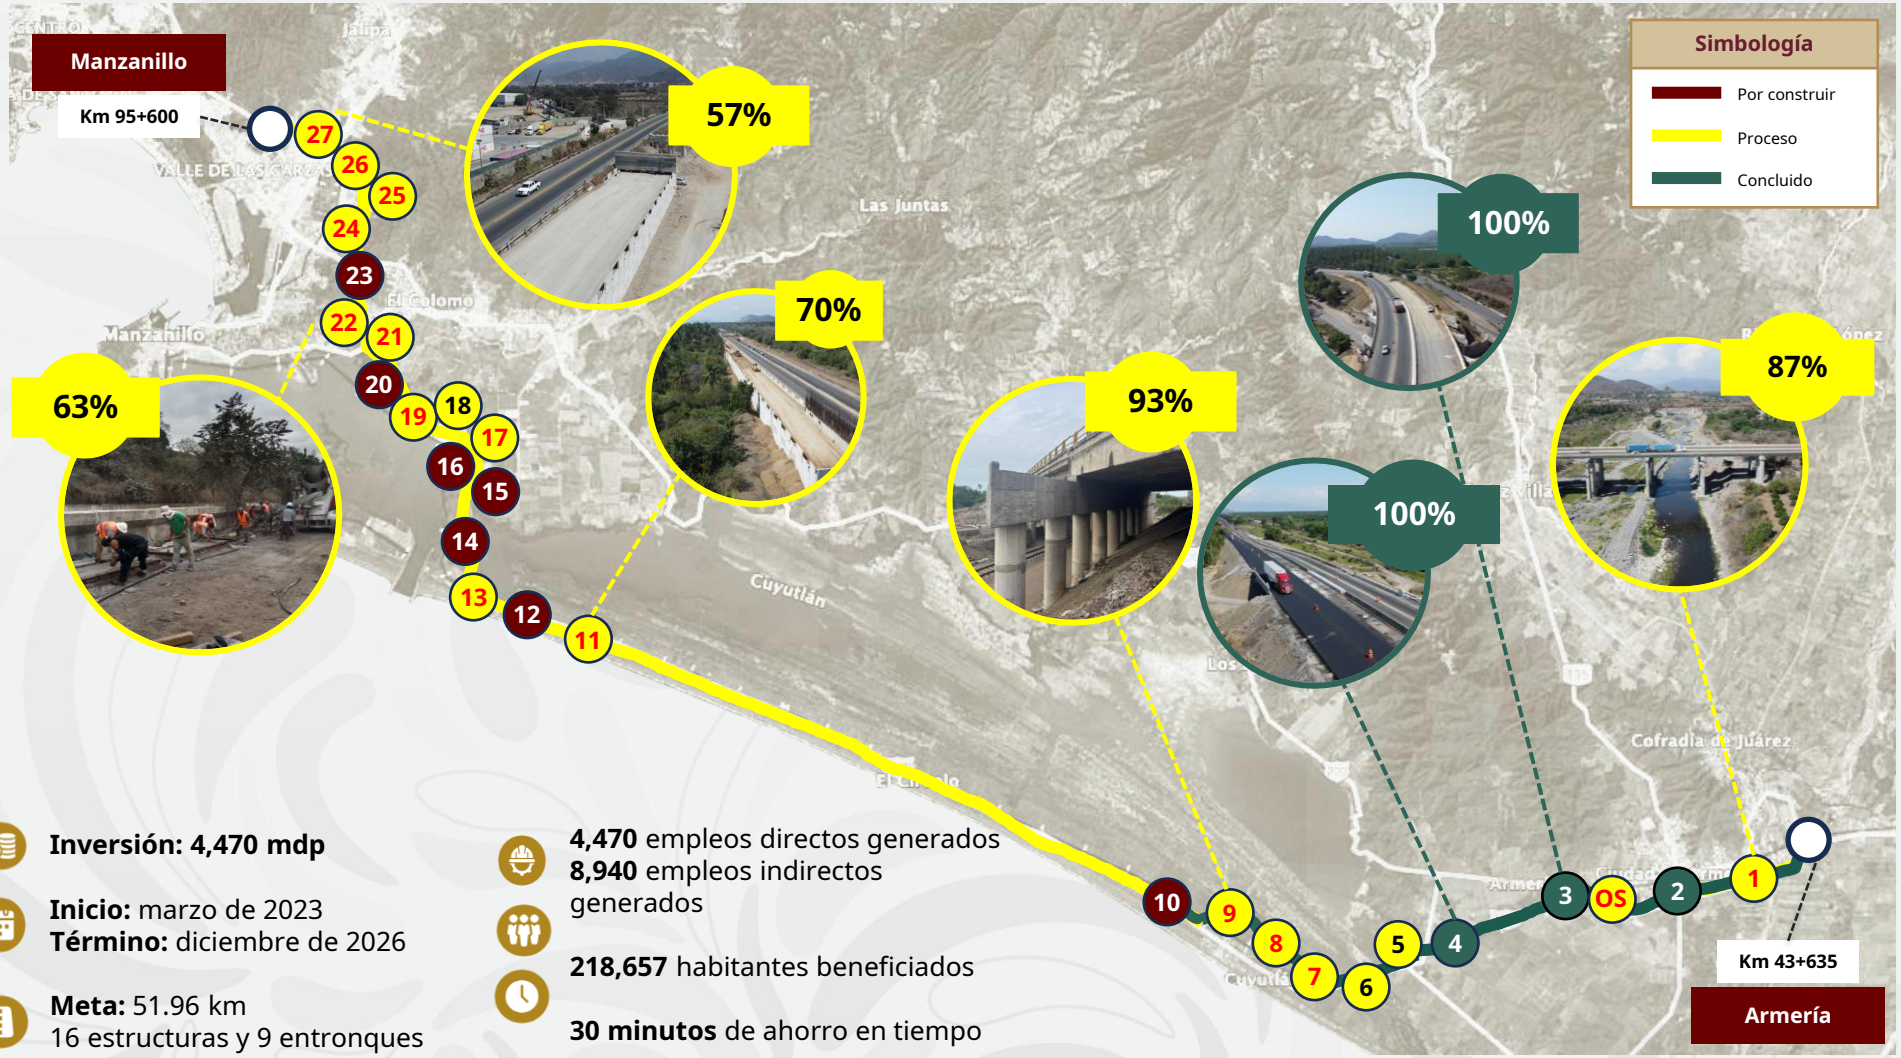

	Descripción
1	Puente Armería I km 45+500 **(87%)** No se ejecutan trabajos por falta de personal y maquinaria.
2	Entronque Paraíso km 47+741 **(100%)**
3	PSFFCC Armería II km 50+100 **(100%)**
4	PSV Tilapia km 54+350 **(100%)**
5	Puente Palo Verde I km 55+950 **(86%)**
6	Puente Palo Verde II km 56+650 **(75%)**
7	PIV Ent. Salinero II km 59+500 **(83%)** El trabajo programado para esta semana, está concluido.
8	Entronque Salineros km 59+551 **(27%)** Sin trabajos programados
9	PSFFCC Salinero I km 60+500 **(93%)** Sin trabajos programados
10	Entronque Cuyutlán km 60+800 (A la espera de regularización de catálogo)
11	PIV Retorno en U km 77+600 **(71%)** Sin trabajos programados
12	Entronque Retorno en U km 77+600 (A la espera de regularización de catálogo)
13	PSFFCC Tepalcates I km 80+240**(52.5%)**
14	Entronque Tepalcates I km 79+660 (A la espera de regularización de catálogo)
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+581
16	Entronque Tepalcates II km 80+500
17	Entronque 83+500 km **(42%)** No se tiene Fuerza de Trabajo Suficiente
18	Puente Adjuntas km 86+420**(79%)**
19	PSV Panteones km 87+760 **(21%)** No se ha comenzado en ésta estructura por logística de perforación.
20	Entronque Panteones km 87+760
21	PIV Minatitlán Lib. km 92+000 **(4%)** Se detuvieron trabajos por interferencia con instalaciones de CFE.
22	PIV Minatitlán Lib. II km 92+000 **(63%)** Se movió la fuerza de trabajo
23	Entronque Minatitlán km 92+731
24	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 **(16%)** No hay trabajos por logística de perforación.
25	Puente Canal km 93+220 **(54%)** Se realizó cambio de tránsito a Cuerpo Derecho
26	Entronque Jalipa km 94+400 **(24%)** Se movió la fuerza de trabajo
27	Puente Jalipa km 94+158 **(58%)**
OS	PSV Obra social retorno en U 49+900 **(96%)** Se movió la fuerza de trabajo

Inversión: 4,470 mdp

Inicio: marzo de 2023
Término: diciembre de 2026

Meta: 51.96 km
16 estructuras y 9 entronques

4,470 empleos directos generados
8,940 empleos indirectos generados

218,657 habitantes beneficiados

30 minutos de ahorro en tiempo

Concesionaria: PINFRA

Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	20/02/26 al 26/02/26 Programado	20/02/26 al 26/02/26 Ejecutado	Observaciones
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m^3)	210,113	280,585	0	0	2,400	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m^3)	813,909	558,477	255,432	0	2,592	
Base y sub base (m^3)	260,119	182,820	77,299	0	650	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente.
El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

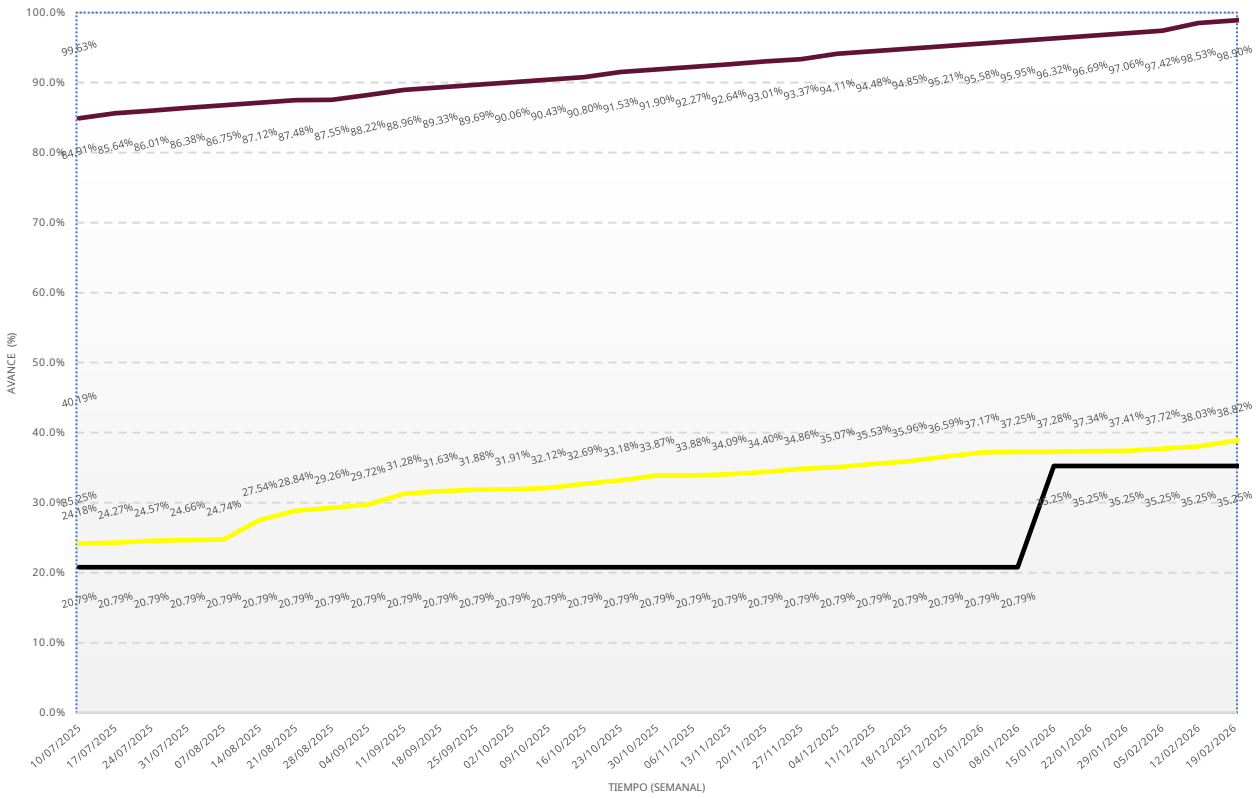

	13 de enero al 19 de febrero	20 de enero al 26 de febrero
Fuerza de Trabajo (personas)	137	75
Maquinaria	74	41
Frente de trabajo	Del Km 30+320 al km 30+380 Del Km 50+220 al Km 50+380 Del Km 66+520 al km 73+520 Del Km 74+980 al Km 76+420	Del Km 49+700 al Km 49+900 Del Km 56+140 al Km 57+938 Del Km 75+450 al Km 77+000
