San Luis Potosí

La Pitahaya-Libramiento Oriente de S.L.P. y El Ramal Villa de Reyes

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico
- Programado: **4.05%**
- Real: **2.85%**

Avance financiero: **3.22%**

Inversión: 8,331.12 mdp.
Incluye I.V.A.

Inicio: 14 de agosto 2025
Término: 14 de febrero 2028

Meta: 68.5 km. + 2.4 Km del Ramal
79 Estructuras; Puentes, PSV´S, PSFCC, PIV´S.
1 Plaza de Cobro, 5 Entronques, 165 ODT´S.
Concesionaria: META

2000 Empleos directos generados
600 Empleos indirectos generados

128 000 habitantes beneficiados

20 minutos de ahorro en tiempo

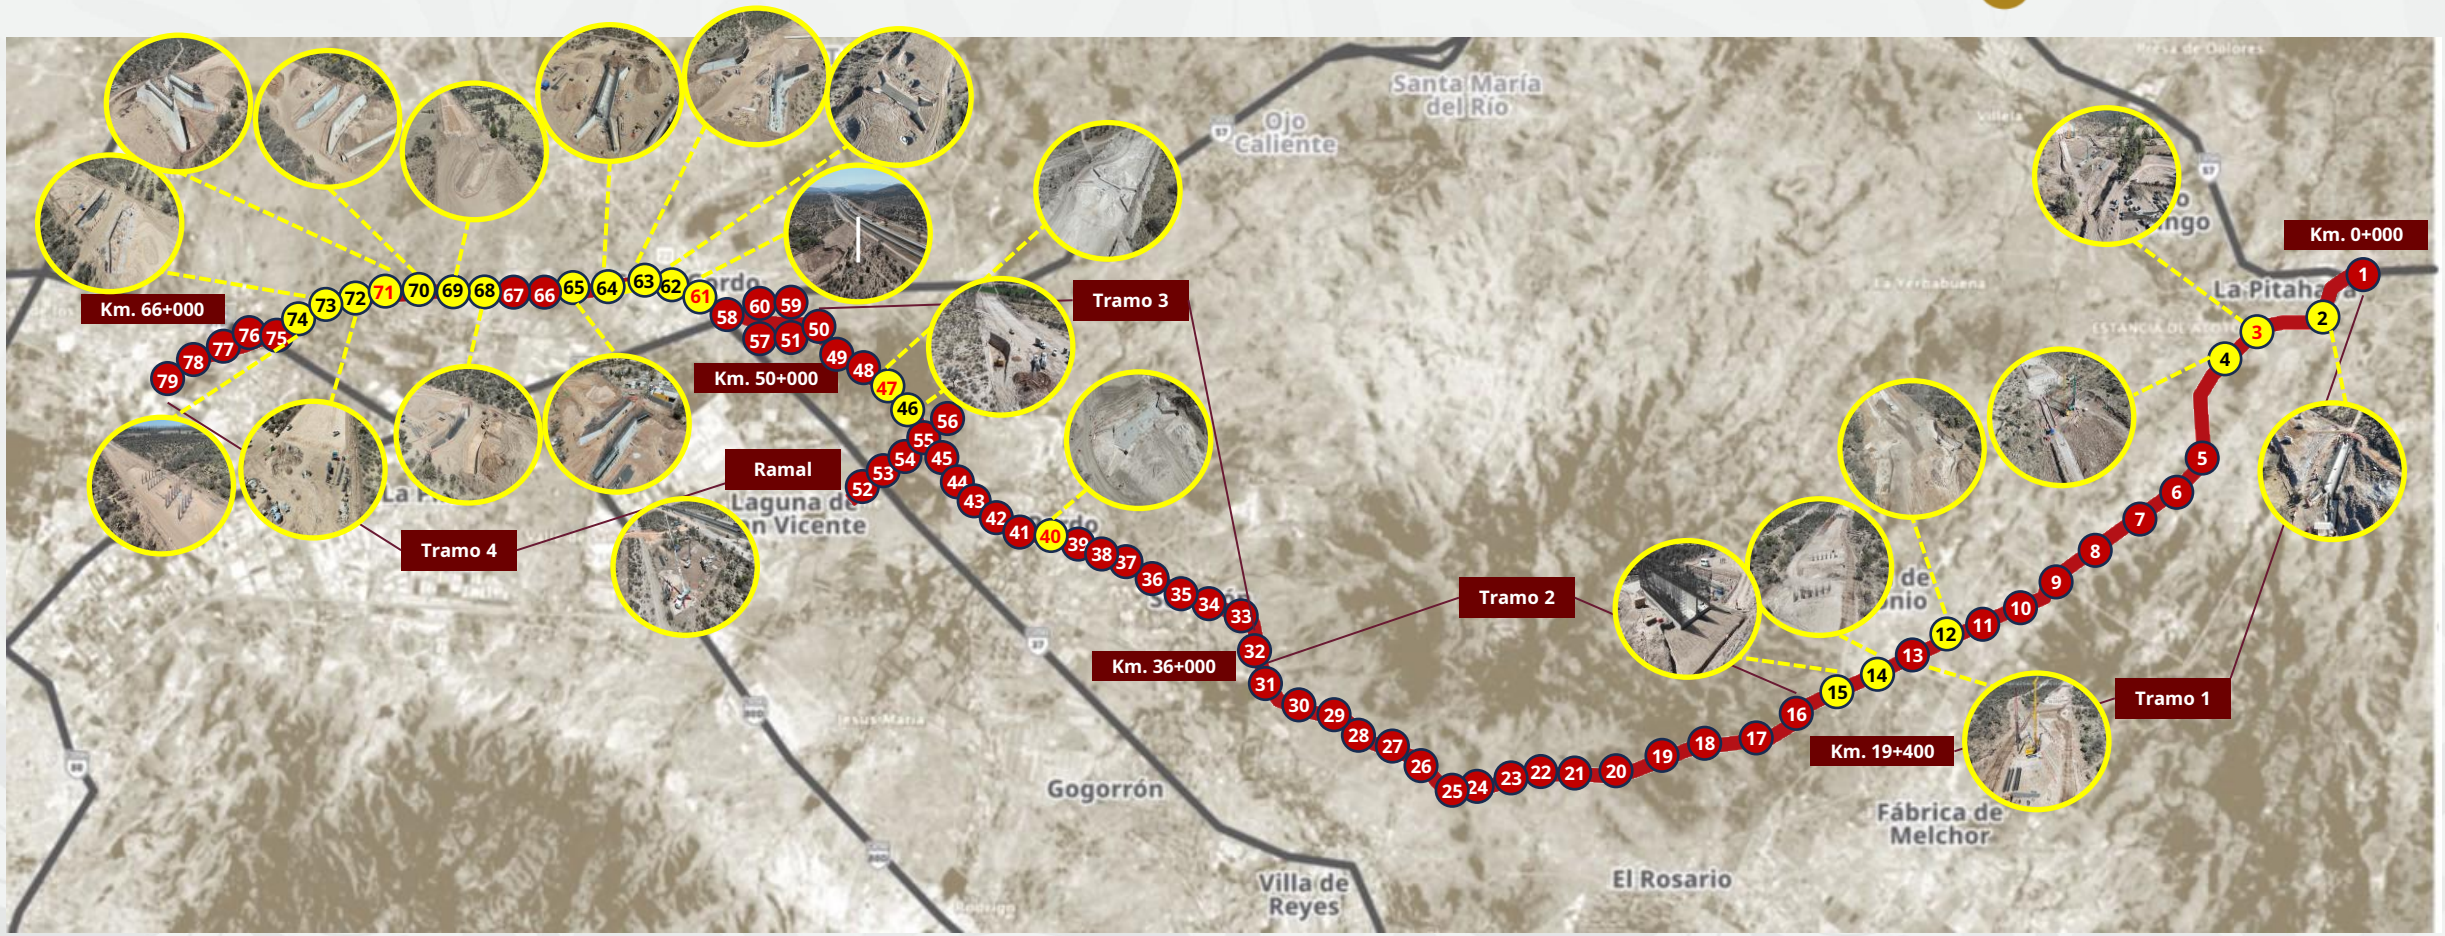

San Luis Potosí

La Pitahaya-Libramiento Oriente de S.L.P. y El Ramal Villa de Reyes

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Estructuras Proyectadas por Tramo

Tramo 1

	Descripción
1	Ent. La Pitahaya Km. 0+500
2	PSV Km. 2+096.73 ***28.65%***
3	Puente Km. 2+481 ***0.11%*** *(en espera a solución técnica para abatir el nivel freático)*
4	Ducto Km. 2+680 ***10.13%***
5	PIV Km. 9+289.75
6	Ducto Km. 10+853

	Descripción
7	PSFFCC Km. 12+780
8	PIV Km. 12+930
9	PSV Km. 14+043
10	PIV Km. 14+810
11	PSFFCC Km. 16+250
12	PIV Km. 17+530 ***1.50%***

	Descripción
13	Ducto Km. 18+426 ***12.24%***
14	Puente Km. 18+610 ***6.88%***
15	Dob Ca Km. 18+820 ***37.44%***

Tramo 2

	Descripción
16	PSG Km.121+870
17	PSV Km. 123+453
18	Puente Km. 123+608
19	PSV Km. 126+360
20	PSV Km. 128+210
21	Puente Km. 128+420

	Descripción
22	Ducto Km. 129+005
23	PSV Km. 130+725
24	PSG Km. 131+530
25	PSV Km. 132+820
26	Ducto Km. 134+020
27	PSV Km. 134+604

	Descripción
28	Puente Km. 134+662
29	PSG Km. 135+950
30	PIV Km. 137+310
31	Puente Carranco Km. 137+820

Tramo 3

	Descripción
32	PIV Km. 36+719.53
33	PIV Km. 37+739.99
34	PSV Km. 38+242.30
35	Puente Altamira Km. 39+520
36	PSG Km. 39+750
37	PIV Km. 40+349.53
38	PIV Km. 41+119.44
39	Ducto Km. 41+532.47
40	PSG Km. 41+981.48 ***3.00%*** *(en espera del suministro de acero)*

	Descripción
41	PSV Km. 42+386
42	PSG Km. 42+650
43	Puente La Laja Km. 42+990
44	PSV Km. 43+456.78
45	PSV Km. 43+577.34
46	PIV Km. 44+243.13 ***1.00%***
47	PSG Km. 45+380 ***3.00%*** *(en espera del suministro de acero)*
48	Ducto Km. 45+517
49	PSG Km. 46+930

	Descripción
50	PIV Km. 49+120
51	PIV Km. 49+900
52	E.c. Car 37 PSV Km. 16+540
53	PSV Km. 17+040
54	PSV Km. 17+610
55	PIV Km. 18+365
56	Ec. Ra Ind PSV Km. 18+700

Tramo 4

	Descripción
57	Ducto Km. 51+500
58	Ducto Km. 10+333 ***0.80%***
59	PSV Km. 10+500
60	Ducto 20+580
61	Ec Carr. 57 Km.51+800 ***0.02%*** *(la fuerza de trabajo se movió a otro actividad del entronque)*
62	PSG Km. 52+190 ***5.60%***
63	PIV Km. 53+150.26 ***39.12%***
64	PSV Km. 54+424.37 ***54.80%***
65	PSV Km. 54+952.42 ***32.12%***

	Descripción
66	PSV Km. 55+407
67	PIV Km. 56+354.38
68	PSV Km. 58+505 ***5.80%***
69	PSV Km. 59+030 ***2.01%*** *(estructura sin actividad en espera de pruebas de carga)*
70	PSV Km. 60+579.85 ***39.00%***
71	PSV Km. 61+561.78 ***67.00%*** *(estructura sin actividad en espera la colocación de neoprenos y montaje de trabes)*
72	PSV Km. 62+398.36 ***21.12%***
73	PSV Km. 63+517.92

	Descripción
75	Ducto Km. 65+791.31
76	Ec Lib Ote Km. 66+000
77	PSV Km. 66+441.21
78	PSV Km. 66+449.24
79	PSV Km. 1+412

Simbología

- *Por construir*
- *En proceso de construcción*
- *Concluido*

San Luis Potosí

La Pitahaya – Libramiento Oriente de SLP y el Ramal Villa de Reyes

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Volúmenes de obra Tramo I km. 0+000 al Km. 19+400 Tramo III Km. 36+000 al Km. 50+000 Tramo IV km. 50+000 al Km. 66+000					
Elemento	**Intervención**	**Ejecutado acumulado**	**Faltante**	**20/02/26 al 26/02/26**	**Ejecutado**
Terracerías					
Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasplante,	388.22	202.67	185.55		19.36
Despalme de espesor variable en corte y terraplén, el material producto	733,873.06	285,879.62	447,993.44		7,112.68
Excavaciones en cortes y adicionales debajo de la subrasante, cualquiera que sea su clasificación, cuando el material se	2,860,090.52	138,177.47	2,721,913.05		20,916.40
Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de cortes, en el cuerpo del terraplén	3,858,592.51	125,646.17	3,732,946.34		30,566.54
Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos de proyecto, en el cuerpo del	3,710,618.07	125,916.87	3,584,701.20		11,909.91
Formación y compactación de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos de proyecto, en	330,950.70	16,711.35	314,239.35		4,315.35
Obras de Drenaje					
Excavación para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que sea su	3,260.35	419.03	2,841.32		-
Plantilla de material Granular, P.U.O.T	75.46	57.36	18.10		-
Arrope y Relleno con material de calidad de subrasante, compactado al 95	32,513.97	714.40	31,799.57		714.40
Alcantarilla de concreto reforzado de f'c = 280 kg/cm2, en dirección normal	285.12	45.25	239.87		-
Concreto hidráulico de f'c= 100 kg/cm2 en plantilla, por unidad de obra	164.82	35.34	129.48		0.72
Concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2, por unidad de obra terminada.	911.41	216.61	694.80		-
Concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 en losa, por unidad de obra	1,528.14	15.07	1,513.07		6.04
Acero para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor de f'y =	20,910.40	2,691.66	18,218.74		-
Acero para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor de f'y =	45,378.22	5,991.60	39,386.62		389.02
Entronques					
Terracerías					
Despalme de espesor variable en corte y terraplén, el material producto del despalme se desperdicia en el	61,394.70	17,013.61	44,381.09		1,747.75
Excavaciones en cortes y adicionales debajo de la subrasante, cualquiera que sea su clasificación,	848,439.10	54,335.98	794,103.12		2,021.93
Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de	325,337.10	42,145.05	283,192.05		3,662.18

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

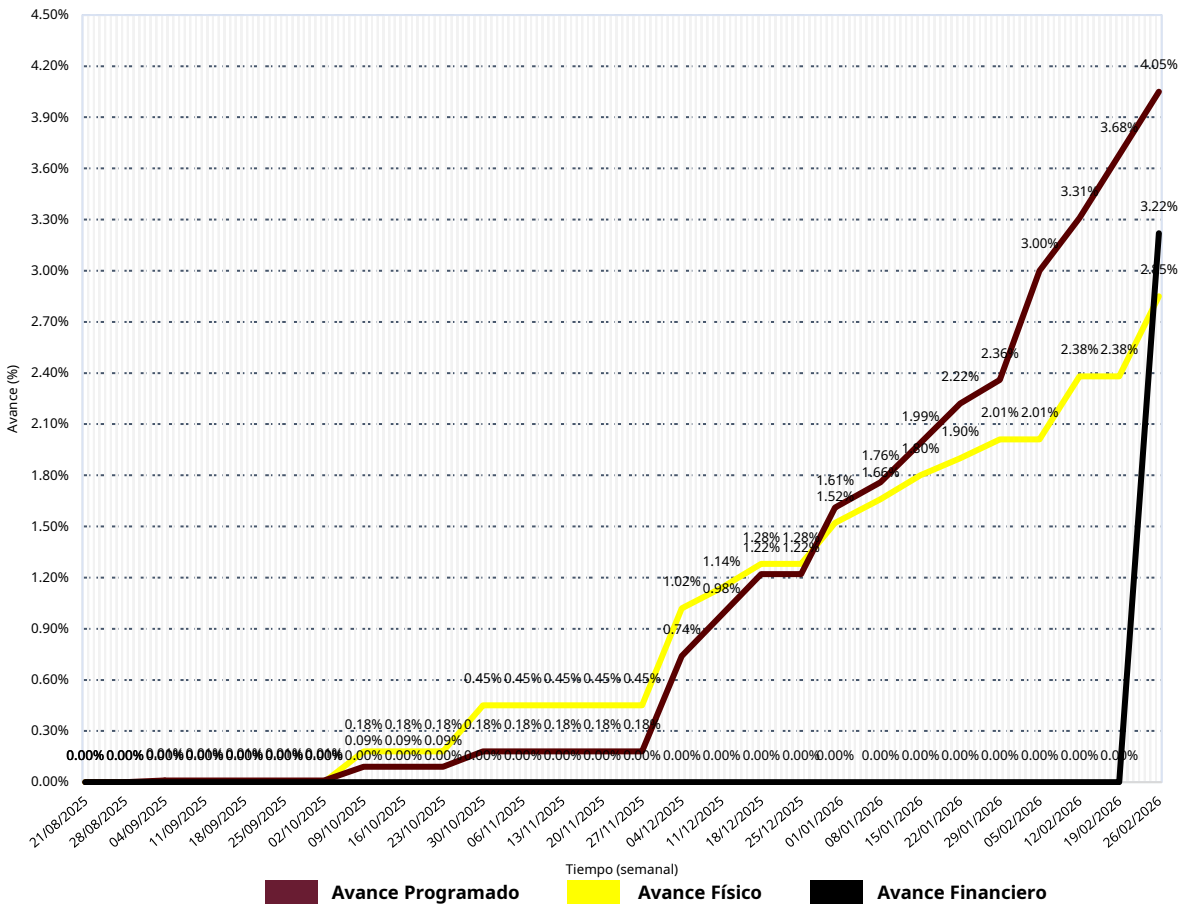

	06 al 12 de febrero 2026	13 al 19 de febrero 2026	20 al 26 de febrero 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	782	796	863
Maquinaria	117	129	137
Frente de Trabajo	Tramo 1/Tramo 3/Tramo 4	Tramo 1/Tramo 3/Tramo 4	Tramo 1/Tramo 3/Tramo 4
